

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETETEVE

Nr 10703/Prot.

Tiranë, më 31/10 /2025

Lënda: Përgjigje shkresës me tuajën Nr.2599.Prot,datë 09.10.2025, në lidhje me
“Kërkesë për depozitimin e planit 5 - vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për
periudhën 2023-2027”.

ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
(Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë)

**Për dijëni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISE ELEKTRIKE
GROUP SH.A**
(Bulevardi Gjergj Fishta, Tirana)

Z. Ervis HAZIZI
Zyrtari i Pajtuëshmërisë, OSSH SH.A

Këtu

I nderuar,

Në përgjigje të shkresës suaj Nr. 2599 Prot., datë 09.10.2025, protokolluar në OSSH sh.a.
me Nr. 10703 Prot., datë 10.10.2025, në lidhje me “Kërkesën për depozitimin e Planit 5-
vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për periudhën 2023–2027”, ju sqarojmë si më
poshtë:

Lidhur me depozitimin e Planit 5-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për periudhën
2023–2027 të shoqërisë OSSH sh.a., ju informojmë se dokumentacioni përkatës është
përcjellë pranë Entit Rregullator të Energjisë (ERE), së bashku me relacionin përmbledhës,
me shkresën Nr.6713/1. Prot., datë 26.07.2023.

Gjithashtu, në vijim të këtij procesi, ju kemi përcjellë edhe përditësimin e Planit 5-vjeçar për të njëjtën periudhë, me shkresën Nr. 7393. Prot., datë 10.07.2025 , të shoqërisë OSSH sh.a.

Në mbështetje të kërkesës suaj, ju përcjellim sërish Planin 5-vjeçar për periudhën në fjalë, së bashku me versionin e përditësuar, i cili përfshin të gjitha ndryshimet e fundit, të shoqëruar me relacionin përkatës.

Me konsideratë,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A
Blendian DALIPI



RELACION

*Plani i investimeve i perditesuar 5 vjecar 2023-2027
per miratim*

Permbajtja

Hyrje.....	3
OBJEKTIVAT E PLANIFIKIMIT TE INVESTIMEVE	3
STRATEGJIA E PLANIFIKIMIT PER REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE.....	3
Plani i investimeve konsiston	3
Plani i investimeve fillestar 5- vjecar, 2023-2027, derguar ne ERE me shkrese nr.6713/1 Prot. Date 26.07.2023	4
ME POSHTE PO JU PARAQESIM PERDITESIMIN E PLANIT 5-VJECAR 2023-2027.....	25
PERDITESIMI I PLANIT TE INVESTIMEVE 5- VJECAR, 2023-2027	26
PERDITESIMI I PLANIT TE INVESTIMEVE 5- VJECAR, 2023-2027 SIPAS STRUKTURES SE RRJETIT TE SHPERNDARJES.....	52
PARAQITJA GRAFIKE E PERDITESIMI I PLANIT TE INVESTIMEVE 5- VJECAR, 2023-2027 SIPAS STRUKTURES SE RRJETIT TE SHPERNDARJES NE MILIONA LEKE.....	53
VLERA E INVESTIMEVE ME KAPITAL TE HUAJ	54
Ndryshimi ne vite i planit 5- vjecar te investimeve, 2023-2027	54
PLANI I INVESTIMEVE 5- VJECAR, 2023-2027 I SHPREHUR NE NATYRE PER NENSTACIONET.....	54
PLANI I INVESTIMEVE 5- VJECAR, 2023-2025 I SHPREHUR NE NATYRE PER RRJETIN TM/TU.....	55
Per vtin 2023 te ndare sipas rajoneve	55
Per vtin 2024 te ndare sipas rajoneve	57
Per vtin 2025 te ndare sipas rajoneve	58
Total per vitet 2023-2025	59
Plani i investimeve 2023-2027 dhe impakti i tyre.....	60
VLERESIMI I NDIKIMIT TE INVESTIMEVE NE RRJETIN E SHPERNDARJES NE REDUKTIMIN E HUMBJEVE	60
Vleresimi i ndikimit te investimeve ne rrjetin e Tensionit te Larte ne uljen e Humbjeve	60
Vleresimi i ndikimit total te investimeve ne rrjetin e Tensionit te Mesem & te Ulet.....	61
Vleresimi i ndikimit te investimeve te planifikuara per vitet 2023 - 2027, ne impaktin ne reduktimin e humbjeve ne rrjetin e shperndarjes, eshte 255,854 MWh.....	62
Impakti I Investimeve te planifikuara 2023-2027 ne treguesit e cilesise SAIDI/ SAIFI.....	63
Realizimi I Planit te investimeve	67
REALIZIMI I INVESTIMEVE TE PLANIT PER VITIN 2023	67
REALIZIMI I INVESTIMEVE TE PLANIT PER VITIN 2024	72
REALIZIMI I INVESTIMEVE NE PLANIN 5-VJECAR 2023 - 2027	78

Hyrje

Objektivat e Planifikimit të Investimeve

Investimet e planifikuara kanë si qëllim kryesor:

- Sigurimi i qëndrueshëm dhe cilësive të furnizimit me energji elektrike, për të mbështetur rritjen e ngarkesës dhe kërkesat e tregut.
- Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe komerciale, përmes optimizimit të proceseve dhe përmirësimit të pajisjeve.
- Rehabilitimi dhe modernizimi i rrjetit dhe sistemeve të matjes, me fokus në rritjen e efikasitetit dhe kontrollin mbi shpërndarjen e energjisë.
- Rritja e kapaciteteve të rrjetit të shpërndarjes, me qëllim përballimin në mënyrë efektive të integritetit të burimeve të reja gjeneruese të energjisë elektrike, veçanërisht atyre nga burimet e rinovueshme, në përputhje me zhvillimet e tregut dhe objektivat e tranzicionit energjetik.

Strategjia e Planifikimit për realizimin e objektivave

Strategjia e implementuar të investimeve ka përfshirë disa masa të rëndësishme, të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e kapaciteteve dhe performancës të rrjetit të shpërndarjes, siç vijon:

- Rritja e kapaciteteve të nënstacioneve ekzistuese dhe ndërtimi i nënstacioneve të reja, për të përballuar kërkesat në rritje.
- Zgjerimi i rrjetit 35 kV, për të adresuar kufizimet e rrjedhjes së ngarkesës dhe për të përmirësuar cilësinë e furnizimit me energji elektrike.
- Investime në rrjetin 10kV dhe 6kV, me qëllim ndarjen e ngarkesave në fiderat dales dhe përmirësimin e infrastrukurës në zonat rurale dhe periferike.
- Rikonstruktion i rrjetit TM 20 kV, ndërtim i rrjetit të ri 20kV, duke kaluar rrjetin nga 10kV, 6kV në 20kV për sigurinë, cilësinë e rrjetit si dhe reduktimin e humbjeve.
- Rritja e sigurisë dhe saktësisë në matje, me futjen e teknologjive të reja që kontribuojnë në mbrojtjen dhe ruajtjen e sistemit të matjes

Plani i investimeve konsiston

- Ndërtimi i nënstacioneve të reja dhe fuqizimi i atyre ekzistuese.
- Rikonstrukcioni i linjave TL, për të përmirësuar kapacitetet dhe stabilitetin e rrjetit.
- Rikonstrukcione dhe fuqizime të rrjetit TM 20 kV
- Ndërtimi i kabinave elektrike të reja dhe rikonstrukcioni i kabinave ekzistuese.
- Ndërtimi i rrjetit TU me percjelles ABC, për zvogëlimin e humbjeve.
- Investime në sisteme matëse, me qëllim rritjen e cilësive të matjes dhe uljen e humbjeve komerciale përmes përdorimit të teknologjive moderne

Plani i investimeve fillestar 5- vjecar, 2023-2027, derguar ne ERE me shkrese nr.6713/1 Prot. Date 26.07.2023

Nr.	Emeritimi i Investimit	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
I	Ndertim/rikonstruksion elektrik per Nenstacionet		60,000,000	545,000,000	1,360,000,000	1,280,000,000	2,905,000,000	2,800,000,000	8,950,000,000
1	Fuqizimi I N.Stacionit 110/20kV Golem - Dures	Dures	30,000,000	135,000,000	40,000,000				205,000,000
2	Ndertimi I nestacioni te ri Velipoje 110/35/20kV	Shkoder	30,000,000	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000
3	Fuqizimi i N.Stacionit 110/20kV Zogu Zi (2x40)MVA	Tirane		50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000
4	Ndertim N/Stacionit te ri Fier 2 110/20kV	Fier		50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000
5	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Kuqove 110/35/20/10/6kV	Berat		50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000
6	Rikonstruksion I N.Stacionit Pogradec 110/35/10kV ne 110/35/10/20kV	Pogradec		50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000
7	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Corovode e Re 110/35/10kV	Berat		30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000
8	Rikonstruksion i N.Stacionit Kafaraj 110/35/10kV	Fier					100,000,000	80,000,000	180,000,000
9	Fuqizimi i N.Stacionit 35/6kV Pallati Kongreseve transformoret 35/20kV (2x15)MVA	Tirane					200,000,000	105,000,000	305,000,000
10	Rikonstruksioni N.Stacioni I Hec Lanabregas 35/10kV dhe fuqizimi me transformatore 35/20kV (1x15)MVA	Tirane					130,000,000	200,000,000	330,000,000
11	Ndertimi i N.Stacionit Fushe Kruje 110/20kV (Zevendesimi I n/st. Mobile)Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Dures					185,000,000	100,000,000	285,000,000
12	Fuqezimi I N.Stacioni Shkodra I me transformatore Tr.2 110/20kV (1x40)MVA	Shkoder					70,000,000	100,000,000	170,000,000

13	Rikonstruksionu I impijantit 20kV N.Stacioni Bushati 110/20kV	Shkoder							55,000,000		55,000,000
14	Rikonstruksion I N.Stacionit Lezhe nga 110/10kV ne 110/20/10kV	Shkoder			60,000,000	90,000,000					190,000,000
15	Ndertim i N.stacioni Lozhan 110/35/10kV dhe 25MVA dhe linja 110kV	Korce							45,000,000	200,000,000	245,000,000
16	Rikonstruksion N.Stacioni 35/10kV Grapsh ne 110/20/10kV dhe ndertimi I linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Gjirokaster							200,000,000	140,000,000	340,000,000
17	Rikonstruksion N.Stacioni 35/10kV Livadhja ne 110/20/10kV dhe ndertimi I linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Gjirokaster							180,000,000	300,000,000	480,000,000
18	Rikonstruksion N.Stacioni 35/10kV Delvine ne 110/20/10kV dhe ndertimi I linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Gjirokaster							140,000,000	200,000,000	340,000,000
19	Ndertimi I N/Stacionit te ri Maskollat 35/10kV si dhe furnizimi me linje 35kV nga n.stacioni B.Curri ?????	Kukes							150,000,000	200,000,000	350,000,000
20	Fuqizimi i N.Stacionit 35/20kV Kinostudio (Faza II) transformatore (2x15)MVA (1x15)MVA	Tirane							155,000,000		155,000,000
21	Ndertimi i N.Stacionit Uzina Dinamo 35/20kV Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA ??????	Tirane							280,000,000	200,000,000	480,000,000
22	Ndertimi i N.Stacionit Tamare 35/20/10kV dhe linja e re 35kV nga n.stacioni Vuk Palaj 35/20/10kV	Shkoder							210,000,000	200,000,000	410,000,000
23	Ndertimi I n.st. te ri Shengjin 110/20kV	Shkoder							300,000,000	300,000,000	600,000,000
24	Rikonstruksion I N.st. Plasmas 110/35/20/6kV	Berat							205,000,000		205,000,000
25	Rikonstruksion I N.st. Selenice 110/35/6kV	Vlore							100,000,000	125,000,000	225,000,000
26	Rikonstruksioni I N.st. Fushe Kuqe 110/35/6kV	Burrel							200,000,000	350,000,000	550,000,000
II	Ndertim/Rikonstruksion linjash te TL		20,000,000	37,300,000	-	-	-		697,786.809	868,016.450	1,623,103.259

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

1	Ndertimi i Shtyllës 110kV për lidhjen e nënstacionit të ri Kamez 110/20kV me rrjetin 110 kV	Tiranë		7,300,000					
2	Rikonstruksioni i linjës 35kV N.stacion Konistudio - Nstacion Lana Bregas - N.stacion Pallat Kongreseve	Tiranë	-					200,000,000	7,300,000
3	Ndertimi i rrjetit të ri kabllo 35kV Al, XLPE (1x3+1x300mm ²) N.St 220kV Tirana I, Rajonal OST - N.St. 35/20/6kV Kinostudio.	Tiranë	-					100,000,000	300,000,000
4	Ndërtim tuneli për kabllo të TL dhe TM të shpërndarjes Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qendër Segmenti A-B	Tiranë						105,000,000	105,000,000
5	Ndërtim tuneli për kabllo të TL dhe TM të shpërndarjes nga Nstacioni qendër -nstacioni Kongrese segmenti D-C	Tiranë						200,000,000	308,016,450
6	Ndërtim tuneli për kabllo të TL dhe TM të shpërndarjes nga Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qendër Segmenti B-C	Tiranë						131,543,017	231,543,017
7	Rikonstruksioni i njësive kritike në linjat 35 kV	OSSH	20,000,000	30,000,000				87,043,792	87,043,792
8	Ndërtimi i linjës me dy qarqe 110 kV N.St Kafaraj Fier - Hoxhë (traseja e linjës ekzistuese 35kV)	Fier							50,000,000
9	Rikonstruksion Linja 35 kV Puke - Koman	Shkoder						74,200,000	460,000,000
IV	Ndërtim Rrjeti TM		-	113,490,503	-	-	-	1,254,663,415	74,200,000
1	Fiderat e rinj "E11" dhe "E12" 20kv nga n/st Farke - 110/20/10kv- deri tek kabina ekzistuese K-8 (Eklipsi) dhe fiderit "E12" nga kabina "K 8" deri tek degezimi i Vishnjës	Tiranë						848,000,000	2,216,153,918
2	Linja TM 20 kV zëvendësimi i fiderit 34 dhe E5 nga Stermasi në drejtim të Vishnjës, Arbane, N/ST FARKE-TIRANE Loti II	Tiranë	-					100,000,000	60,000,000
								120,000,000	220,000,000

3	Zevendesimi me 20 kV te fiderave Mezes 107 etj. me furnizim nga fideri 32 Kashar	Tirane	61,798,937						61,798,937
4	Furnizimi me 20 kV i zones Marikaj	Tirane							
5	Kalimi I fiderit 118 N/Stacioni Kinostudio 36/9 kV , ne rrjetin e ri TM 20 kV .	Tirane	51,691,566						51,691,566
6	Ndertimi I rrjetit TM 20kV , ndertimi I kabinave te reja, rikonstrukcion I kabinave ekzistuese te N.st. Valias 110/20kV	Tirane					300,000,000	300,000,000	600,000,000
7	Zhvillimi I rrjetit shperndares 20 kV ne zonen e City -Park Vore - Rinas	Tirane					100,000,000	262,000,000	362,000,000
8	Rikonstrukcion I rrjetit TM te Fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan					80,000,000		80,000,000
9	Rikonstrukcion I rrjetit TM te Fiderit Shpatit Nst Mjekes	Elbasan					100,000,000		100,000,000
10	Rikonstrukcion I rrjetit TM te fiderit Nr. 3 Gramsh	Elbasan					107,688,890		107,688,890
11	Rikonstrukcion I fiderit 1, N/St Fiber	Elbasan					70,329,090		70,329,090
12	Rikonstrukcion I fiderit 2, N/St Fiber	Elbasan					47,025,839		47,025,839
13	Rikonfigurimi I linjave TM nga N/Stacioni Ballsh	Fier					42,000,000		42,000,000
14	Zgjatimi i Fiderit F.11, N/Stacioni 110/20kV Fieri i Ri	Fier					75,000,000		75,000,000
15	Rikonstrukcioni I rrjetit TM per Fiderin Aranitas, Pika Shperndarese Tec Ballsh.	Fier					59,980,100		59,980,100
16	Rikonstrukcion I segmenteve te fiderave kablllore 20kV, F6, F16, F17, N/Stacioni 110/35/20/10/6 kV Shkodra I	Shkoder					14,884,800		14,884,800
17	Sistemin I daljeve te fiderave TM 10 kV ,F- Rrape ,Parku,Gjegjan,N/St Fushe Arres	Shkoder					4,754,696		4,754,696
18	Rikonstrukcion i Fiderave Baze,Ulez N/ST Ulez Axhensia Burrel, Drejtoria Rajonale Burrel ne rrjetin 10kV	Burrel					93,000,000		93,000,000
19	Rikonstrukcion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F8 Has	Kukes						35,000,000	35,000,000

20	Rikonstrukcion i fiderit Lekbibaj ndarja e Geghyzenit ne fider te ri	Kukes							95,000,000	95,000,000	
21	Rikonstrukcion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F6 Has	Kukes							36,000,000	36,000,000	
IV	Ndertim/Rikonstrukcion Rrjeti TM /TU		30,000,000	1,137,407,048	852,660,026	414,000,000	3,330,247,923	4,902,902,635	10,667,217,631		
1	Faza e dyte e zgjerimit dhe rikonstrukcionit te Fiderit E 10 ne zonen e Berzhites se bashku me rrjetin Tu me percjellec ABC	Tirane		40,000,000	50,000,000	70,000,000			160,000,000		
2	Fider I ri 20 kV E 13 i N/Stacionit Farke 110/20/10 kV	Tirane		48,800,160					48,800,160		
3	Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rinj Vore	Tirane		42,310,269	50,000,000				92,310,269		
4	Linja ajrore TM 20 kV per zevendesimin e fiderit E5 N/Stacioni Farke, nga degezimi i Vishnjes ne drejtim te Baldushkut deri ne Ball Shaban , kabinat e reja dhe linja TU me kabell ABC	Tirane					65,000,000		65,000,000		
5	Ndertimi i kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM dhe linjat tu me kabell abc ne fiderat F1,F2 dhe F3 te n/stacionit 35/6 kv Ndroq	Tirane					165,312,464		165,312,464		
6	Ndertimi i 12 kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne Fiderin F4 TE N/Stacionit 35/6 KV NDROQ si dhe linjave TU me kabell ABC i 18 kabinave	Tirane		96,676,817					96,676,817		
7	Ndertimi I kabinave dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R3 I N/Stacionit Vore dhenga fiderat F8 dhe F32 te N/Stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6 kv te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore.	Tirane		50,000,000	76,660,026				126,660,026		
	Ndertimi I 2 Kabinave te reja 20 kV dhe rrjet TU me kabel ABC ne fiderin Q1 dhe Q2	Tirane		30,000,000					30,000,000		
9	Dy Fidera te rinj 20 kV te N/Stacionit Kinostudion 35/20/6 kV	Tirane									

10	Ndertimi i fiderave te rinj, P6,P7,P8,P0,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve” 35/20 kV-Tirane	Tirane						144,498,280	144,498,280
11	Kalimi nga 6kV ne 20kV i kabinave te fiderit 23 te N/Stacionit Selite	Tirane			17,230,559				17,230,559
12	Ndertimi i linjes TM kablore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabell me vetmbajtje ABC , per furnizimin e lagjes Sharre	Tirane						20,756,450	20,756,450
13	Ndertimi i fiderave te rinj, P1 ,P2,P3,P4 dhe P5 , 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve” 35/20 kV-Tirane	Tirane						64,289,525	64,289,525
15	Ndertimi i kabines PSh 16/1 si dhe linjat e rjetit TU me kabell ABC, me furnizim nga fideri F8, N/St Kashar	Tirane			13,533,267				13,533,267
16	Furnizim me TM-TU I kabines se re boks "K3" Dedej, fideri F8, 20kV, N/St Kashar 110/20kV	Tirane							-
17	Furnizim me TM 20kV I kabines se re murature "Bota e Luleve", fideri F.29, N/St Kashar 110/20kV	Tirane			3,708,518				3,708,518
18	Zevendesimi i daljeve te para kablore te fiderave 6 kV, N/St Vore (me punonjesit tane)	Tirane			2,673,812				2,673,812
19	Ndertim i linjes dhe kabines se re shtyllore "Lagja Varosh" si dhe linja TU me kabell me vetmbajtje ABC	Tirane						5,637,580	5,637,580
20	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore ne kablore I kabina elektrike Pasho Hysi,Anxhelo Kaza,Iris Dollaku 2 A.I.Dollaku I,si dhe rjeti TU I kabines K2,Paho Hysi ne NST Traktora	Tirane			51,212,956				51,212,956
21	Furnizimi me TM/TU 20kV i kabines se re "Box Instituti Qender", Fideri A8, N/St Rajonal, qe do te sherbeje per ndarje ngarkesash (me punonjesit tane)	Tirane			4,370,639				4,370,639

22	Eliminimi I Fiderit 82, 6kV dhe furnizimi TM/TU 20/0.4kV I kabinese se re "Shkoze 2 Box" (me punonjesit tane)	Tirane	5,574,471						5,574,471
23	Furnizimi me TM 20kV dhe TU me kabell me vetmbajtje ABC i kabinave te reja box KL8, KL9, fideri J10, N/St Traktora	Tirane					25,117,295		25,117,295
24	Spostimi dhe sistemimi I kabines K1, fideri E-6, N/St Farke (me punonjesit tane)	Tirane	4,130,000						4,130,000
25	Lidhja unazore mes fiderit E3 dhe E10, N/St farke 110/20/10kV, Tirane (me punonjesit tane)	Tirane	3,500,000						3,500,000
26	Linja ajrore TM 20 kV per zevendesimin e fiderit E5 N/Stacioni Farkenga Ball Shaban deri ne Vrap, ShenKoll, Paret , , kabinat e reja	Tirane						150,000,000	150,000,000
27	Zgjatimin I Fiderit 8 me kabina dhe rrjet te ri TU n/Stacioni Fushe Kruje 110/20kV(drejtim Bubqit)	Durres	21,158,859	20,000,000	100,000,000				141,158,859
28	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabull ABC dhe I kabinave te Fiderit Nr IRD (Klos, Mollas) Nst Radio	Elbasan					86,000,000		86,000,000
29	Rikonstruksion I fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh,	Elbasan							
30	Rikonstruksion I fiderit Nr. 13, Gracen, N/Stacioni Nr. 4 dhe rikonstruksion I fiderit Bishqen, N/St Cerrik	Elbasan					85,352,238		85,352,238
31	Rikonstruksion I fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim	Elbasan					80,405,145		80,405,145
32	Rikonstruksion I fiderit Llixha, N/St Mjebes, I fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan	Elbasan					95,256,565		95,256,565
33	Rikonstruksion I fiderit Nr. 6, Tregan, N/St Radio dhe rikonstruksion I fiderit Nr. 8, N/St Banje	Elbasan					50,000,000	59,628,983	109,628,983
34	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Peqinit	Elbasan						88,767,079	88,767,079
35	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Elbasanit	Elbasan						113,499,754	113,499,754
								145,000,000	145,000,000

36	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave ne rrethinat Cerrik	Elbasan							138,385,630	138,385,630
37	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave ne rrethinat Belsh	Elbasan							180,000,000	180,000,000
38	Rikostruksion I rrjetit TU me kabull ABC dhe I kabinave te Fiderit Shpatit Nst Mjekes	Elbasan						107,000,000		107,000,000
39	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 4/10kV, N/Stacioni Kucove, 110/35/10/6kV	Berat						93,396,734		93,396,734
40	Vazhdimi per investimin ndertimi I Fiderit F8 ,Plug ,20kV N/Stacioni Plasmas	Berat						80,000,000		80,000,000
41	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 3/10kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat							46,045,600	46,045,600
42	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 5/6kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat							31,020,448	31,020,448
43	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Njesise Lushnje	Berat							157,141,204	157,141,204
44	Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 32/6 kV N/ST KOMBINAT ,35/6KV dhe Fiderave A4U /20kV N/ST UZNOV dhe A1B/20KV N/ST BURDULLIAS	Berat	30,000,000	63,145,195						93,145,195
	Fideri I Tomorices TM/TU rikonstruksion	Berat		53,000,000	40,000,000					93,000,000
45	Ndertim I linje TM dhe kabines "Vodica e Re" (me punonjesit tane)	Berat		1,918,077						1,918,077
46	Kthim nga murature ne shyllore I kabines "Malind" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC (me punonjesit tane)	Berat		1,559,746						1,559,746
47	Ndertim I kabines se re "Banaj 4" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC	Berat		4,012,897						4,012,897
48	Ndertim I kabines se re "Banaj 5" dhe rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC	Berat		4,656,526						4,656,526

49	Ndërtimi i linjes TM dhe kabines se re Prokuce Fideri Mbrakull N/ST Polican 35/6KV	Berat	717,793						717,793
50	Kithimi nga murature ne shtyllore I kabines Pompa e ujit Vlashuk Fid.Nr7/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV	Berat	354,869						354,869
51	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 26/6KV N/ST Kombinatat 35/6KV	Berat					52,726,326		52,726,326
52	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 29/6kv, N/St Kombinatat 35/6kv.	Berat					86,886,003		86,886,003
53	Ndërtim i rjetit TM, 20kv, kabines dhe rjetit TU me kabell ABC ne fshatin Vojnik	Berat					16,930,938		16,930,938
54	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 4/10kv, N/St Pobrat 35/10kv	Berat						19,589,492	19,589,492
55	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 1+9/6kv, N/St Uznove 110/35/6kv	Berat						24,428,827	24,428,827
56	Rikonstrukcioni Kabina dhe rjet TU me kabell ABC ne fshatin Dervican	Gjirokaster							20,500,000
57	Ndërtim rjet TM, 20kv, dhe kabina elektrike, fideri F8, F9,F10, N/St Gjirokaster. (Zona Kardhiq)	Gjirokaster	40,000,000			40,000,000			80,000,000
58	Ndërtimi i linjes kablore 20kv per furnizimin e tunelit Skarices	Gjirokaster	40,000,000			50,000,000	40,000,000		130,000,000
59	Zgjatim i fiderit F7, 20 kv , Nst Gjirokaster 110/20 kv per furnizimin e zonen se Lazaratit	Gjirokaster						154,200,000	154,200,000
60	Ndërtimi i rjetit TM/TU 20/0.4 kv per fiderat Lefter Talo, Jeta e re nenstacioni 35/20/10 kv Livadhja si edhe fideri OLM5 Nenstacioni 110/20/10 kv Sarande (pas pikes transformuese 20/10kv)	Gjirokaster					413,640,155	300,000,000	713,640,155
61	Rikonstrukcioni kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat OLM1 dhe OLM 2, Nst Sarande 110/20 kv	Gjirokaster						90,000,000	90,000,000

62	Ndërtim kabine e re shtyllore "Koshovice 3", Tr-160kVA, Linje TM/TU, Fideri Dropull I Siperm, N/St 35/10 kV Grapsh (me punonjësit tane)	Gjirokaster	1,600,000						1,600,000
63	Rikonstruktion kabina dhe linja TU me kabel ABC per fiderat Kardhiq dhe Lunxheri, Nst Gjirokaster 110/35/6 kv	Gjirokaster	45,000,000						45,000,000
64	Rikonstruktion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabel ABC per fiderat Gline, Zagorie Grapsh dhe Dropull i Siperm Nst Grapsh 35/10 kv	Gjirokaster					35,000,000		35,000,000
65	Rikonstruktion Rrjeti TM kabina linja TU me kabel ABC per fiderat Ujesjelles, Mamaj, Miniera 1 dhe Miniera 2, Nst Memaliaj 110/10 kv	Gjirokaster					45,000,000		45,000,000
66	Rikonstruktion Rrjeti TM kabina linja TU me kabel ABC per fiderat Kurvelesh, Dragot Nst Tepelene 110/10	Gjirokaster							35,000,000
67	Rikonstruktion Rrjeti TM kabina linja TU me kabel ABC per fiderat Krahes Nst Krahes 110/10 kv	Gjirokaster						35,000,000	35,000,000
68	Ndërtim linje e re me parametra 20 kv per zonen Bregdet Lukove, Shen Vasil - Nivice	Gjirokaster							35,000,000
69	Zgjatim i fiderit OLM8, 20 kv, Nst Sarande 110/20 kv per furnizimin e zonen se Industriale Sarande	Gjirokaster						100,000,000	100,000,000
70	Rikonstruktion Rrjeti TM kabina linja TU me kabel ABC per fiderat Ballaban, Suke Nst Keqevre 110/10 kv	Gjirokaster						65,000,000	65,000,000
71	Zgjatim i fiderit OLM6, 20 kv, Nst Sarande 110/20 kv Berdenesh Nr. 5 - Ksamil Nr 13 (furnizimi il zones Ksamil me linje unazore) dhe zgjatimi I fiderit OLM 5 per furnizimin e zones PSV (Marine) Ksamil.	Gjirokaster	40,000,000			40,000,000			80,000,000
72	Rikonstruktion Rrjeti TM kabina linja TU me kabel ABC per fiderat Petran, Kosine Nst Permet 110/10 kv	Gjirokaster					35,000,000		35,000,000

73	Kalim rrjeti TM me kabell me izolacion 20 kV, nderim kabina tip box dhe rrjeti TU me kabell ABC ne zonen e Cukes, N/St Sarande	Gjirokaster							125,000,000	125,000,000
74	Rikonstrukcioni I kabinave si dhe rrjeti TU me ABC ne JUG, I zonave te mbetura jashte projektit te Kooperacionit Italian	Vlore						148,699,580	200,000,000	348,699,580
75	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO2, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore						22,000,000		22,000,000
76	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin S14, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore						20,000,000		20,000,000
77	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin F52, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore							86,000,000	86,000,000
78	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin F54, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore							58,000,000	58,000,000
79	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin K2, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore						62,000,000		62,000,000
80	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin K3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore						22,000,000		22,000,000
81	Rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC ne njollat e paperfunduara ne Qytetin e Vlores	Vlore						60,000,000	60,000,000	120,000,000
82	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH7, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore							23,573,982	23,573,982
83	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH4, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore							62,597,148	62,597,148
84	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH10, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore							74,095,491	74,095,491

85	Furnizimi I Aeroportit te Vlores	Vlore		30,000,000	30,000,000				60,000,000
86	Ndertimi I Fiderave 20kV L10 N.St. Vlorë I dhe Fideri J10 N.St. Vlorë per furnizimin e objekteve ne Portin e Vlores			55,192,960	70,000,000				195,192,960
87	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO1, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					51,878,850		51,878,850
88	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					81,629,736		81,629,736
89	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin SE3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore					55,982,877		55,982,877
90	Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC ne njollat pa investim ne zonen Lumit te Vlores	Vlore					190,000,000		190,000,000
91	Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC ne njollat pa investim ne zonen e Bashkise Vlore	Vlore					60,000,000	60,000,000	120,000,000
92	Ndertimi i linjes kabllore 20kV N.St Orikum - Tuneli Llogarase	Vlore		50,000,000	56,000,000				160,000,000
93	Ndertimi i linjes 20kV ajrore N.St Palase - Tuneli Llogarase	Vlore	-	31,000,000	30,000,000				61,000,000
94	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU per Fiderin Fratar , Nenstacioni Pocem 35/6 kV , dhe vazhdimi i kabinave te mbetura te fiderit Aranitas, N/st Pika Shperndares Ballsh.	Fier						100,000,000	100,000,000
95	Rikonstrukcioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Agim I, Nenstacioni Libofshe 35/10 kV	Fier						32,233,258	32,233,258
96	Ndertim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetmbajtje te tipit ABC per kete kabine	Fier		5,000,000					5,000,000

97	Ndërtimi i linjave të reja 6 dhe 10 kV që do të furnizojnë kabinat e reja Varibop 1, Frakull e Vogel 2, Frakull e Madhe 1, Buzemadh 3, Buzemadh 4, Gorishovë si dhe ndërtimi i linjave të reja me kabllo me vetmbajtje ABC për keto Kabina	Fier								27,000,000	27,000,000
98	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Mbrostar Ura, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier								68,680,800	68,680,800
99	Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i kabinave të mbetura dhe rrjetit TU për Fiderin Pulari 1, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier								63,571,000	63,571,000
100	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Pulari 2, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier								54,180,000	54,180,000
101	Rikonstruksioni i rrjetit TM për fiderat Nr.15,16, 20, 26 Kafaraj, N/ST Kafaraj 35/6 kV si edhe rikonstruksioni i 4 kabinave të mbetura dhe rrjetit TU i tyre.	Fier								98,750,000	98,750,000
102	Rikonstruksioni i rrjetit TM për fiderat Nr.1,2,3, Cakran, Buzemadh dhe Varibob, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier								99,850,000	99,850,000
103	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Kompresori 1 dhe 2, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier								80,230,000	80,230,000
104	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Oficine, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier								60,550,000	60,550,000
105	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave të mbetura të fiderit Qytet 4, Nënstacioni Patos, 35/6 kV	Fier								99,862,300	99,862,300
106	Ndërtimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr.16 dhe kabinës së re shtyllore "Sheq Levan 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjësit tane)	Fier								4,000,000	4,000,000

107	Ndertimi I rrjetit TM 20 kV te Ndertimi I kabinave te reja dhe rikonstrukcioni I kabinave ekzistuese te N/stacionit te ri Leskovik 110/10kV	Korce							300,000,000	300,000,000	600,000,000
108	Rikonstrukcion rrjetit TM fideri 19n/st Korce pjesa fshati Drenove, rrjet TU me ABC Fshati Drenove, rikonstrukcion kabina Qyteti I Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe ndertim kabine e re me murature tulle Drenove 3	Korce							19,845,156	19,845,156	19,845,156
109	Rrjet TU me kablo me vetembajtje ABC Kabina Vlocisht 1+2+3+4, rikonstrukcion kabinat Vlocisht 1+2 dhe ndertim kabine e re murature Vlocisht 3	Korce							18,440,353	18,440,353	18,440,353
110	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstrukcion kabina Zvirine 1+2+3	Korce							11,788,268	11,788,268	11,788,268
111	Rrjet TU me kablo me vetembajtje ABC Kabina BOROVE, dhe ndertim kabine e re me murature tulle fshat BOROVE	Korce						2,176,809		2,176,809	2,176,809
112	Rrjeti TU me kablo ABC I kabinave te fshatit Podgorie, fideri 14, N/St Petrushe, ndertim kabine shtyllore me dy shtylla, linje TM 10kV per lidhjen e kabines shtyllore me rrjetin TM nga kabina Podgorie 1	Korce							27,749,729	27,749,729	27,749,729
113	Rrjet TU me ABC Fshati Areze dhe rikonstrukcion kabina fshati Areze	Korce						6,010,288		6,010,288	6,010,288
114	Rrjet TU me ABC Fshati Nikolice dhe ndertim kabine e re fshat Nikolice	Korce						2,316,606		2,316,606	2,316,606
115	Zhvendosja e kabinave 5/6 dhe 5/7, Fideri Nr. 5, N/Stacioni Korce	Korce						6,350,047		6,350,047	6,350,047
116	Nderti I linjes TM, 10kV, Fideri Nr. 2 Dohoshisht (ne punonjesit tane)	Burrel					5,480,713				5,480,713
117	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 1)	Burrel					14,556,552				14,556,552
118	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 2)	Burrel					30,651,460	30,000,000	30,000,000		90,651,460

119	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie, (LOTI 3)	Burrel		42,000,000	50,000,000	50,000,000			
120	Rikonstruksion dhe kalimi ne 20kV I kabines Vasil Shanto, Fideri 17, N/Stacioni 110/20/6kV Shkodra I	Shkoder		4,084,915					142,000,000
121	Zhvillim linje TM/TU me kabell 20kV XLPE 1x240mm ² , kabina tip box dhe zhvillim rrjeti TU me kabell ABC, F-3, N/St SH-2	Shkoder					66,378,904		4,084,915
122	Sistemi i rrjetit TM/TU & kab. Nr.14 SMT, Laga Lalm i Ri, F-2 (Gurra), N/St 110/10kV Lezhe	Shkoder		6,595,018					66,378,904
123	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU me ABC dhe I kabinave te fiderit 15, 6kV, N/St Shkodra I	Shkoder							6,595,018
124	Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabinave, F-1, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder					55,788,577		55,788,577
125	Zhvillim linje TM/TU me kabell 20kV XLPE Al 3x(1x240)mm ² , kabina tip box si dhe zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC ne F-5, N/St 220/35/20kV Bogie	Shkoder					32,507,865		32,507,865
126	Rikonstruksion i rrjetit TM, I rrjetit TU me ABC dhe I kabinave ne Fiderin F3R (Ujesjelles Ajror Rrile)	Shkoder				200,000,000	141,172,012		341,172,012
127	Vazhdimi i kalimit ne 20kV rrjeti TM, TM/TU dhe rrjeti TU ne zonen e Berdices, F-9, N/St 110/35/20/6kV Shkodra 2	Shkoder					102,535,267		102,535,267
128	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 16 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkoder					39,562,987		39,562,987
129	Zhvillim rrjeti TM/TU Shiroke -Zogaj, F-17,SH-2	Shkoder					25,029,997		25,029,997
130	Zhvillim i rrjetit TM/TU dhe ndertim kabina tip Box 20kV, F-5, N/St 110/20 kV Bushat I Ri	Shkoder					96,601,718		96,601,718
							107,000,000		107,000,000

131	Rikonstruktion dhe kalimi ne 20 kV i kabines Kufitim Ferracaku, F-17, N/St 110/35/20/6 kV Shkodra 2	Shkoder							2,799,939	2,799,939
132	Kalim nga 6 kV ne 20 kV I rrjetit TM, rikonstruktion I kabineve dhe rrjeti TU me kablo ABC ne fidirin 21, SH-1	Shkoder							147,010,825	147,010,825
133	Ndertim I kabines shtyllore Shenkoll I kab. 10, F-4R, N/St Rrile	Shkoder							3,311,369	3,311,369
134	Rikonstruktion I rrjetit TU dhe kabines shtyllore Bleran e Re 1, F-5, N/St SH-1	Shkoder							5,068,654	5,068,654
135	Rikonstruktion I rrjetit TU dhe kabines murore Muriqan I, fideri Zues, N/St Zues	Shkoder							6,343,931	6,343,931
136	Rikonstruktion I rrjetit TU dhe kabines murore Belaj rrushkuill, F-1, N/St Dajce	Shkoder							8,437,150	8,437,150
137	Ndertimi I kolektorit kablllore nga Puseta P1 deri ne Puseten P10, N/st. Plazh Velipoje 110/20kV, ndertimi I fiderave kablllore 20kV F1 dhe F2, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC te Plazh Velipoje (nga n.st. Velipoje - Kabina Box 22/F1)	Shkoder	52,000,000	140,000,000						192,000,000
138	Ndertimi I fiderave kablllore 20kV F3 dhe F4, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC n/st. Velipoje 110/20kV, (nga n.st. Plazh Velipoje - Kabina Box 17/F3)	Shkoder					176,753,882			176,753,882
139	Ndertimi I fideret kablllore 20kV F5, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC n/st. Velipoje 110/20kV, (nga n.st. Plazh Velipoje - Kabina Box 15/F5)	Shkoder							173,392,488	173,392,488
140	Rikonstruktion rrjeti TM, N/Stacion - Shoshan dhe Shoshan -Valbone, Fideri Ujssjells, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri	Kukes	40,000,000	40,000,000						80,000,000
141	Rikonstruktion i pjesshem I fiderit Ujssjelles, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri.	Kukes	40,000,000	40,000,000						80,000,000
V	Ndertim/Rikonstruktion kabinash elektrike		56,142,944	44,999,625	25,000,000	-	471,635,394	160,000,000		757,777,963

1	Rikonstruksioni kabinave 20 kV te N/stacioneve Kashar, Qender, Selite, Traktora -Tirane	Tirane							47,919,380		47,919,380
2	Vazhdimi i kthimit ne 20 kV te kabinave te fiderit 126 Kinostudio	Tirane							49,995,949		49,995,949
3	Rikonstruksion i kabinave 20 kV ekzistuese (ana ndertimore+cela TM) ne Qytetin e Elbasanit	Elbasan							110,000,000	100,000,000	210,000,000
4	Rikonstruksion i kabinave murature nga struktura ndertimore e paisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel)	Burrel							60,000,000	60,000,000	120,000,000
5	Rikonstruksion nga ana ndertimore e disa kabinave tip box dhe murature ne qytetin e Shkodres, N/Stacioni Sh-I&Sh-2	Shkoder							27,331,569		27,331,569
6	Rikonstruksion ne 20 kabina 'Murore & Box' me cela te motorizuara ne N/ST SH-1 dhe N/ST SH-2	Shkoder							51,815,626		51,815,626
7	Ndertimi te nje ndertese te re per qendren BACKUP – SCADA DCC – B	OSSH			25,000,000	25,000,000			50,000,000		100,000,000
8	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi, transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder	Shkoder		26,456,438		7,092,708					33,549,146
9	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi, transporti + kabine elektrike tip box) Durrës	Durrës		29,686,506		12,906,917					42,593,423
10	Rikonstruksioni I godines se ish Institutit te Naftes (kati I III-te)per OSHEE Fier	Fier							7,182,553		7,182,553
11	Rikonstruksion Zyrtar Agjensia Bilisht	Korce							7,390,317		7,390,317
12	Ndertim kabina shyllore Agjensia Erseke	Korce							60,000,000		60,000,000
VI	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)			-		176,118,144	400,000,000	130,000,000	750,621,079	912,483,509	2,369,222,732
I	Linja e TU me kabell ABC per kabinat 20 kV te linjes ajrore nga Ball Shaban deri ne Vrap, ShenKoll, Paret .	Tirane							140,000,000		140,000,000

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

15	Rrjeti TU me ABC i kabinave "Leshnice 1" dhe "Leshnice 2", fideri 14 Cerave, N/ST Petrushe	Korce						15,233,955		15,233,955
16	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Mbojje, kabinat Depot 101K, Morje 1, Mbojje 2	Korce						14,490,489		14,490,489
17	Rrjet TU me kablo me vetembajtje ABC Kabina Mollas 1, me transformator Sn = 250 kVA, Fideri 3M, N/St Mollas	Korce						1,317,244		1,317,244
18	Rrjet TU me kabell ABC fshati QINAM Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce				2,046,559				2,046,559
19	Rrjet TU me kabell ABC fshati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce				2,696,630				2,696,630
20	Rrjet TU me kabell me vetembajtje ABC kabina Rehove 1+2	Korce				3,420,379				3,420,379
21	Rrjet TU me kabell ABC fshati Rembec, Njesia Korce, Rajoni Korce	Korce								14,931,810
22	Rrjet TU me kabell ABC fshati Bitincke, Agjensia Bilisht, Rajoni Korce	Korce						14,931,810		14,931,810
23	Rrjet TU me kabell ABC fshati Pirg, Njesia Korce, Rajoni Korce	Korce						16,361,294		16,361,294
24	Rrjeti TU me kabell ABC fshati Barc, agjensia Korce, Rajoni Korce	Korce						19,779,857		19,779,857
25	Rikonstrukcion Rrjet TU me kabell ABC ne disa kabina te fshatrave Lushnje	Berat						9,506,418		9,506,418
26	Rikonstrukcioni I Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit AIU dhe A4B	Berat							119,333,509	119,333,509
27	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC ne kabinat "Box 1", "Box 2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1	Shkoder						37,945,410		37,945,410
28	Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU ne kabinen "zooteknike 2", F-2, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder						37,297,930		37,297,930
29	Sistemimi rrjetit TU, kabina Pompa, Fideri Nr. 1, N/St 110/10kV Lezhe	Shkoder						5,447,450		5,447,450
30	Spostim I rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F-15, Sh-2	Shkoder						842,925		842,925
								397,001		397,001

31	Rikonstruksion rrjeti TU I kabinave mureore dhe shlyllore "Qender Mes", "Qender Myselim", "Qender Myselim 2". Fideri I5, N/St 110/35/20/6 kV Sh-1	Shkoder						31,077,365		31,077,365
32	Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC Bicaj, Mustafaj, Brata, i Bozhe	Kukes							45,000,000	45,000,000
33	Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC Shiqen	Kukes							100,000,000	100,000,000
34	Rikonstruksion rrjeti TU me kabell ABC Terthore	Kukes							180,000,000	180,000,000
35	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel 'Zona Mamurras-Milot'	Burrel			100,000,000	50,000,000				207,600,000
36	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Peshkopi Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Guri I Kuq,Bellova,Pularia"	Burrel			100,000,000	40,000,000				180,200,050
37	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Bulqize Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Gjorice,Fushe Bulqize,Zerqen,Krast,Trbisht"	Burrel			200,000,000	40,000,000				280,220,000
VII	Teknologji Monitorimi									
1	Automatizimi I komandimit ne distance (RTU)	Tirane							385,000,000	420,000,000
2	Mirembajtje dhe komunikim te sistemit SCADA me 5 Nensacionet.	OSSH			10,000,000	10,000,000			187,000,000	187,000,000
3	Faza e dyte e instalimit, montimit te sistemit te kontrollit te rrjetit elektrik, kabinave te transformacionit ne Durres si dhe spostimi ne godinen e re	OSSH							198,000,000	198,000,000
VIII	Investime ne matjes									
					150,000,000	50,000,000			-	315,934,400
1	Matesa Lidhje te re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ose plane OSSH, Me sistem matje, perfishire aksesoret e nevojshem., (23,000	OSSH			100,000,000					195,934,400

[illegible]

Ne tabelen e planit 5-vjecar te investimeve vlera ne kolonen e vitit 2023 eshte 2,435,249,720 leke, ne te cilen vlera 568,144,820 leke eshte vlera investimeve ne process qe fillojne nga viti 2022, pra vlera e investimeve te reja per vitin 2023 eshte 1,867,104,900 leke.

Sipas komunikimeve te deges ekonomike OSHEE ,fondet ne dispozicion qe lejojne realizimet e investimeve te reja per vitin 2023, eshte 1.7 miliard leke.

Po sipas udhezimit te deges ekonomike te OSHEE, vlera totale e investimeve per vitin 2023 eshte shperndare sipas tabelës se meposhteme

	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Total
TOTALI ME FONDET E OSSH	186,142,944	2,435,249,720	3,163,228,324	2,219,568,298	8,004,189,286

Ne keto kushte ne tabelen e planit te investimeve 5-vjecare 2023-2027 te OSSH nuk jane paraqitur kerkesat reale per investimeve ne vitet 2024, 2025

Per pasoje, ne keshillin mbikqyres jane paraqitur dhe miratuar planet e investimeve per vitet:

Plani i investimeve per vitin 2024, i perditesuar, percjelle tek ju me shkresat nr.8959 Prot. Date. 08.08.2024, ne te cilin, 29% jane zera investimesh te planifikuara ne planin e investimeve 5-vjecare 2023-2027 , (ne tabelen “Perditesimi i planit te investimeve 5- vjecar, 2023-2027”, keto zera investimesh jane te markuara me ngjyre jeshile.)

Plani i investimeve per vitin 2025, I perditesuar, percjelle tek ju me shkresat nr.7393 Prot. Date. 10.07.2025, ne te cilin, 24% jane zera investimesh te planifikuara ne planin e investimeve 5-vjecare 2023-2027, (ne tabelen “Perditesimi i planit te investimeve 5- vjecar, 2023-2027”, keto zera investimesh jane te markuara me ngjyre jeshile.)

Me poshte po ju paraqesim perditesimin e planit 5-vjecar 2023-2027

Ne tabele sqarohet perditesimi i cdo zeri investimi

Perditesimi i planit te investimeve 5- vjecar, 2023-2027

Nr./viti ndryshimi	Emertimi i Investimit	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	Derguar ne ERE 2023-2027 me shkrasen ne NR.6713/1, date 26.07.2023							Perditesimi 2023-2027 me ndryshimet e viteve 2023, 2024 dhe 2025					Shënimet mbi ndryshimet
			Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)	
1	Ndërtim/rikonstruksion elektrik per Nensacionet		545,000,000	1,360,000,000	1,280,000,000	2,905,000,000	2,800,000,000	8,950,000,000	545,000,000	1,907,000,000	2,913,000,000	3,575,000,000	2,220,000,000	11,220,000,000	
1	Fuqizimi i N Stacionit 110/20kV Golem - Durres	Durres	135,000,000	40,000,000				205,000,000	135,000,000	40,000,000				205,000,000	
2	Ndërtimi i nensacionit te ri Vepi poje 110/35/20kV	Shkoder	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000	
3	Fuqizimi i N Stacionit 110/20kV Zogu Zi (2x40 MVA	Tirane	50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000	50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000	
4	Ndërtimi N/Stacionit te ri Fier 2 110/20kV	Fier	50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000	50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000	
5	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N Stacionit Kuçove 110/35/20/10/6kV	Berat	50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000	50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000	
6	Rikonstruksion i N Stacionit Pogradee 110/35/10kV ne 110/35/10/20kV	Pogradee	50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000	50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000	
7	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N Stacionit Corovode e Re 110/35/10kV	Berat	30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000	
8.2024	Rikonstruksion i N Stacionit Kalanaj 110/35/10kV	Fier				100,000,000	80,000,000	180,000,000		100,000,000	300,000,000	200,000,000		600,000,000	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026...
9.2024	"Ndërtimi i Nstacionit te ri Akerni 110/35/20kV dhe zhvillimi i linjes 35kV N/stac Akerni- Aeroporti Vlores"	Fier													
10	Fuqizimi i N Stacionit 35/6kV Pallati Kongreseve transformoret 35/20kV (2x15 MVA	Tirane				200,000,000	105,000,000	305,000,000				200,000,000	105,000,000	305,000,000	
11	Rikonstruksioni N Stacioni i Hec Lanabregas 35/10kV dhe fuqizimi me transformatore 35/20kV (1x15)MVA	Tirane				130,000,000	200,000,000	330,000,000				130,000,000	200,000,000	330,000,000	
12	Ndërtimi i N Stacionit Fushe Kruje 110/20kV (Zevendesimi i n/st. Mobile) Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Durres				185,000,000	100,000,000	285,000,000				185,000,000	100,000,000	285,000,000	
13	Fuqezimi i N Stacionit Shkodra 1 me transformatore Tr.2 110/20kV (1x40)MVA	Shkoder				70,000,000	100,000,000	170,000,000				70,000,000	100,000,000	170,000,000	
14	Rikonstruksion i impiantit 20kV N Stacioni Bushati 110/20kV	Shkoder				55,000,000		55,000,000				55,000,000		55,000,000	

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

15.2023	Rikonstruksion i N Stacionit Leshje nga 110/10kV ne 110/20/10kV	Shkoder	40,000,000	60,000,000	90,000,000	190,000,000	40,000,000	80,000,000	90,000,000	45,000,000	200,000,000	245,000,000	210,000,000	ndryshuar vlera ne 2023
16	Ndertimi i N Stacionit Lozhan 110/35/10kV 25MVA dhe linja 110kV	Korce				45,000,000	200,000,000	245,000,000				200,000,000	245,000,000	
17	Rikonstruksion N Stacioni 35/10kV Grapsh ne 110/20/10kV dhe ndertimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Gjirokastr				200,000,000	140,000,000	340,000,000				140,000,000	340,000,000	
18.2024	Rikonstruksion N Stacioni 35/10kV Livadhja ne 110/20/10kV dhe ndertimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Gjirokastr				180,000,000	300,000,000	480,000,000						Eshte bere investim ne N/Si e RI Xare ne nr rendor 20
19	Rikonstruksion N Stacioni 35/10kV Delvine ne 110/20/10kV dhe ndertimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Gjirokastr				140,000,000	200,000,000	340,000,000				200,000,000	340,000,000	
20.2024	Ndertimi i N/Stacionit te ri Xare 110/20/10kV	Gjirokastr						-					600,000,000	shirtese ne 2024
21.2024	Ndertimi i N/Stacionit te ri Piqeras 110/20/10kV	Gjirokastr						-					400,000,000	shirtese ne 2024
22	Ndertimi i N/Stacionit te ri Maskollat 35/10kV si dhe furnizimi me linje 35kV nga n stacioni B Curri	Kukes				150,000,000	200,000,000	350,000,000				200,000,000	350,000,000	
23	Fuqizimi i N Stacionit 35/20kV Knoshtudo (Faza II) transformoret (2x15 JMVA (1x15)MVA	Tirane				155,000,000		155,000,000					155,000,000	
24	Ndertimi i N Stacionit Uzina Dinamo 35/20kV Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Tirane				280,000,000	200,000,000	480,000,000				200,000,000	480,000,000	
25.2025	Ndertimi i N Stacionit Tamare 35/20/10kV dhe linja e re 35kV nga n stacioni Yut Palaj 35/20/10kV	Shkoder				210,000,000	200,000,000	410,000,000				200,000,000	480,000,000	perfishire ne investimein nr rendor 26
26.2025	Ndertimi i linjes re 35kV N.Si Vukpalaj - Tamare, dhe N Stacioni i ri 35/10kV ne Tamare.	Shkoder						-					460,000,000	Spostuar ne 2025, ish planifikuar 2026, saktet uar emri dhe vlera ...
27	Ndertimi i n.st. te ri Shengjin 110/20kV	Shkoder				300,000,000	300,000,000	600,000,000				300,000,000	600,000,000	
28	Rikonstruksion i N.st. Plasmas 110/35/20/6kV	Berat				205,000,000		205,000,000				205,000,000	205,000,000	
29	Rikonstruksion i N.st. Selence 110/35/6kV	Vlore				100,000,000	125,000,000	225,000,000				125,000,000	225,000,000	
30	Rikonstruksioni i N.st. Fushë Kuqe 110/35/6kV	Burrë				200,000,000	350,000,000	550,000,000				350,000,000	550,000,000	

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

12	Rikonstruktion Linja 35 kV Puke - Komani	Shkoder	130,721,062	-	-	74,200,000	1,254,663,415	848,000,000	2,233,384,477	113,490,503	920,274,290	814,000,000	74,200,000	728,000,000	74,200,000
III	Ndërtim Rrjetit TM														
I	Fiderit e rrit "E11" dhe "E12" 20kV nga n/st Farke - 110/20/10kV- deri tek kabina ekzistuese K-8 (Eklips) dhe fiderit "E12" nga kabina "K 8" deri tek dezgjimi i Vishnjës	Tirane					60,000,000		60,000,000				60,000,000		60,000,000
2.2024	Zhvillimi i fiderit TM 20kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklips) dhe kabina K13 deri ne kabinen K12. (E10) Kabinat elektrike dhe lujat TU me perçjelles ABC. Lidhja ne unaze e fiderit E11 e n/st Farke me fiderin E10 N/st Farke	Tirane									250,000,000		250,000,000		shtese ne 2024
3.2024	Kalimi nga 6kV ne 20kV i kabinave te fiderit 23 te N/Stacionit Selite	Tirane	17,230,559						17,230,559		17,230,559		17,230,559		ndryshuar, s postuar ne 2024
4.2025	Linja TM 20 kV zevendesimi i fiderit 34 dhe E5 ,nga Stermisi ne drejtim te Vishnjës, Arbane, N/ST FARKE- TIRANE Loti II	Tirane				100,000,000	120,000,000	220,000,000				170,000,000	170,000,000		Spostuar ne 2025, ish planifikuar 2026...
5.2025	Zhvillimi i kolektorit kabllor ,tunel kabllor per sistemin e kablllove qe dalin nga n/st Rajonal 220/35/20kV	Tirane										100,000,000	100,000,000		shtese ne 2025
6.2025	Eliminimi i ishujve 6/10 kV dhe kalimi i tyre ne rrjetin 20 kV ne Rajonin Tirane ne N/Stacionet TEC Kombinat 35/6 kV, N/St Dinamo, Vore, Mezez dhe Farke	Tirane										60,000,000	60,000,000		shtese ne 2025
7	Zevendesimi me 20 kV te fiderave Mezes 107 etj. me furnizim nga fideri 32 Kadhur	Tirane	61,798,937						61,798,937				61,798,937		
8	Kalimi i fiderit 118 N/Stacioni Kinostudio 36/9 kV , ne rrjetin e ri TM 20 kV.	Tirane	51,691,566						51,691,566				51,691,566		
9	Ndërtimi i rrjetit TM 20kV , ndërtimi i kabinave te reja, rikonstruktion i kabinave ekzistuese te N.st. Vallas 110/20kV	Tirane				300,000,000	300,000,000	600,000,000					300,000,000	300,000,000	
10	Zhvillimi i rrjetit shperndares 20 kV ne zonen e City-Park Vore - Rinas	Tirane				100,000,000	262,000,000	362,000,000					100,000,000	262,000,000	
11.2024	Rikonstruktion i rrjetit TM te fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan				80,000,000		80,000,000			86,074,026		86,074,026		Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026...
12.2024	Rikonstruktion i rrjetit TM te fiderit Shpallit Nst Mjekes	Elbasan				100,000,000		100,000,000			113,838,965		113,838,965		Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026...
13	Rikonstruktion i rrjetit TM te fiderit Nr. 3 Gramsh	Elbasan				107,688,890		107,688,890					107,688,890		
14	Rikonstruktion i fiderit 1, N/St Fiber	Elbasan				70,329,090		70,329,090					70,329,090		
15	Rikonstruktion i fiderit 2, N/St Fiber	Elbasan				47,025,839		47,025,839					47,025,839		
16.2024	Rikonstruktion i fiderit Potomit ,10kV N/Stacioni Corovode 35/10kV	Berat									37,360,702		37,360,702		shtese ne 2024

[illegible]

35.2025	Zgjatimi i fiderit 20 kV, F7 dhe lidhja ne unaze me F14 nenstacioni Kashar si dhe nderitimi i nje pike shperndarase	Tirane	1,120,176,489	852,660,026	414,000,000	3,330,247,923	4,902,902,635	10,649,987,072	1,507,704,405	4,908,049,114	3,558,533,375	2,012,280,843	2,684,251,026	65,000,000	65,000,000	Shtese ne 2026 gusht
IV	Ndertim/Rikonstrukcion Rrjetit TM /TU															3,074,486,084.00
1	Faza e dyte e zgjerimit dhe rikonstrukcionit te Fiderit E 10 ne zonen e Berzates se bashku me rrjetin Tu me perqeljece ABC	Tirane	40,000,000	50,000,000	70,000,000			160,000,000	40,000,000	50,000,000	70,000,000				160,000,000	
2	Fider I ri 20 kV E 13 i N/Stacionit Farke 110/20/10 kV	Tirane	48,800,160					48,800,160	48,800,160						48,800,160	
3	Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rrjetit Vore	Tirane	42,310,269	50,000,000				92,310,269	42,310,269	50,000,000					92,310,269	
4	Linja ajrore TM 20 kV per zverendesimin e fiderit E5 N/Stacioni Farke, nga degjizimi i Vishnjes ne drejtim te Baldushit deri ne Ball Shaban, kabinat e reja dhe linja TU me kabl ABC	Tirane				65,000,000		65,000,000				65,000,000			65,000,000	
5.2024	Ndertimi i kabinave te reja shlylore dhe linjat perkatese TM dhe linjat tu me kabl abc ne fiderat F1,F2 dhe F3 te n/stacionit 35/6 kv Ndroq	Tirane	96,676,817			165,312,464		165,312,464							110,000,000	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026...
6	Ndertimi i 12 kabinave te reja shlylore dhe linjat perkatese TM ne fiderin F4 TE N/Stacionit 35/6 KV NDRROQ si dhe linjave TU me kabl ABC i 18 kabinave	Tirane						96,676,817	96,676,817						96,676,817	
7	Ndertimi i kabinave dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R3 I N/Stacionit Vore dhe nga fiderat F8 dhe F32 te N/Stacionit Kashar, te cilet do te zverendesojne kabinat 6 kv te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore.	Tirane	50,000,000	76,660,026				126,660,026							126,660,026	
8.2024	Ndertimi i 2 Kabinave te reja 20 kV dhe rrjetit TU me kabl ABC ne fiderin Q1 dhe Q2	Tirane	30,000,000					30,000,000	50,000,000	76,660,026					30,000,000	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2023
9.2024	Zhvillimi i rrjetit TM 20kV,Fidera te rrjetit 18 dhe 19 N/St. Ibc. Kabinat elektrike dhe linjat TU me perqeljes ABC	Tirane													180,000,000	shtese ne 2024
10.2024	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV 330/1 nga N/Stacioni Selite,per uljen e ngarkeses se fiderit 330(N/Stacioni Selite) ne unaze me fiderin L17 (N/Stacioni Qender)	Tirane													18,000,000	shtese ne 2024
11.2024	Kalimi nga 6kV ne 20kv i fiderit 91 dhe fiderit 75 N/Stacioni Traktora	Tirane													25,300,000	shtese ne 2024
12.2024	Rikonstrukcion i kabinave Zgathur dhe nderitimi i rrjetit TU me perqeljes ABC, Fideri 142 N/Stacioni Vallas.	Tirane													13,000,000	shtese ne 2024
13.2024	Zhvillimi i lidhjes unazore 20kV, te fiderave F16 dhe F17(N/Stacioni Kashar)	Tirane													3,680,000	shtese ne 2024

14	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV , Z17 nga N/Stacioni Zogu I Zi, per uljen e ngarkesave te Fiderit 321(N/Stacioni Selite) ne unaze me Fiderin L3 (N/Stacioni Qender).	Tirane				-				18,000,000								slitese ne 2024
15	Zhvillimi i rrjetit TM 20kV,Fiderit T8,Nsac Kombinat 110/20kV, per furnizimin e TEDA	Tirane				-				33,000,000								slitese ne 2024
16	Zhvillimi i dy kabineve te reja K18 dhe K19 ,linje TM dhe linjat TU me percjeltes ABC, te fiderit J10 N/Stacioni Traktora	Tirane				-				32,000,000								slitese ne 2024
17	Ndertimi i fiderave te rinj, P1,P6,P7,P8,P0,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve” 35/20 kV-Tirane	Tirane			144,498,280	144,498,280							144,498,280					
18	Ndertimi i linqes TM kabllore 20 kV dhe kabines se re bols 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabell me vetembajlje ABC , per furnizimin e lagjes Sharre	Tirane			20,756,450	20,756,450									20,756,450			
19	Ndertimi i fiderave te rinj, P1 P2,P3,P4 dhe P5 , 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tirane	Tirane			64,289,525	64,289,525							64,289,525					
20	Ndertimi i kabines PSh 16/1 si dhe linjat e rrjetit TU me kabell ABC, me furnizim nga fideri F8, N/Sht Kashar	Tirane				13,533,267	13,533,267											
21	Furnizim me TM 20kV i kabines se re murature "Bola e Lutëve", fideri F.29, N/Sht Kashar 110/20kV	Tirane				3,708,518	3,708,518											
22	Zeveduesimi i daljeve te para kabllore te fiderave 6 kV, N/Sht Vore (me punonjesit tane)	Tirane				2,673,812	2,673,812											
23	Ndertimi i linqes dhe kabines se re shlytllore “Lagja Varosh” si dhe linja TU me kabell me vetmbajlje ABC	Tirane				5,637,580	5,637,580											
24	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore ne kabllore i kabina elektrike Paslio Hyst,Anxhelio Kaza,Iris Dollaku 2 A,1 Dollaku 1,si dhe rrjeti TU i kabines K2,Pallo Hyst ne NST Traktora	Tirane				51,212,956	51,212,956											
25	Furnizimi me TM/TU 20kV i kabines se re "Box Instituti Qender", Fideri A8, N/Sht Rajonal, qe do te sherbeje per ndarje ngarkesash (me punonjesit tane)	Tirane				4,370,639	4,370,639											
26	Eliminimi i Fiderit 82, 6kV dhe furnizimi TM/TU 20/0.4kV i kabinese se re "Sikozë 2 Box" (me punonjesit tane)	Tirane				5,574,471	5,574,471											
27	Furnizimi me TM 20kV dhe TU me kabell me vetmbajlje ABC i kabineve te reja box KL8, KL9, fideri J10, N/Sht Traktora	Tirane			25,117,295	25,117,295												Perfshire ne zerm e investimit me nr rendor.

A: Bulevardi "Gjerqj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NPT: L81530018E

[illegible]

NIPT: L81530018E

[illegible]

[illegible]

A: Bulevardi "Gjeri Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

[illegible]

[illegible]

115 2024	Ndërtimi i Fiderave 20kV L10 N.St. Vloja 1 dhe Fideri J10 N.St. Vlorë për furnizimin e objekteve në Portin e Vlores	Vlore	55,192,960	70,000,000	70,000,000				195,192,960	55,192,960	16,258,755			71,451,715	Rialokim, n dryshuar ne 2024
116	Rikonstrukcioni I rrejtë TM në fiderin KO1, rikonstrukcion kabinash dhe rrejtë TU me kabell me vetëmbajtje ABC	Vlore				51,878,850			51,878,850			51,878,850		51,878,850	
117	Rikonstrukcioni I rrejtë TM në fiderin KO3, rikonstrukcion kabinash dhe rrejtë TU me kabell me vetëmbajtje ABC	Vlore				81,629,736			81,629,736			81,629,736		81,629,736	
118	Rikonstrukcioni I rrejtë TM në fiderin SE3, rikonstrukcion kabinash dhe rrejtë TU me kabell me vetëmbajtje ABC	Vlore				55,982,877			55,982,877			55,982,877		55,982,877	
119	Rikonstrukcion rrejtë TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrejtë TU me kabell me vetëmbajtje ABC ne njollat pa investim ne zonen Lumit te Vlores	Vlore				190,000,000			190,000,000			190,000,000		190,000,000	
120	Rikonstrukcion rrejtë TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrejtë TU me kabell me vetëmbajtje ABC ne njollat pa investim ne zonen e Bashkise Vlore	Vlore				60,000,000	60,000,000		120,000,000			60,000,000	60,000,000	120,000,000	
121	Ndërtimi i linjes kablore 20kV N.St. Oriktum - Tuneli Llogarase	Vlore	50,000,000	56,000,000	54,000,000				160,000,000	50,000,000	56,000,000	54,000,000		160,000,000	
122	Ndërtimi i linjes 20kV ajrore N.St. Palase - Tuneli Llogarase	Vlore	31,000,000	30,000,000					61,000,000	31,000,000	30,000,000			61,000,000	
124 2024	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrejtë TU per Fiderin Fratar, Nensacioni Pocen 35/6 kV, dhe vazhdimi i kabinave te mbetura te fiderit Arantis, N/st Pika Shperndarese Ballsh.	Fier					100,000,000	100,000,000	100,000,000		70,000,000			70,000,000	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2027
125 2025	Rikonstrukcioni i rrejtë TM, TU dhe kabinave te Fiderit Agim 1, Nensacioni Libofshe 35/10 kV	Fier					32,233,258	32,233,258	32,233,258					-	perfishire ne zerin me Nr rendor 180
126	Ndërtimi i kabinës së re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetëmbajtje te tipit ABC per kete kabine	Fier	5,000,000						5,000,000	5,000,000				5,000,000	
127 2025	Ndërtimi i linjave te reja 6 dhe 10 kV qe do te furnizojne kabinat e reja Varibop 1, Frakull e Vogël 2, Frakull e Madhe 1, Buzemadh 3, Buzemadh 4, Gorishtore si dhe ndërtimi i linjave te reja me kabell me vetëmbajtje ABC per keto kabina	Fier				27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000					-	perfishire ne zerin me Nr rendor 181
128 2025	Rikonstrukcioni I rrejtë TM, TU dhe kabinave te Fiderit Mbrostar Ura, Nensacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier					68,680,800	68,680,800	68,680,800					-	perfishire ne zerin me Nr rendor 180
129 2025	Rikonstrukcioni I rrejtë TM dhe rikonstrukcioni I kabinave te mbetura	Fier					63,571,000	63,571,000	63,571,000			50,642,300		50,642,300	Spostuar ne 2024, ish

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

	dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV																						planifikuar 2027
130/2025	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinaive te Fiderit Pulari 2, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier							54,180,000	54,180,000					70,434,000								Spostuar ne 2025, ish planifikuar 2027
131/2025	Rikonstruksioni I rrjetit TM per fiderat Nr.15,16, 20, 26 Kafaraj, N/ST Kafaraj 35/6 kV si edhe rikonstruksioni I 4 kabinaive te mbetura dhe rrjeti TU I lye.	Fier							98,750,000	98,750,000					70,434,000								perfishire ne zerrin ne 181 pa fiderin 20 sepse eshte bere
132/2024	Rikonstruksioni I rrjetit TM per fiderat Nr.1,2,3, Cakran, Buzmadh dhe Varibob, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier							99,850,000	99,850,000					99,850,000								Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2027
133/2025	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinaive te Fiderave Kompresori 1 dhe 2, Nenstacioni Patos 35/6 kV	Fier							80,230,000	80,230,000					104,299,000								Spostuar ne 2025, ish planifikuar 2027
134/2025	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinaive te Fiderave Oficine, Nenstacioni Patos 35/6 kV	Fier							60,550,000	60,550,000					78,715,000								Spostuar ne 2025, ish planifikuar 2027
135	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinaive te Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinaive te mbetura te fiderit Qytet 4, Nenstacioni Patos, 35/6 kV	Fier							99,862,300	99,862,300													
136	Ndertimi i Degezimit te ri TM ne Fiderin Nr.16 dhe kabines se re shqytlore "Sheq Levani 3", Nenstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjesis tane)	Fier							4,000,000	4,000,000													
137/2025	Ndertimi I rrjetit TM 20 kV te Ndertimi I kabinaive te reja dhe rikonstruksioni I kabinaive ekzistuese te N/stacionit te ri Leskovik 110/10kV	Korce						300,000,000	300,000,000	600,000,000													Nuk eshte I domosdoshem, realizua r investime te tjera
138/2024	Rikonstruksion rrjet TM fideri 19n/st Korce pjesa ishati Drenove, rrjet TU me ABC Fshati Drenove, rikonstruksion kabina Qyteti 1 Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe ndertim kabine e re me murature te Drenove 3	Korce							19,845,156	19,845,156					26,200,000								Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2027
139/2024	Rrjet TU me kablo me vetenbajtje ABC Kabina Vlocoisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabinat Vlocoisht 1+2 dhe ndertim kabine e re murature Vlocoisht 3	Korce							18,440,353	18,440,353					21,200,000								Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2027
140/2024	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstruksion kabina Zvirine 1+2+3	Korce							11,788,268	11,788,268					13,600,000								Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2027
141/2024	Rrjet TU me kablo me vetenbajtje ABC Kabina BOROVE, dhe ndertim	Korce						2,176,809		2,176,809					2,500,000								Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2027

[illegible]

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

[illegible]

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

187	2024	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kablë ABC ne kabinat e fiderit Nr. 11/10 kV dhe Nr. 3/10 kV N/Stacioni Bicukas-Divjake 35/10 kV	Berat															100,000,000			100,000,000	shitesa ne 2024
188	2025	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC, sistemin kabinash ne Fiderin 4B dhe Fiderin 6B N/Stacioni Bicukas 35/10 kV	Berat																		166,000,000	shitesa ne 2025
189	2025	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC, sistemin kabinash ne Fiderin 8 (6 kV) N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Saver,Kruje e poshteme,Zhymë,Fieri I Ri,Kruje e Sipërme, Gjaze,Ngurrez e Madhe dhe e Vogël dhe Arrez)	Berat																		110,000,000	shitesa ne 2025
190	2025	Zhvillimi i rrjetit TU me kablë ABC sistemin kabinash ne Fiderin Nr.2(10kV) (18kabina), Fideri Nr.3(10kV) (4kabina) dhe Fideri Nr.4(10kV) (12kabina) N/Stacioni Hygëgjokaj 35/10kV	Berat																		130,000,000	shitesa ne 2025
191	2025	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC sistemin kabinash ne Fiderin 5 N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Zonat Saver,Bishqethem,Shakuj,Lunth,Gorr e Krapiç,Pirre dhe kancishti)	Berat																		92,000,000	shitesa ne 2025
192	2024	“Ndertimi i nje segmenti pusta dhe tuba (pjesë e fiderit 10 kV, 8-18 Perpunim Druri , N/SH Pogradeç) ne rrugen e Tushemishtit”	Korce															16,000,000			16,000,000	shitesa ne 2024
193	2025	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV, kabina elektrike,rrjet TU me ABC Fiderat 8 N.s.t Pogradeç dhe ndertimi I tubave dhe puseteve per daljet e fiderave 2,3,4,8 (Loti 1)	Korce																		140,000,000	shitesa ne 2025
194	2025	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,kabina elektrike,rrjet TU me ABC Fiderat 2,3 N.s.t. Pogradeç (Loti 2)	Korce																		218,000,000	shitesa ne 2025
195	2025	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,kabina elektrike,rrjet TU me ABC Fiderat 4 N.s.t. Pogradeç (Loti 3)	Korce																		117,000,000	shitesa ne 2025
196	2024	Rikonstruksioni i kabinave elektrike ne permblytura ne ayrteti e Vlores	Vlore															60,736,011			60,736,011	shitesa ne 2025
197	2025	Zhvillimi i rrjetit TU me kablë ABC dhe rikonstruksion i kabinave ne Zonat; Zhane Sektor, Thanasaj, Gramsh-Fideri Nr.2 6kVN stacioni Lushnje- Qender 35/6kV	Berat																		90,000,000	Shitesa 2025_gusht
198	2025	Mbyllja e unazes midis F12 dhe F15 nst fieri i ri, ndertimi i kabinave, Mbyet 2, box e re drejtim Levanti, dhe kabine e re shyllore Stallat e derrave, rrjeti TU me ABC ne Fideri Pularia 1 nstacioni Fier 1 35/6kV dhe rrjeti TU me ABC i kabinave ne ish komunën Prakull dhe Chitrari	Fier																		70,000,000	Shitesa 2025_gusht

199 2025	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrejtet TU (Agjensia Patos) Rikonstruksioni kabinave dhe rrejtet TU ne kabinave (Agjensia Balisb)	Fier	44,999,625	25,000,000	-	471,635,394	160,000,000	757,777,963	44,999,625	9,000,000	80,000,000	373,716,014	160,000,000	80,000,000	80,000,000	Shese 2025-gusht
V	Ndertim/Rikonstruksion kabinash elektrike															
1.2025	Rikonstruksioni kabinave 20 kV te N/stacioneve Kashar, Qender, Selite, Traktoria -Tirane	Tirane				47,919,380		47,919,380								Sposuar ne 2025, ish planifikuar 2026,ndrysh huar vlera...
2	Vazhdimi i kimit ne 20 kV te kabinave te fiderit 126 Kilo studio	Tirane				49,995,949		49,995,949				49,995,949				
3.2025	Punime civile, rrethim, hidroizolim ndertesat e N Stacione DTL	DTL														shesa ne 2025
4	Rikonstruksion i kabinave 20 kV ekzistuese (ana ndertimore+reela TM) ne Qytetin e Elbasanit	Elbasan				110,000,000	100,000,000	210,000,000				110,000,000	100,000,000			
5	Rikonstruksion i kabinave murature nga struktura ndertimore e paisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel)	Burrel				60,000,000	60,000,000	120,000,000				60,000,000	60,000,000			
6	Rikonstruksion nga ana ndertimore e disa kabinave tip box dhe murature ne qytetin e Shkodres, N/Stacioni Sh-IrSh-2	Shkoder				27,331,569		27,331,569				27,331,569				
7	Rikonstruksion ne 20 kabina 'Murore & Box' me cela te motorizuara ne N/ST SH-1 dhe N/ST SH-2	Shkoder				51,815,626		51,815,626				51,815,626				
8.2024	Ndertimi te nje ndertesate te per qendren BACKUP - SCADA DCC - B	OSSH	25,000,000	25,000,000		50,000,000		100,000,000	25,000,000	9,000,000						Rialokim,n dryshuar ne 2024
9	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder	Shkoder	7,092,708					33,549,146	7,092,708						33,549,146	
10	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Dures	Dures	12,906,917					42,593,423	12,906,917						42,593,423	
11	Rikonstruksioni i godines se ish Instituti te Nafes (kati I III-te)per OSHEE Fier	Fier				7,182,553		7,182,553				7,182,553			7,182,553	
12	Rikonstruksion Zyrtar Agjensia Bilisht	Korce				7,390,317		7,390,317				7,390,317			7,390,317	
13	Ndertim kabina shyllore Agjensia Erseke	Korce				60,000,000		60,000,000				60,000,000			60,000,000	
V1	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)		176,118,144	400,000,000	130,000,000	750,621,079	912,483,509	2,369,222,732	171,183,618	1,323,602,310	836,600,000	432,258,821	385,650,000		3,149,294,749	
1	Linja e TU me kabell ABC per kabinat 20 kV te linjes ajrore nga Ball Shaban deri ne Vrap,ShenKoll,Paret	Tirane				140,000,000		140,000,000				140,000,000			140,000,000	
2	Zgjidhim me rrjet TU me kabell me vetemabjete ABC i dalje ekzistuese nga kabina K13, Fideri E10 , N/ST Farke 110/20/10kVA	Tirane				725,616		725,616				725,616			725,616	

3.2025	Rikonstruksioni I rrjetit TU me kablo me vetenbajtje ABC ne zonat Rurale te Tiranes ne kabinat e fiderave E5 N/Stacion Furke 110/20/10 kV , Fiderat Gjokaj , Preze , Vore , Rinas N/Stacion Yore 35/20/6 kV - Fiderat 141 , 150 N/Stacion Vallas 35/6 kV Fideri 101 N/Stacion Mezez 35/6 kV	Tirane	4,934,526																150,000,000				shitesh ne 2025
4.2024	Zgjidhimi I rrjetit TU te kabina elektrike ne NST TEC, Kombinat dhe NST Kombinasi e ri 110/20 kV.	Tirane	25,000,000																				Perfshire ne inv te tjera
5	Ndertimi I 2 kabinave te reja dhe Rrjeti TU ne zonen e Dajtit	Tirane																					
5	Rikonstruksioni I rrjetit TU kabina Zenel, Fideri 2q, N/St Tec	Tirane																					
6	Ndertimi I rrjetit te ri TU me ABC te N st. Vallas 110/20kV	Tirane																					
7.2024	Investim ne rrjeti TU ne Kruje/ Fushë Kruje	Durres																					
8.2024	Rikonstruksion I rrjetit TU me ABC Zona Bujtes Elbasan	Elbasan																					
9	Rikonstruksioni i rrjetit TU te fiderit Nr.2 , 20 kV, N/stacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Feme N/St Fieri 2	Fier																					
10	Rikonstruksioni I rrjetit TU dhe kabinave te fiderit Strum dhe Roskovec 3, N/stacioni Matke 35/10 kV	Fier																					
11	Rikonstruksioni I rrjetit TU per kabinat e fiderave Kute, Nr.3 , Nr.5, Nr.6, Nr.8 dhe Nr.9 Ballsh.	Fier																					
12.2024	Rrjet TU me kabllo ABC Fshati Boboshitce kabina Boboshitce I Nat Gjane , Fideri Fshat	Korce																					
13.2024	Rrjet TU me kabllo ABC I kabinave te fiderit 8, N/stacioni Bilisht (kabinat e fshatrave te bashkise Pustec)	Korce																					
14.2024	Rrjet TU me ABC fiderat 1,2,3,4,6 dhe 7 N/St Korce, qytet KORCE	Korce																					
15.2024	Rrjeti TU me ABC i kabines "Shqitas", N/St Petrushe, Fideri 11	Korce																					
16.2024	Rrjeti TU me ABC i kabinave te fshatit Symtize ,Korce	Korce																					
17.2024	Rrjeti TU me ABC i kabinave te fshatit Dritbas N/St TEC MALIQ , fideri Komunal 2	Korce																					

18	2024	Rrjet TU me kabell ABC qytet Leskovik Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce				12,615,240	12,615,240				12,615,240	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
19	2024	Rrjeti TU me ABC i kabinave "Leshnice 1" dhe "Leshnice 2", fideri 14 Ceave,N/S/T Petrushe	Korce				15,233,955	15,233,955				15,233,955	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
20	2024	Rrjet TU me kabell ABC Ishati Mborje, kabinat Depot 10IK, Morje 1, Nborje 2	Korce				14,490,489	14,490,489				14,490,489	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
21	2024	Rrjet TU me kabello me vetembajlje ABC Kabina Molias 1, me transformator Sn = 250 kVA , Fideri 3M, N/St Molias	Korce				1,317,244	1,317,244				1,317,244	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
22		Rrjet TU me kabell ABC Ishati QINAM Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce				2,046,559	2,046,559				2,046,559	
23		Rrjet TU me kabell ABC Ishati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce				2,696,630	2,696,630				2,696,630	
24		Rrjet TU me kabell me vetimbajlje ABC kabina Relbove 1+2	Korce				3,420,379	3,420,379				3,420,379	
25	2024	Rrjet TU me kabell ABC Ishati Rembec, Njesia Korce, Rajoni Korce	Korce				14,931,810	14,931,810				17,200,000	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026...
26	2024	Rrjet TU me kabell ABC Ishati Bitineke, Agjensia Bilisht, Rajoni Korce	Korce				16,361,294	16,361,294				16,361,294	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
27	2024	Rrjet TU me kabell ABC Ishati Pirg, Njesia Korce, Rajoni Korce	Korce				19,779,857	19,779,857				19,779,857	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
28	2024	Rrjeti TU me kabell ABC Ishati Barc, agjensia Korce, Rajoni Korce	Korce				9,506,418	9,506,418				9,506,418	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026 ...
29	2024	Rikonstrukcion Rrjet TU me kabell ABC ne disa kabina te fshatrave Lushnje	Berat				119,333,509	119,333,509					Pershire ne zerat e investimit me ur rendor 186 dhe 187, 189 dhe 191
30	2024	Rikonstrukcioni I Rrjeti TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit ATU dhe AAB	Berat				37,945,410	37,945,410				41,859,709	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026, ...
31		Rikonstruktion rrjeti TU me kabell ABC ne kabinat "Box 1", "Box 2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1	Shkoder				37,297,930	37,297,930				37,297,930	

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

32.2024	Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU ne kabinen "zooteknike 2", F-2, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder				5,447,450			5,447,450			5,447,450					Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026...
33	Sisteminimi rrjeti TU, kabina Pompa, Fideri Nr. 1, N/St 110/10kV Lezhe	Shkoder				842,925			842,925			842,925					842,925
34	Spostim i rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F-15, Sh-2	Shkoder				397,001			397,001			397,001					397,001
35.2024	Rikonstrukcion rrjeti TU i kabineve murore dhe shtyllore "Qender Mes", "Qender Myselim", "Qender Myselim 2", Fideri 15, N/St 110/35/20/6 kV Sh-1	Shkoder				31,077,365			31,077,365			31,077,365					31,077,365
36.2024	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabl ABC Bieaj, Mustafaj, Brataj, Bozhe	Kukes			45,000,000				45,000,000			52,000,000					52,000,000
37.2024	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabl ABC Shtiqen	Kukes			100,000,000				100,000,000			102,000,000					102,000,000
38.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabl ABC Terthore	Kukes			180,000,000				180,000,000								100,000,000
39.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabl ABC Cerreze	Kukes															25,000,000
40.2025	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabl ABC Vranisht dhe ndertim kabine Cenali +Rikonstrukcion rrjeti TM/TU Lagje 1,2,3,7	Kukes															80,000,000
41.2024	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4KV me kabl "A B C" neNjesit Peshkopi,Bulqiz, Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Rrethinat e Qyteti Peshkopi,Borçan,Zerqan, Fushe Bulqiz"	Burrel															235,000,000
42.2025	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4KV me kabl "A B C" ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel : Zonat" Fushe Shullaz,Fush Milot,Adriatik"	Burrel															131,000,000
43.2025	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4KV me kabl "A B C" ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona. Thuman"	Burrel															116,400,000
44.2025	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4KV me kabl "A B C" ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona. Bushmeh,Dukagjin"	Burrel															104,200,000
45	Rikonstrukcion i rrjetit "TU 0.4KV me kabl "A B C" ne njesine Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel "Zona Manurras-Milot"	Burrel			57,600,000				57,600,000			100,000,000					207,600,000
46	Rikonstrukcion i rrjetit "TU 0.4KV me kabl "A B C" ne njesine Peshkopi Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Guri I Kug,Bellova,Pullaria"	Burrel			40,200,050				40,200,050			100,000,000					180,200,050

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

47	Rikonstrukcion i rrjetit 'TU' 0.4kV ne kabl 'A.B.C' ne njesine Bulqize Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Gjorece, Fushë Bulqize, Zërrë, Kras, Tërbisht"	Burrel	40,220,000	200,000,000	40,000,000	280,220,000	40,220,000	200,000,000	40,000,000	280,220,000
VII	Teknologji Monitorimi		15,000,000	10,000,000	10,000,000	385,000,000	187,000,000	10,500,000	30,000,000	425,500,000
I	Automatizimi i komandimit ne distance (RTU)	Tirane								187,000,000
2.2024	Upgrade Sistemi PowerFactory	OSSH						5,250,000		5,250,000
3.2024	Modul i administrimit te projekteve	OSSH								5,250,000
4.2025	Upgrade Sistemi PowerFactory (Team Edition version unlimited, 6-10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3 vjet.)	OSSH						5,250,000		5,250,000
5.2024	Mirenblotje dhe komunikim te sistemit SCADA ne 5 Nensacionet.	OSSH	15,000,000	10,000,000	10,000,000				30,000,000	30,000,000
6	Faza e dyte e instalimit, montimit te sistemit te kontrollit te rrjetit elektrik, kabinave te transformacionit ne Durres si dhe spostoni ne godinen e re	OSSH				198,000,000	198,000,000			198,000,000
VIII	Investime ne matjes		115,934,400	150,000,000	50,000,000	-	315,934,400	443,768,000	480,465,852	1,040,168,252
I	Matesa Lidhje te re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ose plane OSSH, Me sistem matje, perfshire aksesoret e nevojshem,(23,000 matesa 2023), (50,000 matesa 2024) dhe (50,000 matesa 2025)	OSSH	95,934,400	100,000,000			195,934,400	100,000,000		195,934,400
2.2024	Matesa Lidhje te re Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ ose plane OSSH , ne sistem matje,perfshire aksesoret e nevojshem,(21450 matesa per vitin 2024)	OSSH					-	274,668,000		274,668,000
3.2024	Blerje Aparate Testues Emlon (6 aparate)	OSSH						19,100,000		19,100,000
4.2025	Matesa Lidhje te re,Likuidim anomalish ,verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ ose plane OSSH , ne sistem matje,perfshire aksesoret e nevojshem,(2025-2027)	OSSH							375,465,852	375,465,852
5.2025	Instalim matje on line per 415 fiderat e N Stacioneve	OSSH							55,000,000	55,000,000
6	Instalimit te Sistemit i matjes inteligjente te Bilancit te energjise ne kabinat elektrike TM-TU, ne konsumatoret private,Software dhe integrimi i tyre ne platformen MDM	OSSH	20,000,000	50,000,000	50,000,000		120,000,000			120,000,000
IX	Investime ne sistemin e matjes		180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

1	X	Projekti i Furnizimit dhe instalimit të Sistemit i matjes Smart i Bilancit të energjisë në kabinet elektrikë .Software dhe integrimi i tyre me platformen MDM (Etapa e parë)	OSSH	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894	180,000,000	285,568,298	1,498,000,000	285,568,298	-	1,056,704,894	-	-	1,056,704,894	3,095,000,000	shitesh ne 2024
		Blerje Pajisje makineri																	shitesh ne 2024
	1.2024	Blerje pajisje primare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH																shitesh ne 2024
	2.2024	Blerje pajisje sekondare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH																shitesh ne 2024
	3.2024	Blerje pajisje per nyjet komutuese te Linjave dhe N/Stacione	OSSH																shitesh ne 2024
	4.2024	Blerje te pajisjeve komutuese per kabinet elektrike (Cela 20 kV)	OSSH																shitesh ne 2024
	5.2024	Blerje Transformatore Fiqje per Kabina elektrike	OSSH																shitesh ne 2024
	6.2024	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fishek	OSSH																shitesh ne 2024
	7.2024	Blerje Transformatore Instrumentale TU & TM (Transformator rryme TM&TU, Transformator Tension)	OSSH																shitesh ne 2024
	8.2024	Kabell ABC dhe aksesore	OSSH																shitesh ne 2024
	9.2024	Instalim Kontroll monitorim sistem kamera per N Stacione	OSSH																shitesh ne 2024
	10.2024	Blerje kabllit 35kV XLPE (1x240mm2	OSSH																shitesh ne 2024
	11.2024	Shpenzime per emergjencat	OSSH																shitesh ne 2024
	12.2025	Pajisje primare, sekondare dhe pajisje ndihmese per N/stacione dhe Linjat TL	OSSH																shitesh ne 2025
	13.2025	Celësa TL/TM, Ndëresa TL/TM dhe TT per ambient te jashtem	OSSH																shitesh ne 2025
	14.2025	Cela 20 kV per N/Stacione	OSSH																shitesh ne 2025
	15.2025	Pajisje transformuese, Transformator Fiqje dhe Cela 40.5 kV per N/Stacione	OSSH																shitesh ne 2025
	16.2025	Blerje te pajisjeve komutuese per kabinet elektrike (Cela 20 kV)	OSSH																shitesh ne 2025
	17.2025	Blerje Transformatore Fiqje per Kabina elektrike	OSSH																shitesh ne 2025
	18.2025	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fishek	OSSH																shitesh ne 2025
	19.2025	Blerje Automjeti me aparatura per testimin dhe gjetjen e defekteve te kablllove	OSSH																shitesh ne 2025
	20.2025	Kabell ABC dhe kabell TU	OSSH																shitesh ne 2025
	21.2025	Pajisje DGA per analizimin e gazrave ne transformatore fiqje	OSSH																shitesh ne 2025, gusht

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

[illegible]

Tregojne zera investimesh te situara ne plan ,te pa perfshira ne planin fillestar 2023-2027

Tregojne zera investimesh te perfshira ne planin fillestar 2023-2027, por qe jane spostuar ne vite

Tregojne zera investimesh te perfshira ne planin fillestar 2023-2027, por jane bere zero si pasoje e perfshirjes ne zera te tjera investimesh


Tregojne ndryshime vlerash ne zera ekzistues te investimeve.

Perditesimi i planit te investimeve 5- vjecar, 2023-2027 sipas struktures se rrjetit te shperndarjes

Nr.	PLANI I INVESTIMEVE I PERDITESUAR 2023-2027	Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)	Pesha specifike % e edo zeri kundrejt totalit
1	Ndertim/rikonstrukcion elektrik per Nensacionet	60,000,000	545,000,000	1,907,000,000	2,913,000,000	3,575,000,000	2,220,000,000	11,220,000,000	33.0%
2	Ndertim/Rikonstrukcion linjash te TL	20,000,000	30,000,000	273,000,000	947,300,000	897,786,809	608,016,450	2,776,103,259	
3	Ndertim Rrjeti TM	-	113,490,503	920,274,290	814,000,000	884,778,615	728,000,000	3,460,543,408	52.4%
4	Ndertim/Rikonstrukcion Rrjeti TM /TU	30,000,000	1,507,704,405	4,908,049,114	3,558,533,375	2,012,280,843	2,684,251,026	14,700,818,762	
5	Ndertim/Rikonstrukcion kabinash elektrike	56,142,944	44,999,625	9,000,000	285,000,000	373,716,014	160,000,000	928,858,583	
6	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)	-	171,183,618	1,323,602,310	836,600,000	432,258,821	385,650,000	3,149,294,749	1.0%
7	Teknologji Monitorimi	-	-	10,500,000	30,000,000	-	385,000,000	425,500,000	
8	Investime ne matjes	-	115,934,400	443,768,000	480,465,852	-	-	1,040,168,252	4.9%
9	Investime ne sistemin e matjes	20,000,000	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298	-	1,056,704,894	
10	Blerje Paisje makineri	-	-	1,597,000,000	1,498,000,000	-	-	3,095,000,000	7.3%
11	Oponence,leje ndertimi ,shpronesime	-	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	1.3%
12	Emergjenca	-	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	
13	Mbikqyrje Punimesh per nevoja te OSSH sh.a	-	70,000,000	38,000,000	30,665,428	-	-	138,665,428	
14	Mbikqyrje supervizimi	-	-	110,000,000	100,000,000	-	-	210,000,000	
	TOTALI ME FONDET E OSSH	186,142,944	2,778,312,551	11,825,762,011	11,979,132,953	8,461,389,400	7,170,917,476	42,401,657,335	

Paraqitja grafike e Perditesimi i planit te investimeve 5- vjecar, 2023-2027 sipas struktures se rrjetit te shperndarjes ne miliona leke

Plani 5-vjecar i investimeve per vitet 2023-2027 te ndare sipas struktures se rrjetit te shperndarjes

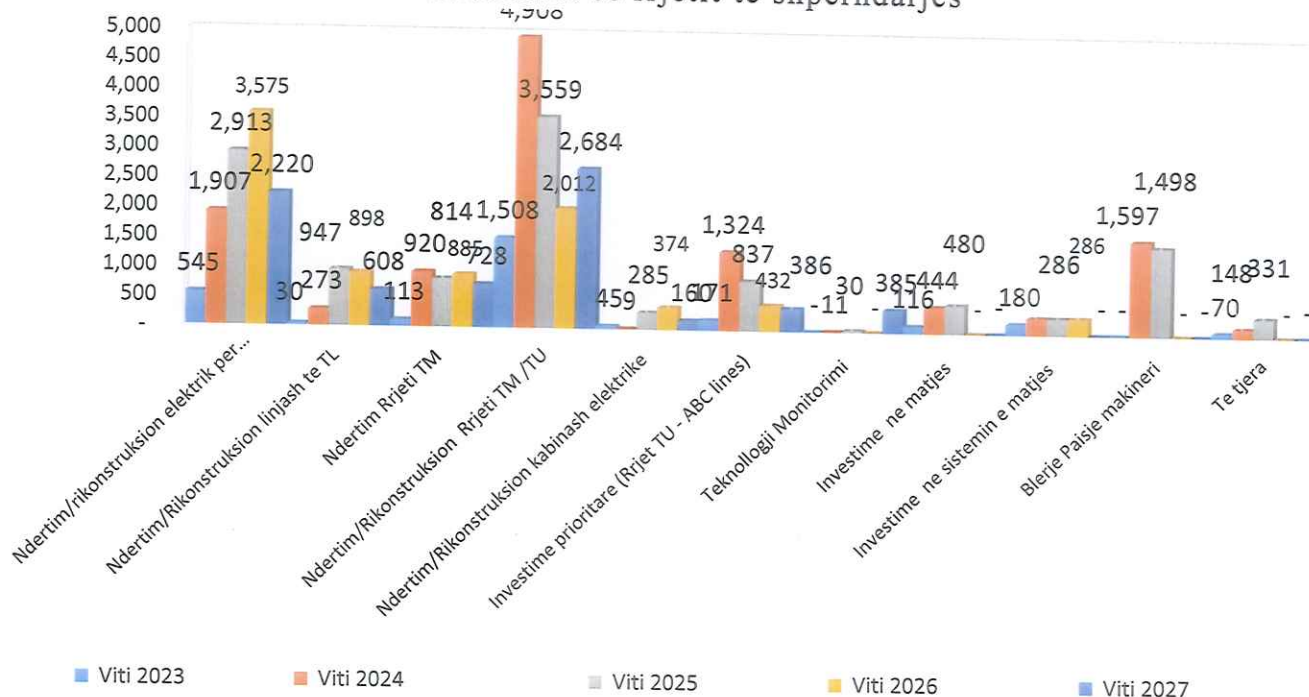

PESHA SPECIFIKE % E CDO ZERI KUNDREJT TOTALIT



Vlera e Investimeve me kapital te huaj

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti/Komuna / Zona OSHEE	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
1	SCADA (Zgjerimi i sistemit SCADA ne godinen Qendrore te OSHEE)	OSSH	124,114,256	131,713,088	131,713,088	45,592,992	22,796,496	455,929,920
2	Rikonstruksioni i Nienstacioneve 110kV ne rajonet (Tiran Durres dhe integrimi i tyre ne sistemin Scada	OSSH	338,698,478	359,435,119	359,435,119	124,419,849	62,209,924	1,244,198,489
3	Ndertimi i Nienstacionit Kamez(Valias) me fuqi 2x40MV (ONAN/ONAF) 110/20KVA dhe ndertimi i dy fiderave 20kV (V4, V5)	OSSH	368,169,506	390,710,497	390,710,497	135,245,941	67,622,971	1,352,459,412
4	Knsulenca	OSSH	53,452,625	55,643,485	55,643,485	28,410,339	1,582,230	194,732,164
I	TOTALI me fondet e KFW		884,434,865	937,502,189	937,502,189	333,669,121	154,211,621	3,247,319,985
II	Kosto Kredi per N/Stacionin QENDER(BEXXH)		344,400,000	688,800,000	516,600,000	172,200,000		1,721,999,999
III	Kosto Kredi Cooperacioni Italian(Himare)		519,991,834	259,995,917	259,995,917			1,039,983,668
TOTALI me Kapital te Huaj (I+II+III)			1,748,826,699	1,886,298,106	1,714,098,106	505,869,121	154,211,621	6,009,303,652
TOTALI ME FONDET E OSSH + TOTALI me Kapital te Huaj (I+II+III)			4,184,076,419	5,049,526,430	3,933,666,404	10,207,665,318	11,030,614,215	34,591,691,729

Ndryshimi ne vite i planit 5- vjecar te investimeve, 2023-2027

Nr.	Planifikimi ne vite i Investimeve	Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
1	Plani 2023-2027 (fillestari) derguar me shkresen NR.6713/1,date 26.07.2023	186,142,944	2,435,249,720	3,163,228,324	2,219,568,298	9,695,522,917	10,876,402,594	28,576,114,797
2	Plani I perditesuar per miratim 2023-2027 me ndryshimet e vitit 2023,2024,2025)	186,142,944	2,778,312,551	11,825,762,011	11,979,132,953	8,461,389,400	7,170,917,476	42,401,657,335

Plani i investimeve 5- vjecar, 2023-2027 i shprehur ne natyre per nienstacionet

VITET	Ndertim/Rikonstruksion N/Stacioni cope	Fuqia e shtuar MVA	Ndertim/Rikonstruksion linje TL km
Viti 2023-2025	11	484	106
Viti 2026-2027	10	300	
TOTALI	21	784	106

Ne Planin e Investimeve dhe Zhvillimit te Rrjetit per Sektorin e Shperndarjes se Energjise Elektrike ne Shqiperi me konsulent (VPC GmbH, Germany),thuhet se:

Elementet kryesore te investimit qe perfshijne ne plani i zhvillimit te rrjetit te shperndarjes se energjise elektrike 2020-2024 sipas skenarit te rritjes se larte per nenstacionet HV/TM,jane

- Investimet ne nenstacionet TL,perfshire ne planin 5- vjecar 2023-2027:
 - Nenstacioni i ri Zogu i Zi (Tirane), Akerni (midis Fierit dhe Vlores)
 - Rikonstruksion i nenstacioneve ekzistuese Pogradec 110/35/10kV (Korce), Pallati i Kongreseve (Tirane), Lozhan , Piqeras (Bunerc, Gjirokaster), Fushe Kruje (Durres), Shkodra 2 (Shkoder), Kucove (Berat), Grapsh (Gjirokaster)

Elementet kryesore te investimit qe perfshijne ne plani i zhvillimit te rrjetit te shperndarjes se energjise elektrike 2025-2029 sipas skenarit te rritjes se larte per nenstacionet HV/TM.


- Nenstacioni i ri Tamare (Veri Shkoder), Xare (Gjirokaster Ksamil, Morsi),

Plani I investimeve 5- vjecar, 2023-2025 i shprehur ne natyre per rrjetin TM/TU


Per vtin 2023 te ndare sipas rajoneve

Drejtoria Rajonale	Viti 2023							
	Linje TM 20kV kabllore km	Linje TM ajrore Rikonst km	Linje TM Ajrore km	Linje TU km	Kabina Reja BOX	Kabina Reja Shtyllore	Kabina Murature Rikonst.	Kab Shtyllore Rikons.
					cope	cope	cope	cope
Tirana	44.7		4.4	81.4	30	12	6	
Berat			1.45	41.7		14		9
Burrel		179	3.5	182		4		1
ELBASANI								
Fier	13.5			0.2	6	22		
Durres	13.5			0.2	6	22		
Gjirokaster	23.7			17.7	4	1		
Korce				7.7				
Kukes		27		18	5			9
Shkoder	28.2			24.29	42		24	
Vlore	26.5							
TOTAL	150	206	9.35	373.19	93	75	30	19

Viti 2023


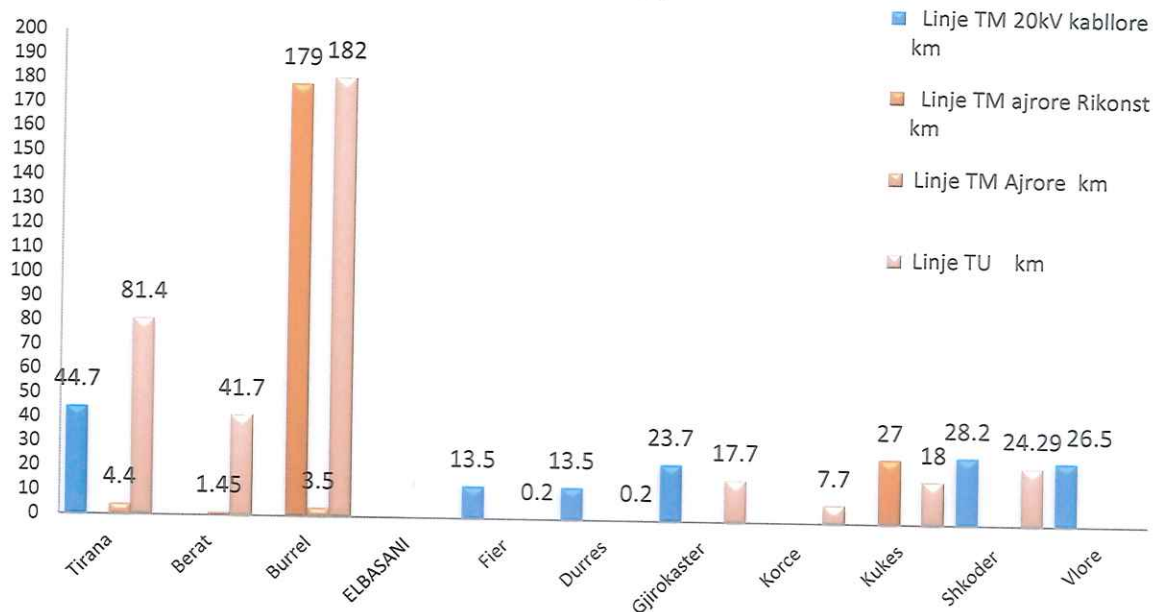


Viti 2023

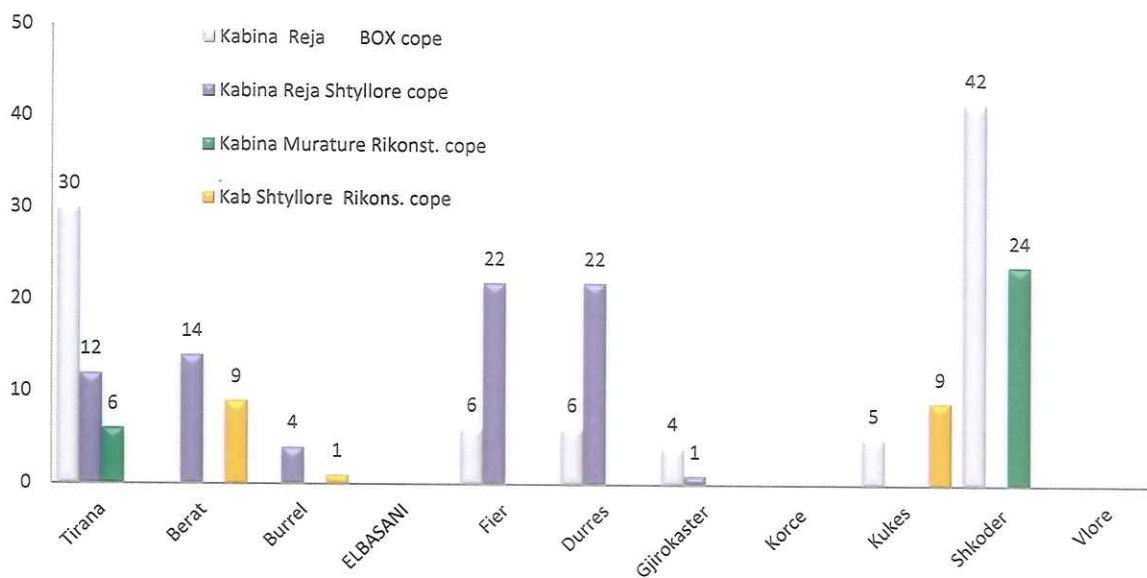



Per vitin 2024 te ndare sipas rajoneve

Viti 2024	Linje TM 20kV kablllore km	Linje TM ajrore Rikonst km	Linje TM Ajrore km	Linje TU km	Kabina Reja BOX	Kabina Reja Shtyllore	Kabina Murature Rikonst.	Kab Shtyllore Rikons.
Tirana	92		11	59.45	30	11	6	
Berat	4		10.2	156.7	1	20	29	87
Burrel				98				3
Fier	13		12	44.1	14	11		
Elbasani	0.5	108	6.5	98.95	1	21	1	18
Durres	13		12	44.1	14	11		
Gjirokastr	29			184.01	8			30
Korce			5.5	165.22		3	3	20
Kukes			2	62		5	9	2
Shkoder	29.7			41.89	37	3	3	3
Vlore	40.2		3	44.8	32		52	
Totali	221.4	108	62.2	999.22	137	85	103	163

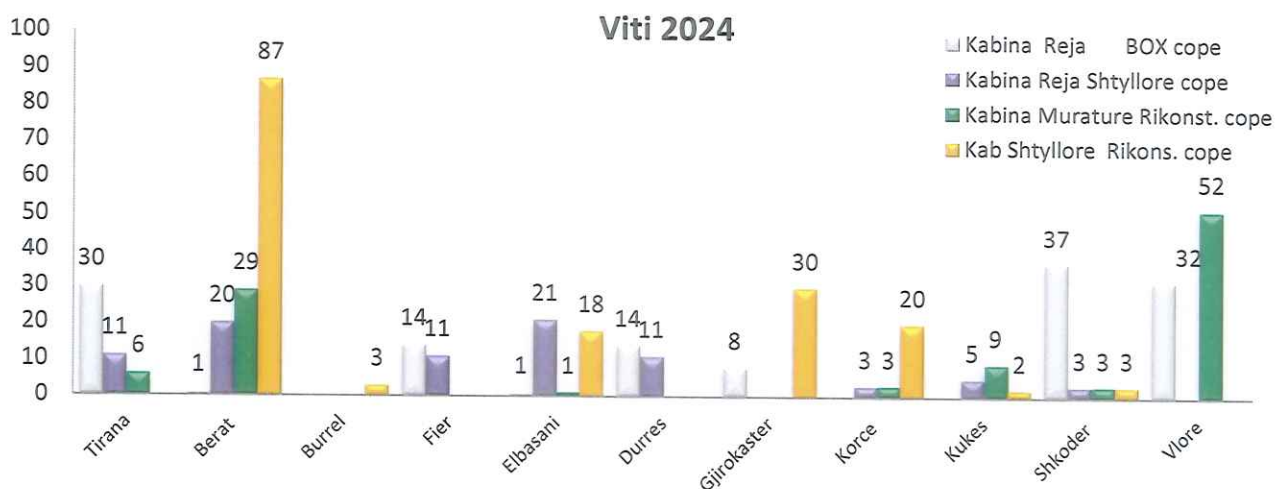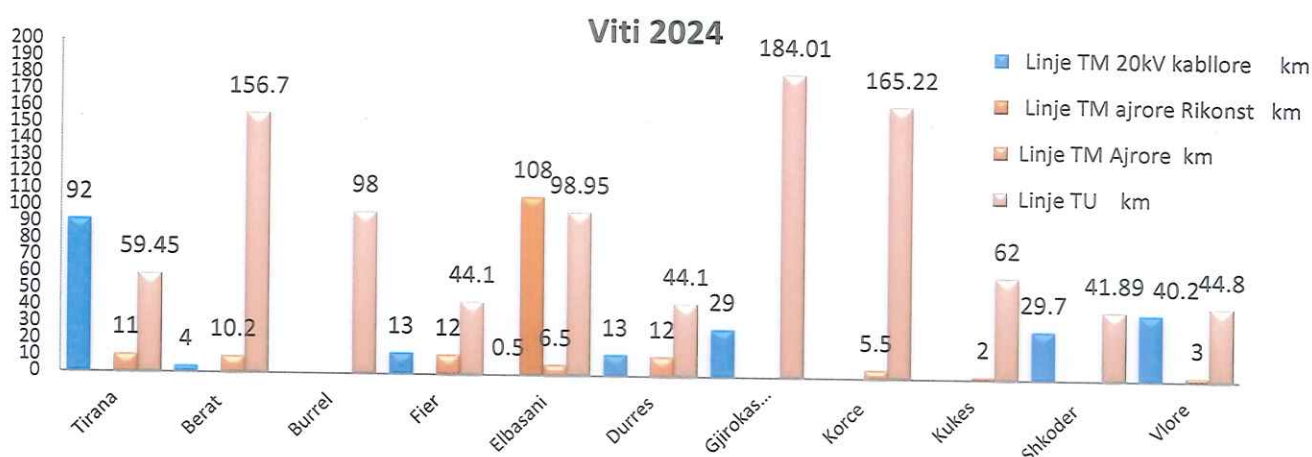

Per vitin 2025 te ndare sipas rajoneve

Viti 2025	Linje TM 20kV kablllore km	Linje TM ajrore Rikonst km	Linje TM Ajrore km	Linje TU km	Kabina Reja BOX	Kabina Reja Shtyllore	Kabina Murature Rikonst.	Kab Shtyllore Rikons.
Tirane	21.7			53.5	12		141	
Berat			35.6	239		12	26	68
Burrel	2		3	110				
Fier	7.81		1.99	48	5	6	9	2
Elbasani				114.5		2		4
Durres	7.81		1.99	48	5	6	9	2
Gjirokaster	3.7			37	8		1	
Korce	20.7		0	28.63	14	0	21	0
Kukes			4.6	55.2		1	4	3
Shkoder	24.39		0.7	8.8	20		1	
Vlore	6.5		0	57	11	0	10	0
TOTALI	94.61	0	47.88	799.63	75	27	222	79

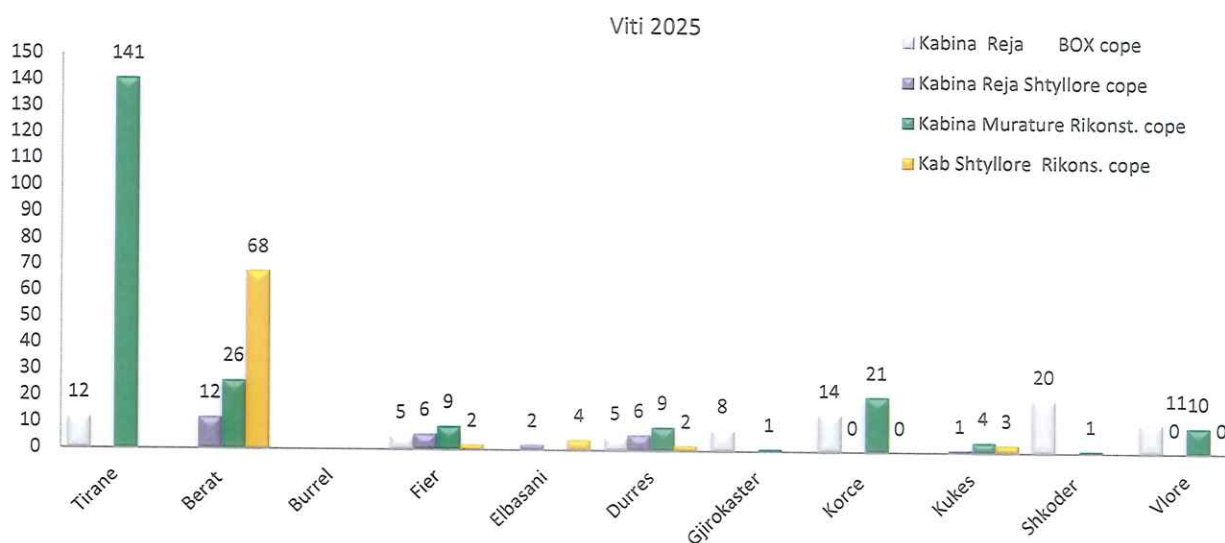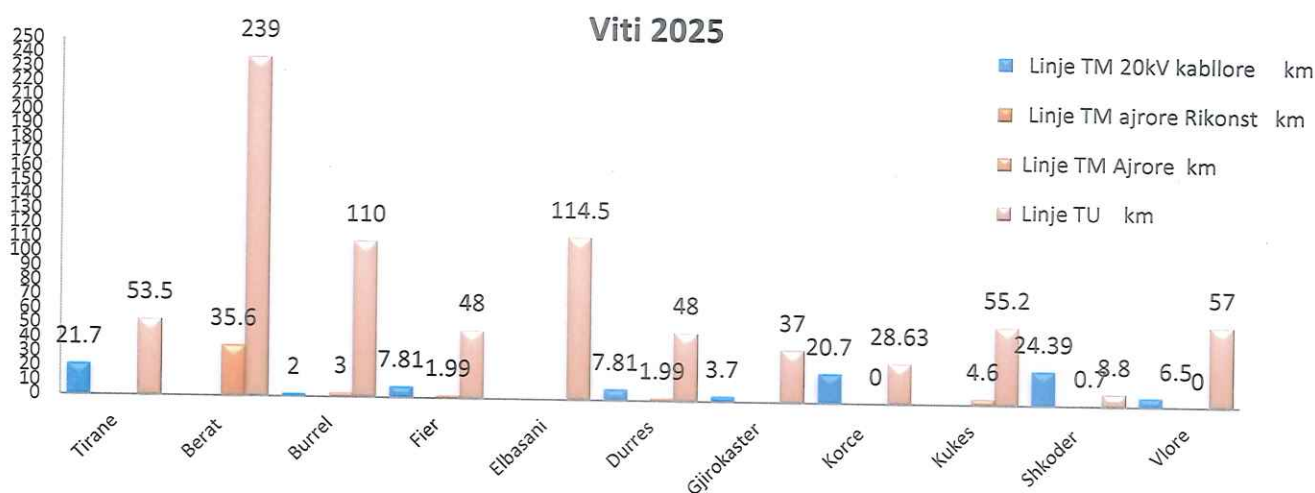


Total per vitet 2023-2025

VITET	Linje TM 20kV kablllore km	Linje TM ajrore Rikonst km	Linje TM Ajrore km	Linje TU km	Kabina Reja BOX cope	Kabina Reja Shtyllore cope	Kabina Murature Rikonst.cope	Kab Shtyllore Rikons.cope
Viti 2023	150.1	206	9.35	373.19	93	75	30	19
Viti 2024	221.4	108	62.2	999.22	137	85	103	163
Viti 2025	94.61	0	47.88	799.63	75	27	222	79
TOTALI	466.11	314	119.43	2172.04	305	187	355	261

Natyrat total per vitet 2023,2024,2025



Natyrat total per vitet 2023,2024,2025

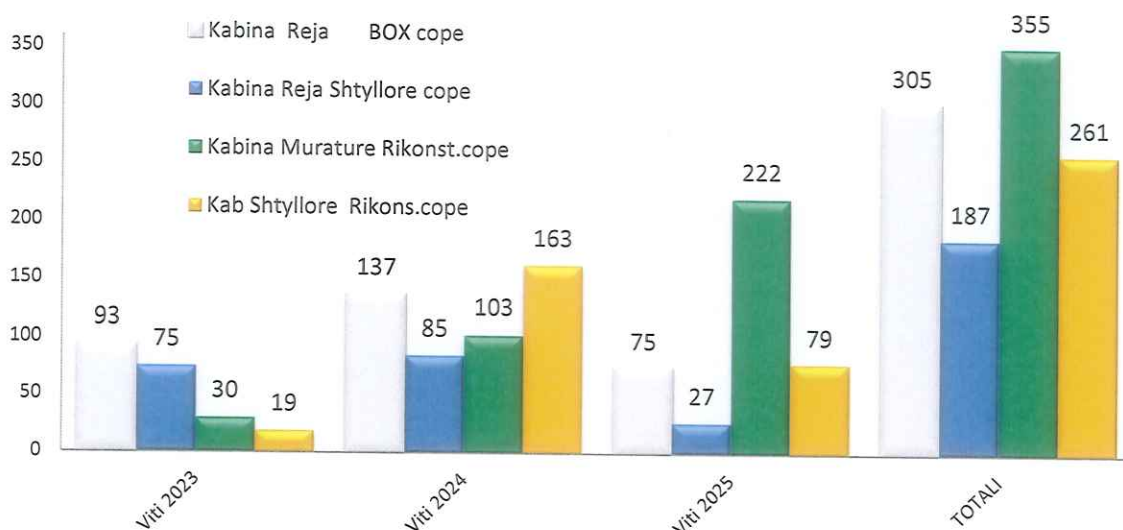


Plani i investimeve 2023-2027 dhe impakti i tyre

Vleresimi i ndikimit te investimeve ne rrjetin e shperndarjes ne reduktimin e humbjeve


Vleresimi i ndikimit te investimeve ne rrjetin e Tensionit te Larte ne uljen e Humbjeve

Shperndarja e investimeve (si % ndaj Totalit) ne nivel Njesie te Tensionit te Larte eshte paraqitur me poshte:

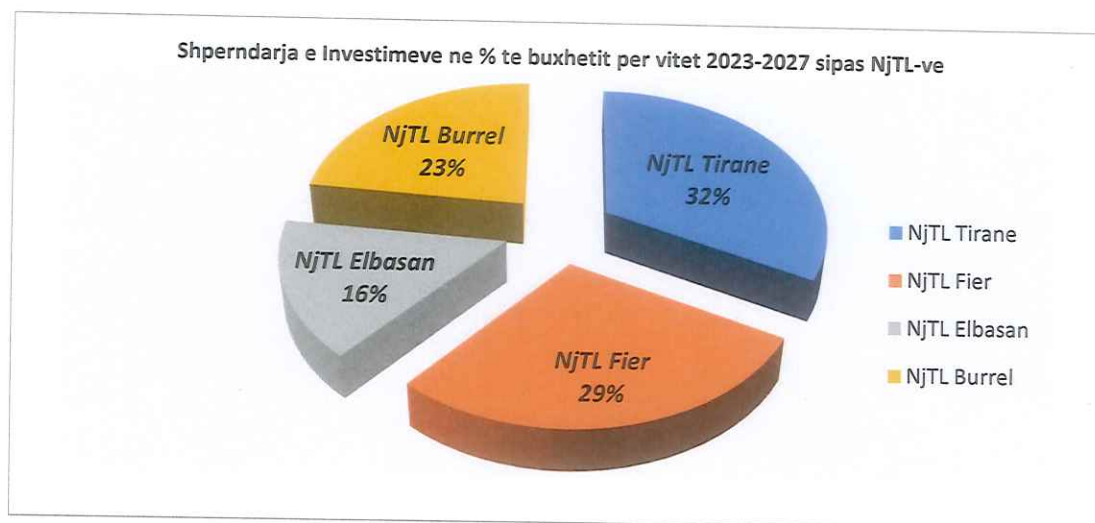

Vleresimi i perafuar e ndikimit te investimeve ne reduktimin e Humbjeve ne rrjetin e Tensionit te Larte eshte kryer kundrejt te dhenave te Bilancit Energjistik te vitit 2022 ne nivel Njesie Tensioni te Larte.

Tabela Permbledhese e Impaktit ne Humbje per NjTL, te Planit te Investimeve v.2023-2027 referuar humbjeve per vitin. 2022								
NjTL	Blerje Energjie (OST+HEC-e 35kV) (kWh)	Konsumi Energjise (Fidera+NV+K-35kV) (kWh)	Humbjet v. 2022 (kWh)	Humbjet v.2022 (%)	Perfitimi ne Humbje vs. 2022 (kWh)	Diferenca ne humbje (kWh)	Humbjet Pas ref. 2022 (%)	Permiresimi i Humbjeve ne %
Tirane	3,505,569,703	3,477,635,498	27,934,205	0.8%	4,490,140	23,444,064	0.7%	0.1%
Fier	1,307,401,883	1,288,570,529	18,831,354	1.4%	1,565,657	17,265,698	1.3%	0.1%
Elbasan	1,177,639,051	1,150,270,031	27,369,020	2.3%	3,191,688	24,177,332	2.1%	0.3%
Burrel	1,408,372,066	1,389,175,997	19,196,068	1.4%	3,971,573	15,224,495	1.1%	0.3%
TOTAL TL	7,398,982,702	7,305,652,054	93,330,648	1.3%	13,219,058	80,111,590	1.1%	0.2%

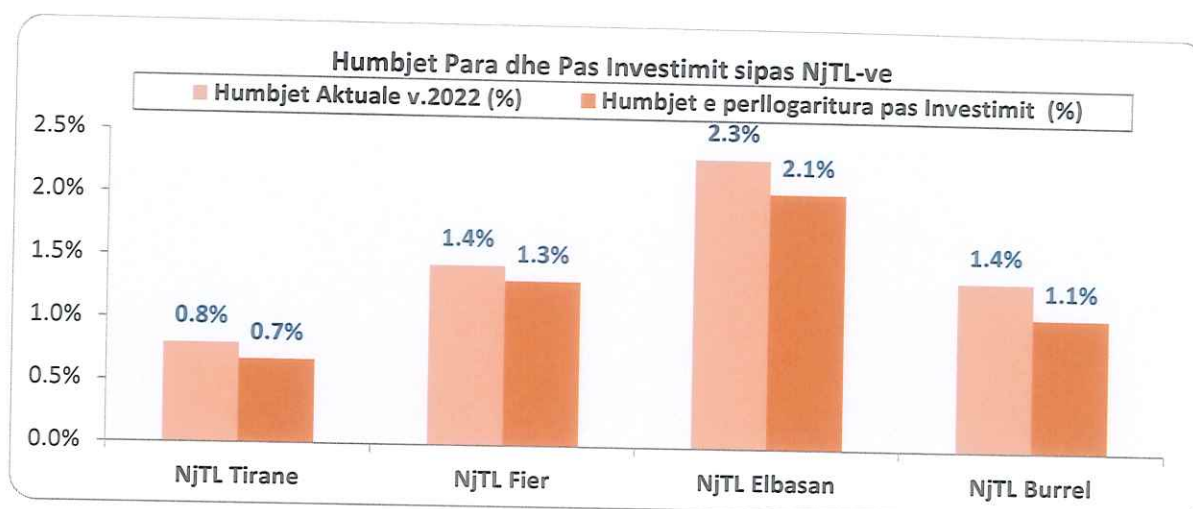


Vleresimi i ndikimit total te investimeve ne rrjetin e Tensionit te Mesem & te Ulet

Per investimet ne rrjetin e tensionit te mesem dhe te ulet, vleresimi i perafuar e ndikimit te investimeve eshte kryer kundrejt te dhenave te Bilancit Energjistik te vitit 2022 ne nivel Rajoni Shperndarje.


Tabela Përmbledhese e Impaktit ne Humbje sipas RSH-ve te Investimeve v.2023 -2027 referuar humbjeve per v.2022

Rajonet Shperndarese	Energji Totale ne rrjetin e OSSH (kWh)	Energji Totale e perdorur ne OSSH (kWh)	Humbje Viti 2022 (kWh)	Humbjet 2022 (%)	Humbjet e Perftuara (kWh)	Diferenca ne humbje (kWh)	Humbjet Pas ref.2022 (%)	Permiresimi i Humbjeve ne %
Tirane	2,513,982,888	2,190,315,030	323,667,858	12.87%	57,788,253	265,879,605	10.6%	2.30%
Durres	962,399,061	779,063,684	183,335,377	19.05%	26,091,932	157,243,446	16.3%	2.71%
Fier	459,322,344	396,983,821	62,338,523	13.57%	10,092,918	52,245,605	11.4%	2.20%
Elbasan	490,433,413	421,252,703	69,180,710	14.11%	10,598,678	58,582,033	11.9%	2.16%
Korce	381,517,130	322,805,020	58,712,110	15.39%	16,501,316	42,210,794	11.1%	4.33%
Gjirokaster	302,383,108	244,915,716	57,467,391	19.00%	23,911,021	33,556,370	11.1%	7.91%
Shkoder	706,801,915	462,955,675	243,846,240	34.50%	33,418,468	210,427,771	29.8%	4.73%
Berat	439,001,987	369,817,455	69,184,532	15.76%	12,195,967	56,988,565	13.0%	2.78%
Kukes	208,935,099	113,949,815	94,985,284	45.46%	18,920,637	76,064,647	36.4%	9.06%
Burrel	472,486,497	342,181,913	130,304,583	27.58%	21,001,554	109,303,030	23.1%	4.44%
Vlore	364,034,346	292,547,716	71,486,630	19.64%	12,114,571	59,372,059	16.3%	3.33%
Total TM&TU	7,301,297,788	5,936,788,549	1,364,509,239	18.69%	242,635,315	1,121,873,925	15.4%	3.32%

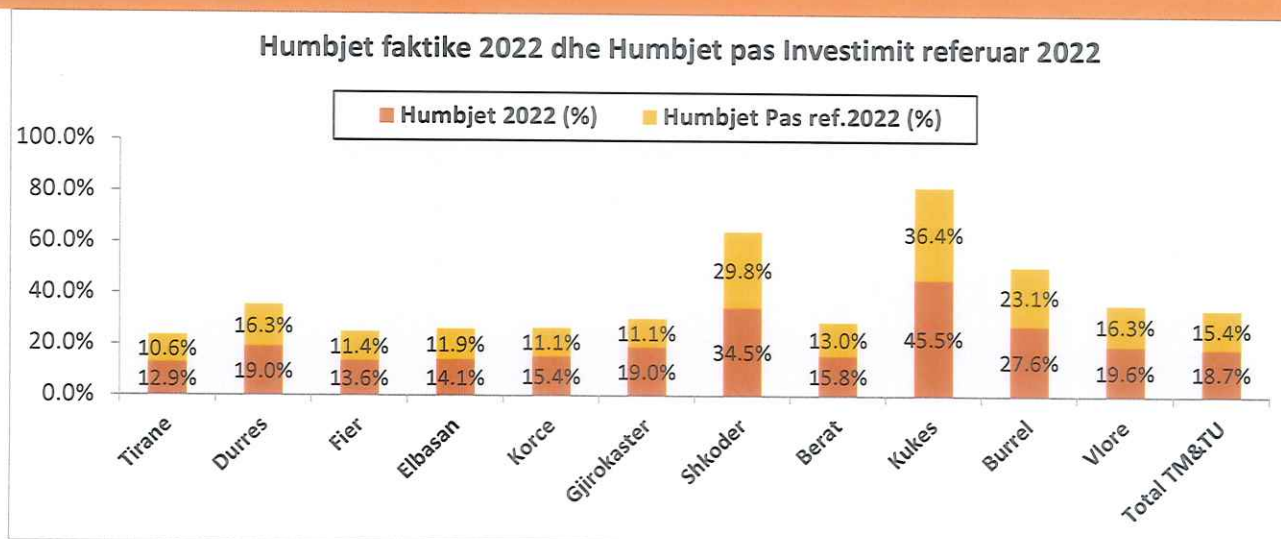

Treguesit e Bilancit Energjitik per vitin 2022			
1	Energji Totale ne rrjetin e OSSH	7,400,399	MWh
2	Energji Totale e perdorur ne OSSH	5,941,143	MWh
3	Humbje	1,459,257	MWh
4	Humbje %	19.72%	%

Vleresimi i Reduktimit te Humbjeve nga investimet qe pritet te japin ndikim pergjate viteve 2023-2027			
1	Humbjet e reduktuara	255,854	MWh
2	Kontributi ne uljen e humbjeve % (referuar v.2022)	3.5%	%

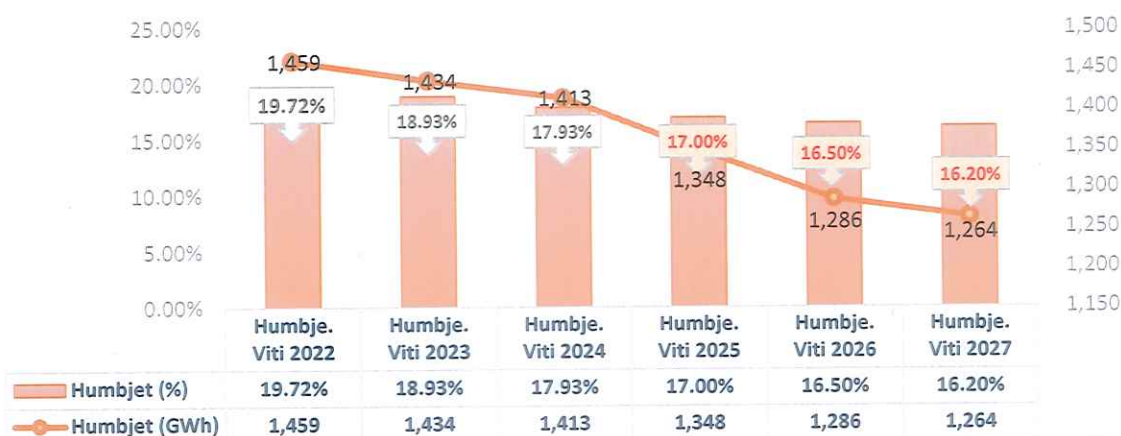

Vleresimi i ndikimit te investimeve te planifikuara per vitet 2023 - 2027, ne impaktin ne reduktimin e humbjeve ne rrjetin e shperndarjes, eshte 255,854 MWh

Analiza e perfitimit te koston per projektet e planifikuara, ju informojme se aktualisht shoqeria OSSH sh.a. po mundeson perditesimin e plote dhe te avancuar te programit PowerFactory, duke mundesuar akses ne te gjitha funksionalitetet te nevojshme per strukturat e OSSH-se. Nje aspekt kyç eshte integrimi i PowerFactory me sistemin GIS, e cila do te mundesoje nje analize te sakte dhe te detajuar te rrjetit ekzistues.

Perditesimi synon Vleresimin e Koston

- Analize krahasuese para/pas perditesimit
- Vleresim i ndikimit ne KPI-te e rrjetit (SAIDI, SAIFI, humbjet teknike)
- Justifikim ekonomik i investimit permes analizes se raportit kosto/perfitim

Impakti I Investimeve te planifikuara 2023-2027 ne treguesit e cilesise SAIDI/SAIFI

Impakti I investimeve 2023-2027 ne treguesit e vazhdueshmerise se furnizimit te rrjetit shperndares.

Duke marre ne konsiderate plani i investimeve 2023-2027 sipas rajoneve qe priten te realizohen gjate nga viti 2023 deri ne vitin 2027, eshte realizuar impakti i tyre ne treguesit e Performances se Rrjetit SAIDI/SAIFI.

Duke analizuar te gjithë zerat e ketij Plani Investimesh ne baze Rajoni dhe sipas Nivelit te Tensionit, per Investime ne Rrjetin TL me nderhyrje ne Linja dhe rikonstruksione Nst, Investime ne Rrjetin TM me rikonstruksione dhe ndertim rrjeti te ri 20 kV dhe ABC, Investime ne rrjetin TU dhe ne kabinat elektrike, kemi evidentuar sesa jane treguest SAIDI/ SAIFI per secilin ze investimi dhe sa do te jete permiresimi i tyre i pritshem ne perfundim te ketyre investimeve. Gjithashtu duke evidentuar dhe impaktin e tyre ne performancen e secilit Rajon dhe sipas niveleve te tension dhe ne performancen e total rrjetit shperndares te OSSH-se.

Ne tabelen e meposhteme kemi paraqitur Treguesit e realizuar te Performances se Rrjetit per vitin 2022 dhe sa do te jene Treguesit SAIDI/SAIFI e pritshem pas Investimeve, duke marre ne konsiderate realizimin e cdo zeri te investimeve, e ndare kjo sipas Drejtorive Rajonale dhe Nivelit te Tensionit.

Zeri Investimit/ Rajoni	Para Investimeve		Pas Investimeve 2023-2027	
	SAIFI realizim 2022	SAIDI realizim 2022	SAIFI pritshe pas investimeve	SAIDI pritshe pas investimeve
Ndertim/rikonstrukcion elektrik per Nensacionet	7.0	11.5	6.2	10.1
Ndertim/Rikonstrukcion linjash te TL	8.0	18.3	7.7	17.6
Ndertim Rrjeti TM	22.1	41.0	21.4	39.6
Ndertim/Rikonstrukcion Rrjeti TM /TU	24.20	43.20	19.61	35.26
Ndertim/Rikonstrukcion kabinash elektrike	3.27	4.06	2.93	3.51
Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)	2.1	2.3	1.9	2.1
Tirana	21.3	28.2	15.5	19.0
Shkoder	41.7	90.0	36.0	77.6
Burrel	50.9	103.2	45.2	78.8
Kukes	61.1	122.2	51.2	99.0
Elbasan	38.1	65.5	27.5	46.4
Korce	28.7	71.6	22.9	62.0
Berat	44.3	63.9	34.0	49.4

Gjirokaster	51.6	82.3	31.8	55.8
Vlore	19.6	38.5	18.2	35.3
Durres	13.53	27.50	13.15	26.79
Fier	30.2	49.1	21.3	35.1
Total OSSH	31.16	54.68	24.45	43.07

Per kalkulimin e treguesve te pritshem sipas rajoneve eshte realizuar duke perlogaitur treguesit e cilesise sipas secilit ze te investimit, se sa kane qene treguesit para investimit dhe duke marre nje koeficient permerisimi ne baze te nderhyrjes qe do te realizohet, sa do te jene Treguesit e Pritshem SAIDI/ SAIFI ne vitin 2027 mbas realizim 100 % te ketyre zerave.


Gjithashtu kemi evidentuar dhe peshen specifike qe keto investime zene ne secilin rajon dhe me pas sa do te jete impakti qe ato do te japin ne permiresimin e Treguesve per total rrjetin shperndares te OSSH-se, duke marre parasysh ecurine e realizimit te treguesve nga viti 2023 deri ne vitin 2027..

Me poshte kemi paraqitur ne menyre grafike sesa do te jene Treguesit e Pritshem mbas Investime ne krahasim me treguesit e realizuar para investimit. Perkatesisht per ecurine e SAID –it dhe SAIF-it. Ku :


SAIFI – eshte koeficienti i nderprerjeve mesatare per klient

SAIDI - eshte koeficienti i kohezgjatjes mesatare te nderprerjes per klient (ore)

Pritshmeri e tregusit SAIF sipas Drejtorive Rajonale
pas realizimit te Investimeve 2023-2027

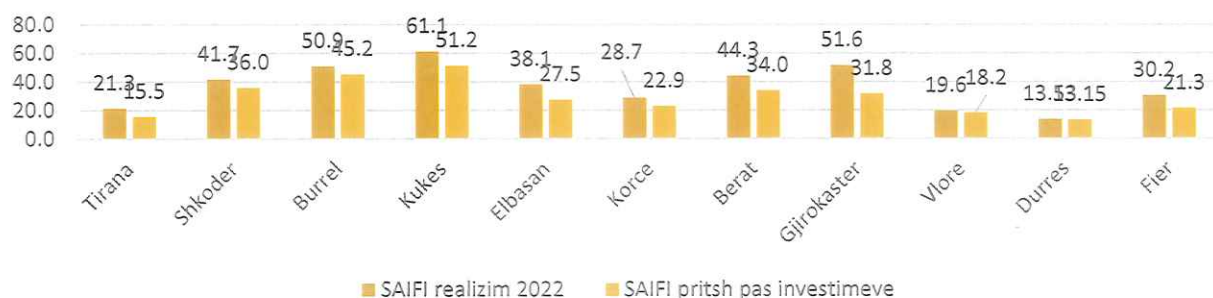

Pritshmeri e tregusit SAID sipas Drejtorive Rajonale
pas realizimit te Investimeve 2023-2027

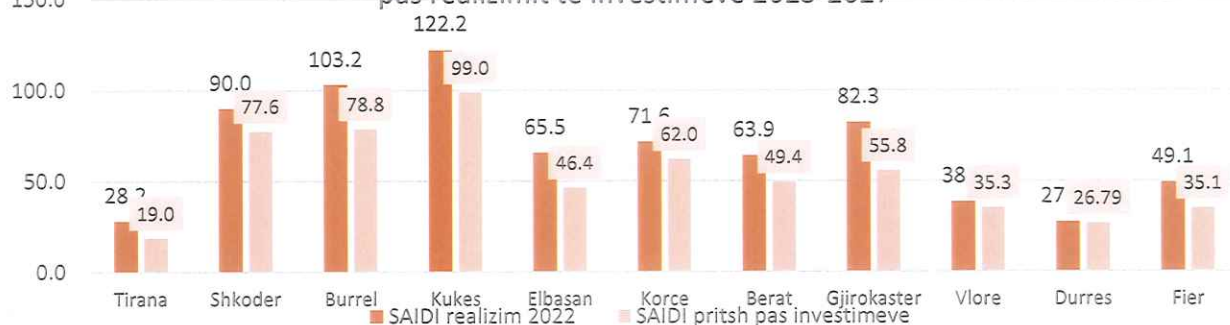

Ne baze te ketyre perlllogaritjeve kemi evidentuar dhe Pritshmerine e Treguesit SAID/ SAIF per Total Rrjetin Shperndares OSSH-se sipas tabelës se meposhteme.

	Para Investimeve		Pas Investimeve 2023-2027	
	SAIFI realizuar 2022	SAIDI realizuar 2022	SAIFI pritsh pas investimeve	SAIDI pritsh pas investimeve
Total OSSH	31.16	54.68	24.45	43.07

Parashikimi per Pritshmerine e Treguesve te Cilesise se Furnizimit me realizimin e investimeve per Vitin 2023-2027



Duke marre ne konsiderate te gjithë ecurine e rrjetit sipas dinamikave te tij, si nga numri I stakimeve dhe treguesit e realizuar gjate viteve te fundit, ku ndikim te madh kane edhe kushtet atmosferike (vecanerisht tek pjesa arore e tij), dhe nga perlllogaritjet e zerave te investimeve dalim ne konkluzionet qe Treguesit e Pritshem te performances per vitin 2023-2027 do te kene nje permiresim diku tek 21.5 % ne total rrjetin ne SAIF dhe 21.2 % per treguesin SAID, llogaritur kjo mbi realizim e treguesve te arritur gjate vitit 2022. Impakti I ketij permiresimi eshte perlllogaritur mbi vlerat e pritshme qe do te kemi deri ne perfundim te investimeve pra ne vitin 2027, pasi vete keto investime pritet te relizohen ndermjet periudhes 2023-2027. Gjithashtu ne tabelen e meposhteme kemi paraqitur se sa do te jete permiresimi I ketyre treguesve ne % per secilin rajon dhe per total rrjetin e OSSH-se.

Emertimi	Permiresimi ne % I SAIF-It	Permiresimi ne % I SAID- it
Tirana	27.3%	32.6%
Shkoder	13.7%	13.8%
Burrel	11.1%	23.6%
Kukes	16.2%	19.0%
Elbasan	27.9%	29.2%
Korce	20.0%	13.3%
Berat	23.3%	22.7%
Gjirokaster	38.4%	32.2%
Vlore	7.2%	8.3%
Durres	2.8%	2.6%
Fier	29.5%	28.5%
Total OSSH 2023-2027	21.5%	21.2%

PERFUNDIMET

- A. Gjendja e keqe teknike e rrjetit te shperndarjes kryesisht ajror 35/10/6kV dhe perqindja e vogel e sistemit te kabllimit jashte qyteteve te medha jane faktore qe shkaktojne numer te madh defektesh dhe nderprerje te gjata ne kohe per furnizimin e klientit. Me gjithë investimet e deri tanishme niveli i llogaritur I rrjetit ajror vazhdon te jete ende I larte .
- B. Ne perkeqesimin e ketyre tregusve dhe ne rritjen e numrit te difekteve nje ndikim mjaft te larte kane edhe kushtet atmosferike, vecanerisht ne rrjetin TM/ TU dhe ate ajror 35/10/6 kV
- C. Strategjia e prezantuar per modernizimin e rrjetit shperndares te OSSH-se eshte nje mase efektive per te permiresuar cilesine e furnizimit. Duke futur ne zerat e investimeve, kalimet e rrjetit 6 dhe 10 kV ne 20 kV si dhe kalimin e rrjetit ajror ne rrjet me kabell ABC.

OSSH ne vazhdimesi ka mare masa per saktesimin e regjistrimit te gjithë llojeve te nderprerjeve dhe perlllogaritjen sa me te sakte te treguesve SAIFI / SAIDI per total rrjetin ne baze niveli tensioni 35/20/10/6/0.4 kV, si dhe sipas zonave Urbane/ Rurale, ku:

- Se pari eshte nje tregues i sherbimit me cilesi te furnizimit me energji te abonenteve
- Se dyti, mundeson kontrollin e masave te modernizimit te rrjetit.


Gjithashtu me vendosjen ne eficence te plote te zerave te investimeve sipas niveleve te tensionit, pritët qe te kemi nje permiresim te konsiderueshem te treguesve te performances SAIFI dhe SAIDI, perkatesisht ne nje vlere prej 21 % me mire.

Ne tabelen e meposhteme kemi te paraqitr sa do te jete permiresimi I treguesve sipas kategorive te investimeve sipas nievit te tensionit.

Emertimi	Permiresimi ne % I SAIF-It	Permiresimi ne % I SAID- it
Rrjeti TL- N/st	12%	12%
Rikonstrukcion Linjash TL	5%	4%
Ndertim Rrjeti TM	3%	3%
Rikonstrukcion Rrjeti TM /TU	19%	18%
Ndertim/Rikonstrukcion kabinash elektrike	10%	14%
Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)	8%	8%
Total OSSH 2023-2027	21.5%	21.2%

Ku sic shifet edhe peshen me te madhe te investimeve e zene nderhyrjen ne rrjetin TM-TU me 19% permiresim ne SAIF dhe 18 % ne SAID.

Me poshte eshte I paraqitur impakti investimeve edhe ne forme grafike, per te gjitha investimet e ndare sipas zerave e shprehur kjo ne %.

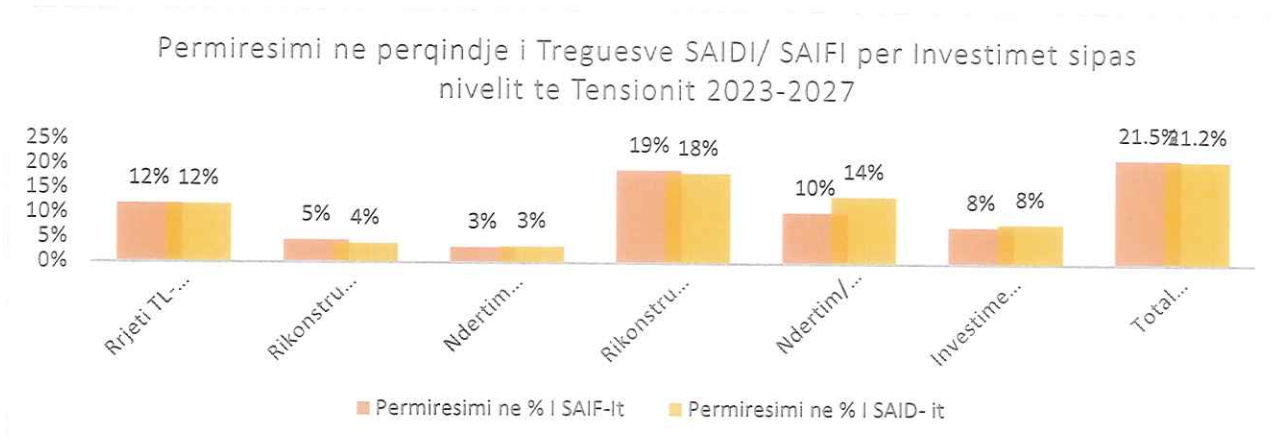

Realizimi I Planit te investimeve

Realizimi I investimeve te planit per vitin 2023

Nr.	Lista e Investimeve	Plani i investimeve per vitin 2023		Vlera e Investimit (Kontrata)	Realizimi i investimeve	
		Viti 2023 (lek)	TOTALI (lek)		Vlerat Realizimit te investimeve te kontraktuara (lek)	Perqindja e Realizimit te investimit ne terren (%)
I	Ndertim/rikonstrukcion elektrik per Nenstacionet	545,000,000	3,265,000,000	3,195,048,981	2,817,965,839	
1	Fuqizimi i N.Stacionit 110/20kV Golem - Durres	135,000,000	205,000,000	203,216,760	203,216,760	100%
2	Ndertimi i nestacioni te ri Velipoje 110/35/20kV	140,000,000	450,000,000	438,746,693	403,646,957	92%
3	Fuqizimi i N.Stacionit 110/20kV Zogu Zi (2x40)MVA	50,000,000	650,000,000	627,480,499	621,205,694	99%
4	Ndertim N/Stacionit te ri Fier 2 110/20kV	50,000,000	600,000,000	593,981,950	356,389,170	60%
5	Rikonstrukcion dhe fuqizimi i N.Stacionit Kuçove 110/35/20/10/6kV	50,000,000	650,000,000	630,484,449	535,911,782	85%

6	Rikonstruksion I N.Stacionit Pogradeç 110/35/10kV ne 110/35/10/20kV	50,000,000	350,000,000	346,823,233	346,823,233	100%
7	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Corovode e Re 110/35/10kV	30,000,000	150,000,000	148,419,628	146,935,432	99%
8	Rikonstruksion I N.Stacionit Lezhe nga 110/10kV ne 110/20/10kV	40,000,000	210,000,000	205,895,769	203,836,811	99%
II	Ndertim/Rikonstruksion linjash te TL	30,000,000	50,000,000	49,103,710	49,103,710	
1	Rikonstruksioni I nyjave kritike ne linjat 35 kV	30,000,000	50,000,000	49,103,710	49,103,710	100%
III	Ndertim Rrjeti TM	113,490,503	113,490,503	108,813,956	108,813,956	
1	Zevendesimi me 20 kV te fiderave Mezes 107 etj. me furnizim nga fideri 32 Kashar	61,798,937	61,798,937	59,601,736	59,601,736	100%
2	Kalimi I fiderit 118 N/Stacioni Kinostudio 36/9 kV , ne rrjetin e ri TM 20 kV.	51,691,566	51,691,566	49,212,220	49,212,220	100%
IV	Ndertim/Rikonstruksion Rrjeti TM /TU	1,524,934,964	2,697,853,745	2,408,426,625	2,478,361,671	
1	Faza e dyte e zgjerimit dhe rikonstruksionit te Fiderit E 10 ne zonen e Berzhites se bashku me rrjetin Tu me percjellec ABC	40,000,000	160,000,000	142,390,470	142,390,470	100%
2	Fider I ri 20 kV E 13 i N/Stacionit Farke 110/20/10 kV	48,800,160	48,800,160	48,533,786	48,533,786	100%
3	Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rinj Vore	42,310,269	92,310,269	89,999,998	89,999,998	100%
4	Ndertimi i 12 kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne Fiderin F4 TE N/Stacionit T 35/6 KV NDROQ si dhe linjave TU me kabell ABC i 18 kabinave	96,676,817	96,676,817	92,911,277	92,911,277	100%
5	Ndertimi I kabinave dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R3 I N/Stacionit Vore dhenga fiderat F8 dhe F32 te N/Stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6 kv te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore.	50,000,000	126,660,026	123,456,516	123,456,516	100%
6	Kalimi nga 6kV ne 20kV i kabinave te fiderit 23 te N/Stacionit Selite	17,230,559	17,230,559	-	-	
7	Ndertimi I kabines PSh 16/1 si dhe linjat e rrjetit TU me kabell ABC, me furnizim nga fideri F8, N/St Kashar	13,533,267	13,533,267	-	-	
8	Furnizim me TM 20kV I kabines se re murature "Bota e Luleve", fideri F.29, N/St Kashar 110/20kV	3,708,518	3,708,518	-	-	
9	Zevendesimi i daljeve te para kabllore te fiderave 6 kV, N/St Vore (me punonjesit tane)	2,673,812	2,673,812	2,673,812	-	0%
10	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore ne kabllore I kabina elektrike Pasho Hysi, Anxhelo Kaza, Iris Dollaku 2 A.I.Dollaku 1, si dhe rrjeti TU I kabines K2, Paho Hysi ne NST Traktora	51,212,956	51,212,956	41,932,572	41,932,572	100%
11	Furnizimi me TM/TU 20kV i kabines se re "Box Instituti Qender", Fideri A8, N/St Rajonal, qe do te sherbeje per ndarje ngarkesash (me punonjesit tane)	4,370,639	4,370,639	4,370,639	4,370,639	100%

12	Eliminimi I Fiderit 82, 6kV dhe furnizimi TM/TU 20/0.4kV I kabinese se re "Shkoze 2 Box" (me punonjesit tane)	5,574,471	5,574,471	5,574,471	-	0%
13	Spostimi dhe sistemimi I kabines K1, fideri E-6,N/St Farke (me punonjesit tane)	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	100%
14	Lidhja unazore mes fiderit E3 dhe E10, N/St farke 110/20/10kV, Tirane (me punonjesit tane)	3,500,000	3,500,000		-	
15	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen ne aksin e ri rrugor Kashar - Tapize loti I	35,073,289	35,073,289	50,192,154	50,192,154	100%
16	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen ne aksin e ri rrugor Thumane – Kashar loti II .	23,301,107	23,301,107			
17	Zgjatimin I Fiderit 8 me kabina dhe rrjet te ri TU n/Stacioni Fushe Kruje 110/20kV(drejtim Bubqit)	21,158,859	141,158,859	135,536,930	135,536,930	100%
18	Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 32/6 kV N/ST KOMBINAT ,35/6KV dhe Fiderave A4U /20kV N/ST UZNOV dhe A1B/20KV N/ST BURDULLIAS	63,145,195	93,145,195	90,161,845	90,161,845	100%
19	Fideri I Tomorrices TM/TU rikonstruksion	53,000,000	93,000,000	90,367,675	90,367,675	100%
20	Ndertim I linje TM dhe kabines "Vodica e Re" (me punonjesit tane)	1,918,077	1,918,077	1,918,077	1,918,077	100%
21	Kthimi nga murature ne shtyllore I kabines "Malind" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC (me punonjesit tane)	1,559,746	1,559,746		-	
22	Ndertim I kabines se re "Banaj 4" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC	4,012,897	4,012,897	8,402,109	8,402,109	100%
23	Ndertim I kabines se re "Banaj 5" dhe rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC	4,656,526	4,656,526		-	
24	Ndertimi I linjes TM dhe kabines se re Prokuce Fideri Mbrakull N/ST Polican 35/6KV	717,793	717,793		-	
25	Kthimi nga murature ne shtyllore I kabines Pompa e ujit Vlashuk Fid.Nr7/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV	354,869	354,869		-	
26	Ndertim rrjet TM, 20kV, dhe kabina elektrike, fideri F8, F9,F10, N/St Gjirokaster. (Zona Kardhiq)	40,000,000	80,000,000	73,777,708	73,777,708	100%
27	Ndertimi I linjes kabllore 20kV per furnizimin e tunelit Skarfices	40,000,000	130,000,000	123,285,068	123,285,068	100%
28	Ndertim kabine e re shtyllore "Koshovice 3", Tr-160kVA, Linje TM/TU, Fideri Dropull I Siperm, N/St 35/10 kV Grapsh (me punonjesit tane)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%
29	Rikonstruksion kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Kardhiq dhe Lunxheri, Nst Gjirokaster 110/35/6 kv	45,000,000	45,000,000	41,072,294	41,072,294	100%

30	Zgjatim i fiderit OLM6, 20 kv , Nst Sarande 110/20 kv Berdenesh Nr. 5 - Ksamil Nr 13 (furnizimi il zones Ksamil me linje unazore) dhe zgjatimi I fiderit OLM 5 per furnizimin e zones PSV (Marine) Ksamil.	40,000,000	80,000,000	93,143,820	93,143,820	100%
31	Rikonstruksioni I kabinave ekzistues 20 Kv dhe rrjetit TU 0.4kv, fideri OLM 5 (Ksami), N/St Sarande 110/20kv	22,107,346	22,107,346		-	
32	Furnizimi I Aeroportit te Vlores	30,000,000	60,000,000	52,759,231	47,483,308	90%
33	Ndertimi I Fiderave 20kV L10 N.St. Vlora 1 dhe Fideri J10 N.St. Vlorave per furniziminn e objeteve ne Portin e Vlores	55,192,960	71,451,715	66,370,776	66,370,776	100%
34	Ndertimi i linjes kabllore 20kV N.St Orikum - Tuneli Llogarase	50,000,000	160,000,000	144,150,216	144,150,216	100%
35	Ndertimi i linjes 20kV ajrore N.St Palase - Tuneli Llogarase	31,000,000	61,000,000	49,875,383	49,875,383	100%
36	Ndertim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetmbajtje te tipit ABC per kete kabine	5,000,000	5,000,000	4,586,071	4,586,071	100%
37	Nderti I linjes TM, 10kV, Fideri Nr. 2 Dohoshisht (ne punonjesit tane)	5,480,713	5,480,713	5,480,713	5,480,713	100%
38	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Ffideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 1)	14,556,552	14,556,552	101,749,566	101,749,566	100%
39	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 2)	30,651,460	90,651,460			
40	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Ffideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 3)	42,000,000	142,000,000	138,168,476	131,260,052	95%
41	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstruksion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 16 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	77,042,574	77,042,574	75,092,587	75,092,587	100%
42	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstruksion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 17 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	108,608,000	108,608,000	106,994,689	106,994,689	100%
43	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstruksion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 18 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	151,395,600	151,395,600	148,812,827	148,812,827	100%
44	Rikonstruksion dhe kalimi ne 20kV I kabines Vasil Shanto, Fideri 17, N/Stacioni 110/20/6kV Shkodra 1	4,084,915	4,084,915	4,084,915	4,084,915	100%

45	Sistemim i rrjetit TM/TU & kab. Nr.14 SMT, Lagja Lalm i Ri , F-2 (Gurra), N/St 110/10kV Lezhe	6,595,018	6,595,018	6,595,018	6,595,018	100%
46	Ndertimi i kolektorit kabllore nga Puseta P1 deri ne Puseten P10, N/st. Plazh Velipoje 110/20kV, ndertimi i fiderave kabllore 20kV F1 dhe F2, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC te Plazh Velipoje (nga n.st. Velipoje - Kabina Box 22/F1)	52,000,000	192,000,000	182,138,999	182,138,999	100%
47	Rikonstruksion rrjeti TM, N/Stacion - Shoshan dhe Shoshan -Valbone, Fideri Ujsjells, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri	40,000,000	80,000,000	72,112,635	72,112,635	100%
48	Rikonstruksion i pjesshem i fiderit Ujsjelles, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri.	40,000,000	80,000,000	74,390,979	74,390,979	100%
V	Ndertim/Rikonstruksion kabinash elektrike	44,999,625	110,142,569	100,384,027	99,156,827	
1	Ndertimi te nje ndertese te re per qendren BACKUP – SCADA DCC – B	25,000,000	34,000,000	24,544,000	23,316,800	95%
2	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder	7,092,708	33,549,146	33,352,841	33,352,841	100%
3	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndertimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Dures	12,906,917	42,593,423	42,487,185	42,487,185	100%
VI	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)	176,118,144	706,118,144	676,520,899	671,132,216	
1	Zgjatimi i rrjetit TU te kabina elektrike ne NST TEC,Kombinat dhe NST Kombinast e ri 110/20 kv.	4,934,526	4,934,526		-	
2	Ndertimi i 2 kabinave te reja dhe Rrjeti TU ne zonen e Dajtit	25,000,000	25,000,000	22,821,648	22,821,648	100%
3	Rrjet TU me kabell ABC fshati QINAM Agjensia Erseke, Rajoni Korce	2,046,559	2,046,559	1,566,179	1,566,179	100%
4	Rrjet TU me kabell ABC fshati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce	2,696,630	2,696,630	2,264,524	2,264,524	100%
5	Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC kabina Rehove 1+2	3,420,379	3,420,379	2,834,158	2,834,158	100%
6	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel 'Zona Mamurras-Milot'	57,600,000	207,600,000	205,107,514	205,107,514	100%
7	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Peshkopi Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Guri I Kuq,Bellova,Pularia"	40,200,050	180,200,050	172,492,727	172,492,727	100%
8	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Bulqize Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Gjorice,Fushe Bulqize,Zerqn,Krast,Trbisht"	40,220,000	280,220,000	269,434,150	264,045,467	98%
VII	Teknologji Monitorimi	-	-	-	-	
1	Automatizimi i komandimit ne distance (RTU)	-	-	-	-	0%

2	Mirembajtje dhe komunikim te sistemit SCADA me 5 Nenstacionet.	-	-	-	-	0%
VIII	Investime ne matjes	115,934,400	315,934,400	307,712,946	307,712,946	
1	Matesa Lidhje te re, Likujdim anomalish, verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ose plane OSSH, Me sistem matje, perfshire aksesoret e nevojshem.,(23,000 matesa 2023), (50,000 matesa 2024) dhe (50,000 matesa 2025)	95,934,400	195,934,400	191,859,400	191,859,400	100%
2	Instalimit te Sistemi i matjes inteligjente te Bilancit te energjise ne kabinat elektrike TM-TU, ne konsumatore private,Software dhe integrimi i tyre me platformen MDM	20,000,000	120,000,000	115,853,546	115,853,546	100%
IX	Investime ne sistemin e matjes	180,000,000	1,056,704,894	992,576,392	992,576,392	
1	Projekti i Furnizim dhe instalimit te Sistemi i matjes Smart i Bilancit te energjise ne kabinat elektrike ,Software dhe integrimi i tyre me platformen MDM (Etapat e pare)	180,000,000	1,056,704,894	992,576,392	992,576,392	100%
X	Mbikqyrje Punimesh per nevoja te OSSH sh.a	70,000,000	138,665,428	138,665,428	124,798,885	70%
	TOTALI	2,800,477,636	8,453,909,683	7,977,252,965	7,649,622,442	96%

Realizimi i investimeve te planit per vitin 2024

Nr.	Emertimi i zerave te investimeve	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	TOTALI (lek)	Vlera e Investimit (Kontrata)	Investimi i realizuar ne terren	
					Vlerat Realizimit te investimit (lek)	Perqindja e Realizimit te investimit (%)
	Lista e Investimeve per tu realizuar gjate vitit 2024					
I	Ndertim/rikonstrukcion elektrik per Nenstacionet		2,860,000,000	2,056,056,114	58,808,040	
1	Rikonstrukcion dhe fuqizim i N.Stacionit Kafaraj 110/35/6 kV	Fier	600,000,000	587,259,709	29,362,985	0%
2	“Ndertimi i Nstacionit te ri Akerni 110/35/20kV dhe zhvillimi i linjes 35kV N/stac Akerni- Aeroporti Vlores”	Vlore	427,000,000	493,379,151	-	0%
3	Ndertim i N/Stacionit te ri Xare 110/20/10kV	Gjirokaster	600,000,000	588,901,087	29,445,054	0%
4	Ndertim i N/Stacionit te ri Piqeras 110/20/10kV	Gjirokaster	400,000,000	386,516,167	-	0%
5	Fonde shtese per ndertimin e nenstacionit te ri nentokesor 110/20 kV Qender, per diferencen e pambuluar nga kredia e Bankes BERZH me bashkefinansim nga fondet e OSSH sh.a	Ossh	833,000,000		-	
II	Ndertim/Rikonstrukcion linjash te TL		473,000,000	468,405,198	9,368,104	
1	Zhvillimi i linjes me dy qarqe 35kV(me izolacion 110 kV),N.Stacionit Kafaraj Fier - Hoxhare (traseja e linjes ekzistuese 35kV)	Fier	473,000,000	468,405,198	9,368,104	2%
III	Ndertim Rrjeti TM		920,274,290	1,002,018,965	618,187,499	

1	Zhvillimi i fiderit TM 20kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklips)dhe kabina K13 deri ne kabinen K12 (E10).Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC. Lidhja ne unaze e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke	Tirane	250,000,000	230,291,797	103,631,309	5%
2	Kalimi nga 6kV ne 20kV i kabinave te fiderit 23 te N/Stacionit Selite	Tirane	17,230,559	29,291,096	29,291,096	40%
3	Rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan	86,074,026	83,360,202	83,360,202	35%
4	Rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Shpatit Nst Mjebes	Elbasan	113,838,965	110,947,853	88,758,283	15%
5*	Rikonstruksioni i Fiderit Potomit ,10kV N/Stacioni Corovode 35/10kV	Berat	37,360,702	136,335,109	122,701,598	60%
6*	Rikonstruksioni i Fiderit Nr.3,10kV N/Stacioni Bicukas . 35/10kV	Berat	14,459,685	29,834,147	29,834,147	70%
7*	Rikonstruksioni i Fiderit Nr.9,10kV N/Stacioni Mertish 35/10kV	Berat	15,410,354			
8	Zgjatimi i Fiderit F.11, N/Stacioni 110/20kV Fieri i Ri	Fier	75,000,000	72,003,761	72,003,761	30%
9	Rikonstruksion i segmenteve te fiderave kabllore 20kV, F6, F16, F17, N/Stacioni 110/35/20/10/6 kV Shkodra 1	Shkoder	14,900,000	14,597,990	-	0%
	“Zhvillimi i rrjetit Elektrik 20 kV per permiresimin e cilesise se furnizimit te zonave pergjate rruges se Arbrit dhe furnizimi i Tunelit te Murrizit”	Tirane	296,000,000	295,357,009	88,607,103	0%
IV	Ndertim/Rikonstruksion Rrjeti TM/TU		4,028,990,042	3,720,332,597	2,920,968,278	
1	Zhvillimi i kabinave te reja shtyllore, linjat perkatese TM dhe linjat TU me percjelles ABC ne fiderat F1,F2 te N/Stacionit Ndroq 35/6 kV	Tirane	110,000,000	96,878,648	62,971,121	0%
2	Ndertimi I 2 Kabinave te reja 20 kV dhe rrjet TU me kabel ABC ne fiderin Q1 dhe Q2	Tirane	30,000,000	87,300,000	52,380,000	56%
3	Zhvillimi i rrjetit TM 20kV,Fidera te rinj I8 dhe I9 N/St. Ibe. Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC.	Tirane	180,000,000	162,303,035	146,072,732	10%
4	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV 330/1 nga N/Stacioni Selite,per uljen e ngarkeses se fiderit 330(N/Stacioni Selite) ne unaze me fiderin L17 (N/Stacioni Qender)	Tirane	18,000,000		-	
5	Kalimi nga 6kV ne 20kV i Fiderit 91 dhe Fiderit 75 ,N/Stacioni Traktora.	Tirane	25,300,000		-	
6	Rikonstruksion i kabines Zgafnur dhe ndertimi i rrjetit TU me percjelles ABC ,Fideri 142 N/Stacioni Valias.	Tirane	13,000,000	11,610,257	11,029,744	0%
7	Zhvillimi i lidhjes unazore 20kV, te fiderave F16 dhe F17(N/Stacioni Kashar)	Tirane	3,680,000		-	
8	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV , Z17 nga N/Stacioni Zogu I Zi, per uljen e ngarkesave te Fiderit 321(N/Stacioni Selite) ne unaze me Fiderin L3 (N/Stacioni Qender).	Tirane	18,000,000		-	
9	Zhvillimi i rrjetit TM 20kV,Fiderit T8,Nstac.Kombinat 110/20kV, per furnizimin e TEDA	Tirane	33,000,000	28,741,046	28,166,225	98%
10	Zhvillimi i dy kabinave te reja K18 dhe K19 ,linje TM dhe linjat TU me percjelles ABC, te fiderit J10 ,N/Stacioni.Traktora	Tirane	32,000,000		-	
11	Rikonstruksion Rrjeti TM, Kabina, dhe Rrjet T.U me Percjellesa A1 me Vetembajtje te Tipit "ABC" Spille N/St 35/6 KV Ballaj	Durres	210,000,000	204,842,460	190,503,488	50%
12	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave te Fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas), Nst Radio	Elbasan	99,706,729	96,521,964	96,521,964	50%
13*	Rikostruksion i rrjetit TM/TU ,kabine , rrjet TU me kabull ABC ne agjensine Gramsh	Elbasan	55,000,000	66,197,987	66,197,987	50%
14	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave te Fiderit Shpatit Nst Mjebes	Elbasan	131,443,655	126,727,700	126,727,700	80%
15	Ndertimi i kabines se re Box Pika Shperndarse	Elbasan	2,500,000	2,340,000	2,340,000	100%

16	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 4/10kV, N/Stacioni Kucove, 110/35/10/6kV	Berat	114,168,137	108,815,393	108,815,393	80%
17*	Rikonstruksioni i Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit A1U dhe A4B	Berat	41,859,709	119,052,339	119,052,339	50%
18*	Rikonstruksioni i kabinave dhe Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Mbrakull -6KV N/ST Polican 35/6KV "	Berat	105,000,000		-	
19*	Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 26/6KV N/ST Kombinatat 35/6KV	Berat	63,407,738		-	
20*	Ndertim i rrjetit TM, 20kV, kabines dhe rrjetit TU me kabell ABC ne fshatin Vojnik	Berat	16,930,938		-	
21	Zhvillimi rrjeti kabllor TM 20kV OLM 5/1 , N/Stacioni Sarande 110/20kV - Ksamil	Gjirokaster	210,000,000	204,498,113	204,498,113	90%
22	" Rikonstruksion rrjeti TM me izolacion 20kV, kabina dhe rrjet TU me ABC per fshatrat : Vrine,Shendelli,Xarre,Mursi,Konispol,Vagalat .Livadhja dhe Finiq"	Gjirokaster	310,000,000	294,357,472	206,050,230	70%
23	Rikonstruksion kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat OLM1 dhe OLM 2, Nst Sarande 110/20 kv	Gjirokaster	123,000,000	109,435,539	103,963,762	60%
24	Zhvillimi i rrjetit TM,kabin dhe TU dhe rrjet TU me kabell ABC ne drejtorine rajonale Gjirokaster (Agjensia Gjitokaster, Permet,Tepelen, Delvine, Borsh)	Gjirokaster	280,000,000	274,904,180	164,942,508	40%
25	Zhvillim linje TM (me izolacion 20kV),kabina dhe linje TU me percjelles ABC ne Qeparo, N/Stacioni 35/10 kV	Vlore	33,000,000	25,407,253	10,162,901	35%
26	Zhvillimi i linjave TM 20kV,kabinave elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC,per fiderat O1 dhe O2 nga N/Stacioni Oriukum 110/35/20kV per furnizimin me energji elektrike te zones Radhime.	Vlore	480,000,000	443,544,462	332,658,346	60%
27	Rikonstruksioni I rrjetit TM per fiderat Nr.1,2,3, Cakran, Buzmadh dhe Varibob, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier	99,850,000	95,592,430	86,033,187	40%
28	Rikonstruksion rrjet TM fideri 19n/st Korce pjesa fshati Drenove, rrjet TU me ABC Fshati Drenove, rikonstruksion kabina Qyteti I Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe ndertim kabine e re me murature tulle Drenove 3	Korce	26,200,000	143,796,019	107,847,015	30%
29*	Rrjet TU me kabllor me vetembajtje ABC Kabina Vlocisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabinat Vlocisht 1+2 dhe ndertim kabine e re me murature Vlocisht 3	Korce	21,200,000	150,571,586	143,043,007	3%
30*	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstruksion kabina Zvirine 1+2+3	Korce	13,600,000		-	
31*	Rrjet TU me kabllor me vetembajtje ABC Kabina BOROVE, dhe ndertim kabine e re me murature tulle fshat BOROVE	Korce	2,500,000	14,788,240	14,048,828	30%
32*	Rrjeti TU me kabllor ABC I kabinave te fshatit Podgorie, fideri 14, N/St Petrushe, ndertim kabine shtyllore me dy shtylla, linje TM 10kV per lidhjen e kabines shtyllore me rrjetin TM nga kabina Podgorie 1	Korce	32,000,000		-	
33*	Rrjet TU me ABC Fshati Areze dhe rikonstruksion kabina fshati Areze	Korce	6,010,288	23,712,838	22,527,196	30%
34*	Rrjet TU me ABC Fshati Nikolice dhe ndertim kabine e re fshat Nikolice	Korce	2,316,606		-	
35	Ndertim kabine dhe rrjeti TU me ABC i kabinave te fshatit Vithkuq , FIDERI Vithkuq,N/ST Rehove	Korce	16,450,617		-	
36	Ndertim kabine shtyllore KML4 dhe KML5 zhvillimi i rrjetit TU I tyre dhe kabines Ndue Ndokaj F-5,F-7, n/dt. Lezhe	Shkoder	9,546,528	8,803,609	7,923,248	40%
37	Sistemim rrjeti TM/TU & kabines Box Boriq i Madh 2 F-1 N/St Vrake, Koplik	Shkoder	3,005,773	2,981,296	2,981,296	100%

38	Rikonstruksion i rrjetit TU dhe kabines shtyllore Bleran e Re 1 ,F-5, N/St SH-1	Shkoder	5,068,654	4,990,989	4,990,989	100%
39	Rikonstruksion i rrjetit TU dhe kabines mureore Muriqan 1, fideri Zues, N/St Zues	Shkoder	6,343,931	6,276,841	6,276,841	100%
40	Rikonstruksion i rrjetit TU dhe kabines mureore Belaj rrushkull, F-1, N/St Dajc	Shkoder	8,437,150	7,849,508	7,064,557	50%
41	Zhvillimi i linjave TM 20kV , kabinave 20kV dhe rrjetin TU me percjelles ABC per fiderat F3 dhe F4 N/Stacioni Velipoje 110/20kV (nga N/Stacioni Velipoje - Kabina Box 17/F3)	Shkoder	199,000,000	186,344,195	-	0%
42	Kalim nga 6 kV ne 20 kV I rrjetit TM, rikonstruksion I kabinave dhe rrjeti TU me kablo ABC ne fidrin 21,SH-1	Shkoder	142,000,000	136,235,298	129,423,533	32%
43	Lidhja unazore e N/Stacioneve Shkodra 2 ,Fideri 9 dhe N/Stacioni Bushati ,Fideri I Ri dhe zhvillimi TM/TU I zones se Beltojes	Shkoder	100,000,000	96,439,439	48,219,720	48%
44	Furnizimin me energji elektrike te blloqeve te banimit te procesit te rindertimit ne zonen e re per zhvillimin e Spitalles, Bashkia Durres.	Durres	19,727,578	18,976,020	18,976,020	100%
45	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU dhe kabinave ne fiderat: Agim 1 Nst Libofshe; 2(Seman) Nst Hoxhare; Mbrostar Ura Nst Fieri 1 dhe fiderit Ferme Nst Fieri 2	Fier	110,000,000	-	-	10%
46	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU per fiderat 15, 16, 26 Nst Kafaraj si edhe ndertimi i linjave dhe kabinave te reja TM/TU per furnizimin e serave ne zonen e ish Komunes Cakran dhe ish Komunes Frakull	Fier	80,000,000	-	-	0%
47	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU ne Drejtorine Rajonale Fier per zonat Roskovec, Patos	Fier	70,000,000	67,866,729	40,720,037	10%
48	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU per fiderin Fratar , n.stacioni Pocem 35/6kV dhe vazhdimi i kabinave te mbetura te fiderit Aranitas, n./stacioni Pika shperndarjes Ballsh	Fier	70,000,000	67,188,476	36,953,662	5%
49	Berat Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 2/6kV N/Stacioni Lushnje(Qender) 35/6 kV	Berat	70,000,000	67,783,233	54,226,587	10%
50	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 11/10 kV dhe Nr.3/10 kV N/Stacioni Bicukas-Divjake 35/10 kV.	Berat	100,000,000	95,000,000	95,000,000	60%
51	"Ndertim i nje segmenti pusta dhe tuba (pjesa e fiderit 10 kV ,8-18 Perpunim Druri , N/St Pogradec) ne rrugen e Tushemishtit"	Korce	16,000,000	13,443,775	13,443,775	99%
52	Rikonstruksioni I kabinave elektrike te permbytura ne qytetin e Vlores	Vlore	60,736,011	48,214,227	48,214,227	50%
V	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)		1,237,185,676	597,903,791	450,017,976	
1	Investim ne rrjeti TU ne Kruje/ Fushe Kruje	Durres	86,000,000	79,585,167	59,688,876	4%
2	Investim ne rrjetin rrjetin TU 20kV N/St Kavaje si dhe Zgjerim rrjeti 20 kV si dhe Ndertim Kabine Elektrike dhe Ndertim Rrjeti T.U per zonen e Golemit.	Durres	96,500,000	-	-	
3	Zgjerim rrjeti 20 kV , Ndertim Kabine Elektrike dhe Ndertim Rrjeti T.U per zonen e Nikles N/St 110/20 kV Fushe Kruje	Durres	71,943,075	-	-	
4	Rikonstruksion rrjeti TM-TU ne zonat problematike te qytetit Durres dhe Shijakut	Durres	122,000,000	-	-	
5	Investim ne rrjetin rrjetin TM., TU 10kV N/St Rrogozhine (shoqerohet me liste analitike kabinve)	Durres	65,000,000	-	-	
6*	Rikonstruksion i rrjetit TU me ABC Zona Bujqes Elbasan	Elbasan	12,752,160		-	
7	Rikonstruksioni i rrjetit TU te Fiderit Nr.2, 20 kV, Nenstacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/St Fieri 2	Fier	50,000,000	48,065,419	48,065,419	100%
8	Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Strum dhe Roskovec 3, Nenstacioni Matke 35/10 kV	Fier	32,500,000	30,332,076	30,332,076	36%

9	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Boboshtice kabina Boboshtice 1 Nst Gjanc , Fideri Fshat	Korce	10,086,145			
10	Rrjeti TU me kablo ABC I kabinave te fiderit 8, N/stacioni Bilisht (kabinat e fshatrave te bashkise Pustec)	Korce	44,000,000	43,238,019	41,076,118	3%
11	Rrjet TU me ABC fiderat 1,2,3,4,6 dhe 7 N/St Korce, qytet KORCE	Korce	81,600,000		-	
12*	Rrjeti TU me ABC i kabines "Shqitas", N/ST Petrushe, Fideri 11	Korce	9,000,000		-	
13*	Rrjeti TU me ABC i kabinave te fshatit Symize , Korce	Korce	11,100,000		-	
14*	Rrjeti TU me ABC i kabinave te fshatit Drithas,N/ST TEC MALIQ , fideri Komunal 2	Korce	12,674,984		-	
15*	Rrjet TU me kabell ABC qytet Leskovik Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce	12,615,240		-	
16*	Rrjeti TU me ABC i kabinave "Leshnice 1" dhe "Leshnice 2", fideri 14 Cerave,N/ST Petrushe	Korce	15,233,955		-	
17	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Mborje, kabinat Depot 101K, Morje 1, Mborje 2	Korce	14,490,489		-	
18*	Rrjet TU me kablo me vetembajtje ABC Kabina Mollas 1, me transformator Sn = 250 kVA , Fideri 3M, N/St Mollas	Korce	1,317,244		-	
19*	Rrjet TU me kabell ABC fshati Rembec, Njesia Korce, Rajoni Korce	Korce	17,200,000		-	
20*	Rrjet TU me kabell ABC fshati Bitincke, Agjensia Bilisht, Rajoni Korce	Korce	16,361,294		-	
21*	Rrjet TU me kabell ABC fshati Pirc, Njesia Korce, Rajoni Korce	Korce	19,779,857		-	
22	Rrjeti TU me kabell ABC fshati Barc, agjensia Korce, Rajoni Korce	Korce	9,506,418		-	
23	Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU ne kabinen "Zooteknike 2", F-2, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder	5,447,450		-	100%
24	Rikonstrukcion rrjeti TU i kabinave mure dhe shtyllore "Qender Mes", "Qender Myselim", "Qender Myselim 2", Fideri 15, N/St 110/35/20/6 kV Sh-1	Shkoder	31,077,365	30,439,923	30,439,923	100%
25	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Bicaj, Mustafaj, Brataj Bozhe	Kukes	52,000,000	50,202,682	50,202,682	70%
26	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Shtiqen	Kukes	102,000,000	91,978,944	78,182,103	41%
27	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' neNjesit Peshkopi,Bulqiz, Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat:Rrethinat e Qyteti Peshkopi,Borvjan,Zerqan, Fushe Bulqiz"	Burrel	235,000,000	224,061,562	112,030,781	15%
VI	Teknologji Monitorimi		10,500,000	-	-	
1	Upgrade Sistemi PowerFactory	OSSH	5,250,000		-	
2	Modul i administrimit te projekteve	OSSH	5,250,000		-	
VII	Investime ne matje		293,768,000	270,551,000	113,631,420	
1	Matesa Lidhje te re,Likujdim anomalish ,verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ ose plane OSSH , ne sistem matje,perfshire aksesoret e nevojshem,(21450 matesa per vitin 2024)	OSSH	274,668,000	270,551,000	113,631,420	42%
2	Blerje Aparate Testues Etalon (6 aparate)	OSSH	19,100,000		-	
VIII	Blerje Paisje makineri		1,597,000,000	1,456,956,136	1,338,183,332	
1	Blerje paisje primare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH	100,000,000	100,000,000	100,000,000	10%
2	Blerje paisje sekondare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH	250,000,000	239,956,136	91,183,332	38%
3	Blerje paisje per nyjet komutuese te Linjave dhe N/Stacione	OSSH	280,000,000	280,000,000	280,000,000	100%
4	Blerje te paisjeve komutuese per kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%
5	Blerje Transformatore Fuqie per Kabina elektrike	OSSH	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100%

6	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fishek	OSSH	54,000,000	54,000,000	54,000,000	100%
7	Blerje Transformatore Instrumentale TU & TM (Transformator rryme TM&TU, Transformator Tensioni)	OSSH	53,000,000	53,000,000	53,000,000	100%
8	Kabell ABC dhe aksesore	OSSH	230,000,000	230,000,000	230,000,000	100%
9	Instalim Kontroll monitorim sistem kamera per N.Stacioone	OSSH	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100%
10	Blerje kablli 35kV XLPE (1x240)mm2	OSSH	30,000,000		30,000,000	100%
11	Shpenzime per emergjencat	OSSH	100,000,000		-	
IX	Mbikqyrje supervizimi	OSSH	110,000,000	110,000,000	33,000,000	30%
TOTALI ME FONDET E OSSH			11,530,718,007	9,682,223,801	5,542,164,649	57%

Vo: Marketimet me ngjyre te njejte ne Nr.Rendor dhe ne kolonen e vleres se kontratuar te investimeve, tregojne kontratat e lidhura sipas prokurimeve per dy ose me shume zera investimesh.

Realizimi i investimeve ne planin 5-vjecar 2023 - 2027

Nr./viti ndryshimit	Emertimi i Investimit	Qyteti/Komuna /Zona OSHEE	Derguar ne ERE 2023-2027 me shkraven me NR.6713/I, date 26.07.2023					Perdiesimi 2023-2027 me ndryshimet e viteve 2023, 2024 dhe 2025					Perdiesimi i realizimeve			
			Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)	%	Status i Investimit
1	Ndertimi/rikonstruktion elektrik per Nensacionet		545,000,000	1,360,000,000	1,280,000,000	2,905,000,000	2,800,000,000	8,950,000,000	545,000,000	1,907,000,000	2,913,000,000	3,575,000,000	2,220,000,000	11,220,000,000		-
1	Fuqizimi i N Stacionit 110/20kV Golem - Durres	Durres	135,000,000	40,000,000				205,000,000	135,000,000	40,000,000				205,000,000	100%	
2	Ndertimi i nstacionit te ri Velloje 110/35/20kV	Shkodër	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000	92%	
3	Fuqizimi i N Stacionit 110/20kV Zogaj Z1 (2x40 MVA)	Tirane	50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000	50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000	99%	
4	Ndertimi i N Stacionit te ri Fier 2 110/20kV	Fier	50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000	50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000	60%	
5	Rikonstruktion dhe fuqizimi i N Stacionit Kugove 110/35/20/10/6kV	Berat	50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000	50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000	85%	
6	Rikonstruktion i N Stacionit Pogradee 110/35/10kV ne 110/35/10/20kV	Pogradec	50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000	50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000	100%	
7	Rikonstruktion dhe fuqizimi i N Stacionit Corovode e Re 110/35/10kV	Berat	30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000	99%	
8.2024	Rikonstruktion i N Stacionit Kafaraj 110/35/10kV	Fier				100,000,000	80,000,000	180,000,000		100,000,000	300,000,000	200,000,000		600,000,000	5%	Po punohet me anen ndertimore bazameteve te trakteve,godin es nuk jane vendosur ende pajisjet, date fillimi 10.03.2025
9.2024	"Ndertimi i Nsacionit te ri Akerni 110/35/20kV dhe zhvillimi i lujtes 35kV N'sine Akernit- Aeroporti Vlores"	Fier										100,000,000		427,000,000	0%	Ne proces marrjes se lejes se ndertimit
10	Fuqizimi i N Stacionit 35/6kV Pallati Kongresive transformoret 35/20kV (2x15 MVA)	Tirane				200,000,000	105,000,000	305,000,000				200,000,000	105,000,000	305,000,000		
11	Rikonstruktion i N Stacionit i Hee Landregas 35/10kV dhe fuqizimi me transformatore 35/20kV (1x15)MVA	Tirane				130,000,000	200,000,000	330,000,000				130,000,000	200,000,000	330,000,000		
12	Ndertimi i N Stacionit Fushë Krugje 110/20kV (Zevendesimi i n'st. Mobile)Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Durres				185,000,000	100,000,000	285,000,000				185,000,000	100,000,000	285,000,000		
13	Fuqezimi i N Stacionit Shkodra I me transformatore Tr.2 110/20kV (1x40)MVA	Shkodër				70,000,000	100,000,000	170,000,000				70,000,000	100,000,000	170,000,000		
14	Rikonstruktion i impjantit 20kV N Stacioni Bushati 110/20kV	Shkodër				55,000,000		55,000,000				55,000,000		55,000,000		
15.2023	Rikonstruktion i N Stacionit Lezhe nga 110/10kV ne 110/20/10kV	Shkodër	40,000,000	60,000,000	90,000,000			190,000,000	40,000,000	80,000,000	90,000,000			210,000,000	99%	

NIPT: L81530018E

1.2025	Ndërtimi i Shkollës 110kV për fshatin e rehatimit të ri Kamez 110/20kV me rrethin 110 kV	Tiranë	7,300,000							7,300,000						7,300,000			
2	Rikonstruksioni I Linjes 35kV N-stacion Konstudio - N-stacion Lana Bregas - N-stacion Pallat Kongresive	Tiranë								300,000,000	200,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000					
3	Ndërtimi i rrjetit të ri kabllor 35kV AL XLPE (1x3+1x30mm²) N.Sti 220kV Tiranë I, Rajonal OST - N.Sti 35/20/GKV Kinostudio.	Tiranë								105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000					
4	Ndërtim tuneli për kabllot te TL dhe TM te shperndarjes N/stacion Kongrese drejtum N/stacioni qender Segmenti A-B	Tiranë								308,016,450	108,016,450	200,000,000	108,016,450	308,016,450					
5	Ndërtim tuneli për kabllot te TL dhe TM te shperndarjes nga N/stacioni qender -n/stacioni Kongrese segmenti D-C	Tiranë								231,543,017	100,000,000	131,543,017	100,000,000	231,543,017					
6	Ndërtim tuneli për kabllot te TL dhe TM te shperndarjes nga N/stacion Kongrese drejtum N/stacioni qender Segmenti B-C	Tiranë								87,043,792	87,043,792	87,043,792	87,043,792	87,043,792					
7	Rikonstruksioni I nryave kritike ne linja 35 kV	OSSH							30,000,000	50,000,000				50,000,000			100%		
8 2024	Ndërtimi i linjës me dy qasje 110 kV N.Sti Kafaraj Fier - Hoxhare (traseja e linjës ekzistuese 35kV)	Fier								460,000,000	460,000,000			460,000,000			2%		
9 2025	Ndërtimi i linjës 35kV N.Sti Koplik 220kV - N.Sti Vukpalaj me dy qasje.	Shkodër												310,000,000					
10 2025	Ndërtimi i linjës 35kV N.Sti 220kV Elbasan - Mjekes - Cerruje - Gramsh.	Elbasan											200,000,000	200,000,000					
11 2025	Ndërtimi i linjës 35kV Kavaje - Rrogozhinë me një qark	Tiranë												230,000,000					
12	Rikonstruktio Linja 35 kV Fuke - Konan	Shkodër								74,200,000	74,200,000	74,200,000	74,200,000	74,200,000					
III	Ndërtim Rrjeti TM			-					113,490,503	2,233,384,477	848,000,000	920,274,290	884,778,615	3,460,543,408			0%		
I	Fiderat e tuj "E11" dhe "E12" 20kV nga n/sti Farke-1 10/20/10kV-deri tek kabina ekzistuese K-8 (Ekspst) dhe fiderit "E12" nga kabina "K-8"-deri tek degjezimi i Vishlujes	Tiranë								60,000,000				60,000,000					
2 2024	Zhvillimi i fiderit TM 20kV E11 N/sti Farke deri tek kabina K8 (Ekspst)dhe kabina K13 deri ne kabinetin K12 (E10) Kabinat elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC. Lidhja ne unaze e fiderit E11 e n/sti Farke me Fiderin E10 N/sti Farke	Tiranë								-				250,000,000			5%		
3 2024	Kalimi nga 6kV ne 20kV i kabineve te fiderit 73 te N/Stacionit Sufio,	Tiranë								17,230,559				17,230,559			40%		

A: Bulevardi "Gjeri Fishta", Ndërtesa Nr 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri
NIPT: L81530018E

[illegible]

25. 2024	Rikonstruksion I segmenteve te fiderave kablllore 20kV, F6, F16, F17, N/Stacioni 110/35/20/10/6 kV Shikodra 1	Shtokod er	14,884,800	14,884,800	14,900,000				0%	Ne prije te lejes se punimeve					
26	Sistemi i daljeve te fiderave TM 10 kV, F-Rape, Parku, Gegjani, N/Si Fusha Atrës	Shtokod er	4,754,696					4,754,696		4,754,696					
27. 2025	Ndërtimi kolektori për spollimin e fiderave dalës te N/Stacionit 110/20/10 kV, Lezhe	Shtokod er													
28. 2025	Sistemi i segmentit TM te fiderit ekzistues F15 si dhe Fiderit I ri 20 kV F 3 N/Si 110/20/6 kV Shikodra 2”	Shtokod er						12,000,000		12,000,000					
								117,000,000		117,000,000					
29	Rikonstruksion i Fiderave Baze, Ulez N/Si Ulez, Ashensia Burrel, Drejtoria Rajonale Burrel ne rrjetin 10kV	Burrel	93,000,000					93,000,000		93,000,000					
30	Rikonstruksion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F8 Has	Kukes		35,000,000					35,000,000	35,000,000					
31	Rikonstruksion i fiderit Lekbibaj ndarja e Gegjysenit ne fider te ri	Kukes		95,000,000					95,000,000	95,000,000					
32	Rikonstruksion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F6 Has	Kukes		36,000,000					36,000,000	36,000,000					
33. 2024	“Zhvillimi i rrjetit Elektrik 20 kV për përmetesimin e cilesise se furnizimit te zoneve perqajate rruges se Arbrit dhe furnizimi i Tunelit te Murizit”	Tirane						296,000,000		296,000,000					
34. 2025	Ndërtimi i dy fiderave te Rinj F33 dhe F34 nga N/Stacioni Kashar 110/20kV dhe rikonstruksion e kabinave ekzistuese K16 F27 dhe K13 F 28 për uljen e ngarkesave te fiderave F27 dhe F28	Tirane													
35. 2025	Zgjidhimi i fiderit 20 kV, F7 dhe lidhja ne unaze ne F14 nenstacioni Kashar si dhe ndërtimi i nje pike shperndarëse	Tirane								65,000,000					
IV	Ndërtim/Rikonstruksion Rrjeti TM /TU		1,120,176,489	852,660,026	414,000,000	3,330,247,923	4,902,902,635	1,507,704,405	4,908,049,114	3,558,533,375	2,012,280,843	2,684,251,026	14,700,818,762	0%	-
1	Faza e dyte e zgjerimit dhe rikonstruksionit te Fiderit E 10 ne zonën e Berzhites se bashku me rrjetin Tu me perqeljeë ABC	Tirane	40,000,000	50,000,000	70,000,000		160,000,000	40,000,000		50,000,000			160,000,000	100%	
2	Fider I ri 20 kV E 13 i N/Stacionit Farke 110/20/10 kV	Tirane	48,800,160				48,800,160	48,800,160					48,800,160	100%	
3	Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rinj Vore	Tirane		50,000,000				42,310,269	50,000,000				92,310,269	100%	
4	Linja ajrore TM 20 kV për zëvendësimin e fiderit E5 N/Stacioni Farke, nga degëzimi i Vialujës ne drejtim te Balldakut deri ne Ball Shaban, kabinat e reja dhe linja TU me kablë ABC	Tirane		65,000,000			65,000,000				65,000,000		65,000,000		
5. 2024	Ndërtimi i kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM dhe linjat tu me kablë abe ne fiderat F1, F2 dhe F3 te n/stacionit 35/6 kv Ndroq	Tirane	165,312,464			165,312,464							110,000,000	65%	
6	Ndërtimi i 12 kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne fiderin F4 TE N/Stacionit 35/6 kV Ndroq si dhe linjave TU me kablë ABC i 18 kabinave	Tirane						96,676,817					96,676,817	100%	

7	Ndërtimi i kabinaeve dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R21 i N/Stacionit Vore dhe nga fideri F8 dhe F32 te N/Stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6 kv te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore.	Tirane	50,000,000	76,660,026	126,660,026	50,000,000	76,660,026	126,660,026	100%	126,660,026
8.2024	Ndërtimi i 2 kabinaeve te reja 20 kV dhe rrejt TU me kabl ABC ne fiderin Q1 dhe Q2	Tirane	30,000,000		30,000,000		30,000,000	30,000,000	56%	30,000,000
9.2024	Zhvillimi i rrejtit TM 20kV Fidera te rrejt 18 dhe 19 N/St. Ibe. Kabinat elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC	Tirane		180,000,000			180,000,000	180,000,000	10%	180,000,000
10.2024	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV 330/1 nga N/Stacioni Shtete per uljen e ngarkeses se fiderit 330(N/Stacioni Shte) ne unaze me fiderin L17 (N/Stacioni Qender)	Tirane		18,000,000			18,000,000	18,000,000		18,000,000
11.2024	Kalimi nga 6kV ne 20kV i Fiderit 91 dhe Fiderit 75. N/Stacioni Traktora.	Tirane		25,300,000			25,300,000	25,300,000		25,300,000
12.2024	Rikonstruksim i kabines Zgafnur dhe ndërtimi i rrejtit TU me percejelles ABC. Fideri 142 N/Stacioni Valfas.	Tirane		13,000,000			13,000,000	13,000,000	95%	13,000,000
13.2024	Zhvillimi i lidhjes unazore 20kV, te fiderave F16 dhe F17(N/Stacioni Kashar)	Tirane		3,680,000			3,680,000	3,680,000		3,680,000
14.2024	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV. Z17 nga N/Stacioni Zoga L21, per uljen e ngarkeses te fiderit 321(N/Stacioni Shte) ne unaze me fiderin L13 (N/Stacioni Qender).	Tirane		18,000,000			18,000,000	18,000,000		18,000,000
15.2024	Zhvillimi i rrejtit TM 20kV Fiderit T8,Nsac Kombinat 110/20kV, per furnizimin e TEDA	Tirane		33,000,000			33,000,000	33,000,000	98%	33,000,000
16.2024	Zhvillimi i dy kabinaeve te reja K18 dhe K19. Linje TM dhe linjat TU me percejelles ABC, te fiderit J10 N/Stacioni Traktora	Tirane		32,000,000			32,000,000	32,000,000		32,000,000
17	Ndërtimi i fiderave te rrejt P6,P7,P8,P9,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve 35/20 KV-Tirane	Tirane			144,498,280			144,498,280		144,498,280
18	Ndërtimi i linjes TM kablore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 KV si dhe linja TU me kabl me vetembojtte ABC, per furnizimin e lagjes Sharrë	Tirane		20,756,450	20,756,450			20,756,450		20,756,450
19	Ndërtimi i fiderave te rrejt, P1 P2,P3,P4 dhe P5, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve 35/20 KV-Tirane	Tirane		64,289,525	64,289,525			64,289,525		64,289,525
20	Ndërtimi i kabines PSH 16/1 si dhe linjat e rrejtit TU me kabl ABC, me furnizim nga fideri F8, N/St Kashar	Tirane	13,533,267		13,533,267			13,533,267		13,533,267
21	Furnizim me TM 20kV i kabines se re muratore "Bota e Luleve", fideri F 29. N/St Kashar 110/20kV	Tirane	3,708,518		3,708,518			3,708,518		3,708,518
22	Zevendesimi i daljeve te para kablore te fiderave 6 kV, N/St Vore (me punonjessit tane)	Tirane	2,673,812		2,673,812			2,673,812		2,673,812
23	Ndërtimi i linjes dhe kabines se re shpyllorë "Lagja Varosh" si dhe linja TU me kabl me vetembojtte ABC	Tirane		5,637,580	5,637,580			5,637,580		5,637,580

24	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore ne kablore I kabina elektrike Pasho Hysi, Andieho Kaza Irsa Dollaku 2 A.I Dollaku 1 si dhe rrjeti TU 1 kabines K2.Palo Hysi ne NST Traktora	Tirane	51,212,956						51,212,956	51,212,956						99%
25	Furnizimi me TM/TU 20kV i kabines se re "Box Instituti Qendrer", Fideri A8, N/St Rajonal, qe do te shërbeje per ndarje ngarkesash (ne punonjesit tane)	Tirane	4,370,639						4,370,639	4,370,639						100%
26	Eleminimi I Fiderit 82, 6kV dhe furnizimi TM/TU 200-4kV I kabines se re "Shkroze 2 Box" (ne punonjesit tane)	Tirane	5,574,471						5,574,471	5,574,471						
27 2025	Furnizimi me TM 20kV dhe TU me kabeli me vetmbajlje ABC i kabinave te reja box K1d8, K1d9, fideri J10, N/St Traktora	Tirane	25,117,295						25,117,295							
28	Spostimi dhe sistemimi I kabines K1, fideri E-6,N/St Farkë (ne punonjesit tane)	Tirane	4,130,000						4,130,000							100%
29	Lidhja umzore mes fiderit E3 dhe E10, N/St farkë 110/20/10kV, Tirane (ne punonjesit tane)	Tirane	3,500,000						3,500,000							
30 2023	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen ne aksin e ri rugor Kashar - Tapirze, loti I	Tirane	-						35,073,289							100%
31 2023	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen ne aksin e ri rugor Thumane – Kashar, loti II	Durres	-						23,301,107							
32	Linja ajrore TM 20 KV per zevendesimin e fiderit E5 N/Stacioni Parkenga Ball Shaban deri ne Vrap,Sheukoll Paret , , kabina e reja	Tirane	150,000,000	150,000,000					150,000,000	150,000,000						
33	Zgjidhimi I Fiderit 8 me kabina dhe rrjeti te ri TU n/Stacioni Fushe Kruje 110/20kV (drejtum Babuqi)	Durres	21,158,859	100,000,000	20,000,000				21,158,859	100,000,000						100%
34 2024	Rikonstrukon Rrjeti TM, Kabina, dhe Rrjeti T U me Percepjellës A1 me Vetembajlje te Tipit "ABC" Spille N/St 35/6 KV Ballaj	Durres	-						-	210,000,000						50%
35 2025	Investim ne rrjetin rrjetin TU 20kV N/St Kavaje si dhe Zgjerim rrjeti 20 kV si dhe Ndertim Kabine Elektrike dhe Ndertim Rrjeti T U per zonen e Golemit.	Durres	-						-	96,500,000						0%
36 2025	Zgjerim rrjeti 20 kV , Ndertim Kabine Elektrike dhe Nderim Rrjeti T U per zonen e NIKës N/St 110/20 kV Fushe Kruje	Durres	-						-	71,943,075						0%
37 2024	Rikonstrukon rrjeti TM-TU ne zonat problematike te qytetit Durres dhe Shijakut	Durres	-						-	122,000,000						0%
38 2025	Investim ne rrjetin rrjetin TM , TU 10kV N/St Rrogozhine (shoqerohet me liste analitike kabineve)	Durres	-						-	65,000,000						0%
39 2025	Furnizimi me energji elektrike I Parkut Teknologjik DURANA	Durres								35,000,000						50%
40 2024	Rikonstrukon I rrjetit TU me kabull ABC dhe I kabinave te Fiderit Nr 1RD (Kluc, Mol্লা) Nst Radio	Elbasan	86,000,000	86,000,000					86,000,000	99,706,729						50%

NIPT: L81530018E

41.2024	Rikostruksion i rrjetit TM/TU kabine rrjetit TU me kabell ABC ne agjentine Gramsh.	Elbasa n						-			55,000,000				55,000,000
42	Rikonstruksion I fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh,	Elbasa n			85,352,238			85,352,238					85,352,238		85,352,238
43	Rikonstruksion I fiderit Nr. 13, Graecn, N/Stacioni Nr. 4dhe rikonstruksion I fiderit Bishqen, N/St Cerrik	Elbasa n			80,405,145			80,405,145					80,405,145		80,405,145
44	Rikonstruksion I fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim	Elbasa n			95,256,565			95,256,565					95,256,565		95,256,565
45	Rikonstruksion I fiderit Lixsha, N/St Mjakes, I fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan	Elbasa n			50,000,000		59,628,983	109,628,983				59,628,983	109,628,983		109,628,983
46	Rikonstruksion I fiderit Nr. 6, Tregan, N/St Radio dhe rikonstruksion I fiderit Nr. 8, N/St Banje	Elbasa n				88,767,079	88,767,079	88,767,079				88,767,079	88,767,079		88,767,079
47	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabineve ne rrethimet e Posqinit	Elbasa n				113,499,754	113,499,754	113,499,754				113,499,754	113,499,754		113,499,754
48.2025	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabineve ne rrethimet e Elbasanit	Elbasa n				145,000,000	145,000,000	145,000,000							280,000,000
49.2025	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabineve ne rrethimet e Librazhdit	Elbasa n											280,000,000		280,000,000
50	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC dhe i kabineve ne rrethimet e Cerrik	Elbasa n				138,385,630	138,385,630	138,385,630					138,385,630		138,385,630
51	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC dhe i kabineve ne rrethimet e Belsh	Elbasa n				180,000,000	180,000,000	180,000,000					180,000,000		180,000,000
52.2024	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabineve te Fiderit Shpatit Na Mjakes	Elbasa n			107,000,000			107,000,000			131,443,655				131,443,655
53.2024	Nderrimi I kabines se re Box Pika Superndarse	Elbasa n						-			2,500,000				2,500,000
54.2024	Rikonstruksion I kabineve dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 4/10kV, N/Stacioni Kucove, 110/35/10/6kV	Berat			93,396,734			93,396,734							93,396,734
55.2024	Rikonstruksioni i kabineve dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Mbrakull -6kV N/St Polican 35/6kV =	Berat						-			114,168,137				114,168,137
56	Nderrimi i rrjetit TM, 20kV, kabines dhe rrjetit TU me kabell ABC ne fshatin Vojnak	Berat						-			105,000,000				105,000,000
57	Vazhdimi per investimin ndertimi I Fiderit FS , Plug ,20kV N/Stacioni Pharnas	Berat			80,000,000			80,000,000				80,000,000			80,000,000
58	Rikonstruksion i kabineve dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 3/10kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat				46,045,600	46,045,600	46,045,600					46,045,600		46,045,600
59	Rikonstruksion i kabineve dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 5/6kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat				31,020,448	31,020,448	31,020,448					31,020,448		31,020,448

[illegible]

78	Ndërtimi i linjes kablore 20kV per furnizimin e tuncit Sharfices	Gjrok aster	40,000,000	50,000,000	40,000,000	130,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000	130,000,000	100%
79	Zgjidhja e fiderit E7, 20 kv, Nst Gjrokastr 110/20 kv per furnizimin e zonave se Lazaratit	Gjrok aster	154,200,000			154,200,000				154,200,000	100%
80 2024	Ndërtimi i rrejtimit TM/TU 20/0.4 kv per fiderat Leiter Talo, Jeta e re nensistemi 35/20/10 kv Liradnja si edhe fideri OLM2 Nensistemi 110/20/10 kv Sarande (pas pikes transformuese 20/10kV)	Gjrok aster	413,640,155			713,640,155			400,000,000	154,200,000	100%
81 2024	Rikonstrukcion kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat OLM1 dhe OLM2, Nst Sarande 110/20 kv	Gjrok aster				90,000,000		123,000,000		123,000,000	60%
82 2024	Zhvillimi i rrejtimit TM kabina dhe TU dhe rrejtimit TU me kabell ABC ne drejtorine rajonale Gjrokastr (Agjencia Gjrokastr)	Gjrok aster						280,000,000		280,000,000	40%
83 2025	Zhvillimi i rrejtimit TM 20kV Kabina elektrike dhe rrejtimit TU me ABC ne zonat Cuke, Sarande, dhe ndertim kabina te reja, rrejtimit TU me ABC ne fiderat 3.6 qytetit Sarande	Gjrok aster								130,000,000	
84 2025	Rikonstrukcion i kabineve dhe TU me ABC ne fiderin e Kardhiqit (ne fshatrat Zhulal, Cepune, Taromine, Fusha Bardhe, Golem, Kolonje, Mendar, Prongit, Labove, Andon Poci, Terbutun Hand Luge)	Gjrok aster								70,000,000	
85	Ndërtim kabine e re shqyrtore "Keshovice 3", Tr-1608VA, Linje TM/TU, Fideri Dropull i Sipern, Nst 35/10 kv Grapsh (ne punonjesit tane)	Gjrok aster	1,600,000			1,600,000				1,600,000	100%
86	Rikonstrukcion kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Kardhiq dhe Lunxheri, Nst Gjrokastr 110/35/6 kv	Gjrok aster	45,000,000			45,000,000				45,000,000	100%
87	Rikonstrukcion Rrejtimit TM kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Gline, Zagorice Grapsh dhe Dropull i Sipern Nst Grapsh 35/10 kv	Gjrok aster			35,000,000	35,000,000			35,000,000		
88	Rikonstrukcion Rrejtimit TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Ujeshelles, Manaj, Miniera 1 dhe Miniera 2, Nst Menalaj 110/10 kv	Gjrok aster			45,000,000	45,000,000			45,000,000		
89 2024	Rikonstrukcion Rrejtimit TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Kurvesh, Drogat Nst Tepelene 110/10	Gjrok aster				35,000,000					
90	Rikonstrukcion Rrejtimit TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Krahës Nst Krahës 110/10 kv	Gjrok aster				35,000,000				35,000,000	
91	Ndërtim linje e re me parametra 20 kv per zonat Bregdeti Lukove, Shën Vasil - Nivice	Gjrok aster				100,000,000				100,000,000	
92	Zgjidhja e fiderit OLM2, 20 kv, Nst Sarande 110/20 kv per furnizimin e zonave se Industriale Sarande	Gjrok aster				65,000,000				65,000,000	
93	Rikonstrukcion Rrejtimit TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat	Gjrok aster			30,000,000	30,000,000			30,000,000		

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri NIPT: L81530018E

[illegible]

NIPT: L81530018E

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

	Ndërtimi i linjes 20kV ajrore N.Sti Palasë - Tuneli Llogarase	Vloje	31,000,000	30,000,000					61,000,000	31,000,000	30,000,000								61,000,000	100%
122	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU për Fiderin Fratar. Nënstacioni Poceri 35/6 kV, dhe vazhdimi i kabinave të mbetura të fiderit Aranius, N/sti Pika Shpërndarëse Ballsh.	Fier							100,000,000										70,000,000	5%
124 202	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Agim I, Nënstacioni Libofshe 35/10 kV	Fier							32,233,258											
125 203	Ndërtimi i kabinës së re "Velmish i Rr", linja TM dhe linja TU me kablë me vetmbajtje të tipit ABC për këte kabinë	Fier	5,000,000						32,233,258										5,000,000	100%
126	Ndërtimi i linjave të reja 6 dhe 10 kV që do të furnizojnë kabinat e reja Varlop 1, Frakull e Vogel 2, Frakull e Madhe 1, Buzmadhi 3, Buzmadhi 4, Gorshovë si dhe ndërtimi i linjave të reja me kablë me vetmbajtje ABC për këto kabina	Fier							27,000,000											
127 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Mbrostari Ura, Nënstacioni Fieri I, 35/6 kV	Fier							68,680,800											
128 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i kabinave të mbetura dhe rrjetit TU për Fiderin Polari I, Nënstacioni Fieri I, 35/6 kV	Fier							63,571,000										50,642,300	
129 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Polari 2, Nënstacioni Fieri I, 35/6 kV	Fier							54,180,000										70,434,000	
130 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM për fiderat Nr.15,16, 20, 26 Kafaraj, N/ST Kafaraj 35/6 kV si edhe rikonstruksioni i 4 kabinave të mbetura dhe rrjetit TU i tyre.	Fier							98,750,000											
131 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM për fiderat Nr.1,2,3, Cakran, Buzmadhi dhe Varbob, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier							99,850,000										99,850,000	40%
132 202	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Kompresori I dhe 2, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier							80,230,000										104,299,000	
133 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Oficene, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier							60,550,000										78,715,000	
134 203	Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave të mbetura të fiderit Qyteti 4, Nënstacioni Patos, 35/6 kV	Fier							99,862,300										99,862,300	
135	Ndërtimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr. 16 dhe kabinës së re shyllore "Sheq Levani 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (në planuesit tane)	Fier							4,000,000										4,000,000	
136	Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV të Ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të N/stacionit të ri Leskovik 110/10kV	Korce						300,000,000												

138.202	Korce	Rikonstruksion rrjet TM fideri 19u/s1 ne ABC Fshati Drenove, rrjet TU rikonstruksion kabina Qyteti 1 Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe nderitim kabine e re murature tulle Drenove 3					19,845,156	19,845,156		26,200,000				26,200,000	30%
139.202	Korce	Rrjet TU me kablo ne vetemballje ABC Kabina Vlocoisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabinat Vlocoisht 1+2 dhe nderitim kabine e re murature Vlocoisht 3					18,440,353	18,440,353		21,200,000				21,200,000	30%
140.202	Korce	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstruksion kabina Zvirine 1+2+3					11,788,268	11,788,268		13,600,000				13,600,000	
141.2024	Korce	Rrjet TU me kablo ne vetemballje ABC Kabina BOROVE, dhe nderitim kabine e re ne murature tulle fshat BOROVE				2,176,809	2,176,809			2,500,000				2,500,000	30%
142.202	Korce	Rrjet TU me kablo ABC I kabineve te fshatit Podgorice, fideri 14, N/S1 Petrushke, nderitim kabine shlylore me dy shylla, linje TM 10kV per lidhjen e kabines shlylore me rrjetin TM nga kabina Podgorice 1					27,749,729	27,749,729		32,000,000				32,000,000	
143.202	Korce	Rrjet TU me ABC Fshati Areze dhe rikonstruksion kabina fshati Areze				6,010,288	6,010,288			6,010,288				6,010,288	30%
144.202	Korce	Rrjet TU me ABC Fshati Nikolic dhe nderitim kabine e re fshat Nikolic				2,316,606	2,316,606			2,316,606				2,316,606	
145	Korce	Zhvendosja e kabineve 5/6 dhe 5/7, Fideri Nr. 5, N/Stacioni Korce				6,350,047	6,350,047						6,350,047	6,350,047	
146	Burrel	Nderti 1 Injosi TM, 10kV, Fideri Nr. 2 Dohoshisti (ne punonjesit tane)					5,480,713	5,480,713						5,480,713	100%
147.202	Korce	Ndertim kabine dhe rrjeti TU me ABC I kabineve te fshatit Vllukcuq, FIDERI Vllukcuq N/S1 Rehove					-	-		16,450,617				16,450,617	
148	Burrel	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/S1 SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/S1 Fushe Aliu (LOTI 1)					14,556,552	14,556,552						14,556,552	100%
149	Burrel	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/S1 SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/S1 Fushe Aliu (LOTI 2)				30,000,000	30,651,460	30,000,000	30,000,000					90,651,460	
150	Burrel	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/S1 SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/S1 Fushe Aliu (LOTI 3)				50,000,000	142,000,000		50,000,000					142,000,000	95%
152.202	Shkodër	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstruksion I kabineve dhe rrjeti TU me kabllo ABC ne fiderin 18 (Shengjin kabllor), N/S1 110/10 kV, Lezhe					-	-		108,608,000				108,608,000	100%
153.202	Shkodër	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstruksion I kabineve dhe rrjeti TU me kabllo ABC ne fiderin 18 (Shengjin kabllor), N/S1 110/10 kV, Lezhe					-	-		151,395,600				151,395,600	100%
154	Shkodër	Rikonstruksion dhe kalimi ne 20kV I kabines Vasil Shanto, Fideri 17, N/Stacioni 110/20/6kV Shkodra 1					4,084,915	4,084,915		4,084,915				4,084,915	100%

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri
NIPT: L81530018E

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri
NIPT: L81530018E

173.202	Ndërtim kabine shtyllore KMLA dhe KML5 zhvillimi i rrjetit TU i tyre dhe kabines Ndëe Ndokej F-5,F-7, ndjt. Lezhe	Shtod er								-				9,546,528				9,546,528	40%	
174.202	Sistemi rrjeti TM/TU & kabines Box Borje i Madh 2 F-1 N/SI Vrakë, Koplik	Shtod er								-				3,005,773				3,005,773	100%	
175.202	Zhvillimi i linjaveTM 20kV kabinave 20kV dhe rrjetin TU me përcjellës ABC për fiderat F3 dhe F4 N/Stacioni Velipojë 110/20kV (nga N/Stacioni Velipojë - Kabina Box 17/F3)	Shtod er							176,753,882	176,753,882									0%	Ne prijte te lejtes se punimeve
176.203	Ndërtimi i fideret kablore 20kV F5, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC n/st. Velipojë 110/20kV, (nga n.st. Plazh Velipojë - Kabina Box 15/F5)	Shtod er						173,392,488	173,392,488							217,000,000		217,000,000		
177	Rikonstruksion rrjetit TM, N/Stacion - Shoshan dhe Shoshan -Valbonë, Fideri Ujçeljas, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri	Kukes					40,000,000	40,000,000		80,000,000	40,000,000							80,000,000	100%	
178	Rikonstruksion i pjesëtëm I fiderit Ujçeljes, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri.	Kukes					40,000,000	40,000,000		80,000,000	40,000,000							80,000,000	100%	
179.202	Furnizimin me energji elektrike te blloqeve te banimit te procesit te rindërtimit ne zonën e re per zhvillimin e Spitalles, Bashkia Durrës.	Durrës								-								19,727,578	100%	
180.202	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU dhe kabinave ne fiderat Agim I N/SI Libofshe, - 2(Seman) Nst Hoshare, Mbrosar Ura Nsa Fieri 1 dhe fiderit Ferne Nsi Fieri 2	Fier								-								110,000,000	10%	
181.202	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU per fiderat 15, 16, 26 Nsi Kaliraj si edhe ndërtimi i linjave dhe kabinave te reja TM/TU per furnizimin e serave ne zonën e ish Komunes Cakran dhe ish Komunes Frashull	Fier								-								80,000,000	0%	
182.202	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU ne Drejtorine Rajonale Fier per zonat Roskovec, Patos	Fier								-								70,000,000	10%	
184.203	Rikonstruksion i rrjetit TU dhe kabinave te fiderit Ngjeshan dhe Roskovec I Neisnacioni Matke 35/10 kV	Fier														62,000,000		62,000,000		
185.203	Zgjidhimi i fiderit Nr. 12, 20 kV kabina Box 13 + shpenderja TU per 13 kabina (Drize+Vadhize)	Fier														100,000,000		100,000,000		
186.202	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabllet ABC ne kabinet e fiderit Nr. 26kV N/Stacioni Lushnje(Qander) 35/6 kV	Berat								-								70,000,000	10%	
187.202	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabllet ABC ne kabinet e fiderit Nr. 11/10 kV dhe Nr.3/10 kV N/Stacioni Bieukas-Drypake 35/10 kV.	Berat								-								100,000,000		
188.203	Zhvillimi i rrjetit TU me përcjellës ABC, sistëmi kabingash ne Fiderin	Berat														166,000,000		166,000,000	60%	

A: Bulevardi "Gjerqj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

[illegible]

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Katë 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

2	Vazhdimi i kllimit ne 20 kV te kabineve te fiderit 126 Kinostudio	Tirane			49,995,949				49,995,949		49,995,949			
3.2025	Punime civile, rrethim, hidroizolim ndertesat e N Stacione DTL	DTL												
4	Rikonstruksion i kabineve 20 kV ekzistuese (ana ndertimore+cela TM) ne Qytetin e Elbasanit	Elbasan			110,000,000	100,000,000	210,000,000				110,000,000	100,000,000	210,000,000	
5	Rikonstruksion i kabineve murature nga struktura ndertimore e paisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel)	Burrel			60,000,000	60,000,000	120,000,000				60,000,000	60,000,000	120,000,000	
6	Rikonstruksion nga ana ndertimore e disa kabineve tip box dhe murature ne qytetin e Shkodres, N/Stacioni SH-1&SH-2	Shkodër			27,331,569		27,331,569				27,331,569		27,331,569	
7	Rikonstruksion ne 20 kabina 'Murore & Box' ne qela te motorizuar ne N/ST SH-1 dhe N/ST SH-2	Shkodër			51,815,626		51,815,626				51,815,626		51,815,626	
8.2024	Ndertimi te nje ndertese te re per qendren BACKUP – SCADA DCC – B	OSSH		25,000,000	50,000,000		100,000,000		25,000,000	9,000,000			34,000,000	95%
9	Rikonstruksion kabineash (Punime teknologjike montimi ndertimi transport + kabine elektrike tip box) Shkoder	Shkodër		7,092,708			33,549,146		7,092,708				33,549,146	100%
10	Rikonstruksion kabineash (Punime teknologjike montimi ndertimi transport + kabine elektrike tip box) Dures	Durres		12,906,917			42,593,423		12,906,917				42,593,423	100%
11	Rikonstruksion i godines se ish Institutit te Nafites (kati I III-te) per OSHEE Fier	Fier			7,182,553		7,182,553				7,182,553		7,182,553	
12	Rikonstruksion Zyrtar Agjensia Bilisht	Korce			7,390,317		7,390,317				7,390,317		7,390,317	
13	Ndertim kabina shyllore Agjensia Ereske	Korce			60,000,000		60,000,000				60,000,000		60,000,000	
V1	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)			176,118,144	130,000,000	400,000,000	912,483,509	2,369,222,732	171,183,618	1,323,602,310	432,258,821	385,650,000	3,149,294,749	
1	Linja e TU me kabell ABC per kabinat 20 kV te linjes ajrore nga Balli Shaban deri ne Vrap-Shenkoll,Paret.	Tirane			140,000,000		140,000,000				140,000,000		140,000,000	
2	Zgjatim me rrjet TU me kabell me vetenbajte ABC i daltes ekzistuese nga kabina K13, Fideri E10 , N/ST Farke 110/20/10KVA	Tirane			725,616		725,616				725,616		725,616	
3.2025	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabello me vetenbajte ABC ne zonat Rurale te Tranes ne kabinat e fiderave ES N/Stacion Farke 110/20/10 kV , Fiderat Gjokaj ,Preze , Vore, Rinas N/Stacion Vore 35/20/6 kV , Fiderat 141 ,150 N/Stacion Valias 35/6 kV Fideri 101 N/Stacion Mezez 35/6 kV	Tirane										150,000,000	150,000,000	
4.2024	Zgjatimi i rrjetit TU te kabina elektrike ne NST TEC,Kombinat dhe NST Kombinast e ri 110/20 kv.	Tirane		4,934,526			4,934,526							
5	Ndertimi i 2 kabineve te reja dhe Rrjetit TU ne zonen e Dajrit	Tirane		25,000,000			25,000,000		25,000,000				25,000,000	100%
5	Rikonstruksion i rrjetit TU kabina Zenel, Fideri Zg, NST Tec	Tirane			2,995,349		2,995,349				2,995,349		2,995,349	

6	Ndërtimi i rrjetit të ri TU me ABC të N.sit. Vallas 110/20KV	Tiranë			250,000,000	250,000,000	500,000,000			250,000,000	250,000,000	500,000,000	
7.2024	Investimi në rrjetin TU në Krujë/ Fushë Krujë	Durrës										86,000,000	4%
8.2024	Rikonstruksion i rrjetit TU me ABC Zona Buqes Elbasan	Elbasan										12,752,160	
9	Rikonstruksion i rrjetit TU të Fiderit Nr.2, 20KV, Nënstacioni 110/20KV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/Si Fieri 2	Fier			50,000,000							50,000,000	100%
10	Rikonstruksion i rrjetit TU dhe kabina të Fiderit Strum dhe Rrokovce 3, Nënstacioni Mukë 35/10 KV	Fier			32,500,000							32,500,000	36%
11	Rikonstruksion i rrjetit TU për kabina të fiderave Kute, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8 dhe Nr.9 Ballsh.	Fier			135,650,000							135,650,000	
12.2024	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Boboshtice kabina Boboshtice 1 Nst Gjane, Fideri Fshat	Korçë										10,086,145	
13.2024	Rrjet TU me kabell ABC i kabina të fiderit 8, N/stacioni Blishtë (kabina të fshatrave të bashkisë Pustec)	Korçë			38,443,028							44,000,000	3%
14.2024	Rrjet TU me ABC fiderat 1,2,3,4,6 dhe 7 N/Si Korçë, qytet KORÇE	Korçë			71,007,323							81,600,000	
15.2024	Rrjet TU me ABC i kabines "Shqitash", N/Si Petrushe, Fideri 11	Korçë			7,869,656							9,000,000	
16.2024	Rrjet TU me ABC i kabina të fshatit Symtze, Korçë	Korçë			9,660,736							11,100,000	
17.2024	Rrjet TU me ABC i kabina të fshatit Dritas N/Si TEC MALIQ, fideri Komunal 2	Korçë			12,674,984							12,674,984	
18.2024	Rrjet TU me kabell ABC qytet Leskovik Agjensia Erseke, Rajoni	Korçë			12,615,240							12,615,240	
19.2024	Rrjet TU me ABC i kabina të "Leshnice 1" dhe "Leshnice 2", fideri 14 Cerave, N/Si Petrushe	Korçë			15,233,955							15,233,955	
20.2024	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Mborje, kabina Depot 101K, Mborje 1, Mborje 2	Korçë			14,490,489							14,490,489	
21.2024	Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC Kabina Mollas 1 me transformator Sn = 250KVA, Fideri 3M, N/Si Mollas	Korçë			1,317,244							1,317,244	
22	Rrjet TU me kabell ABC fshati QINAM Agjensia Erseke, Rajoni	Korçë			2,046,559							2,046,559	100%
23	Rrjet TU me kabell ABC fshati Selence Agjensia Erseke, Rajoni	Korçë			2,696,630							2,696,630	100%
24	Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC kabina Rehove 1+2	Korçë			3,420,379							3,420,379	100%
25.2024	Rrjet TU me kabell ABC fshati Rembeë, Njësia Korçë, Rajoni Korçë	Korçë			14,931,810							17,200,000	
26.2024	Rrjet TU me kabell ABC fshati Blinçke, Agjensia Blishtë, Rajoni Korçë	Korçë			16,361,294							16,361,294	

[illegible]

A: Bulevardi "Gjergji Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

IX	Investime ne sistemin e majtes	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894	180,000,000	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894	100%
I	Projekti i Furnizimit dhe instalimit te Sistemit i majtes Smart i Bilancit te energjise ne kabinat elektrike .Software dhe integrimi i tyre ne platformen MDM. (Etapa e pare)	OSSH	180,000,000	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894	180,000,000	285,568,298	285,568,298	1,056,704,894	100%
X	Blerje Pajisje makineri										
1.2024	Blerje pajisje primare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH						1,597,000,000	1,498,000,000	3,095,000,000	
2.2024	Blerje pajisje sekondare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH						100,000,000		100,000,000	10%
3.2024	Blerje pajisje per nyset komutuese te Linjave dhe N/Stacione	OSSH						250,000,000		250,000,000	38%
4.2024	Blerje te pajisjeve komutuese per kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH						280,000,000		280,000,000	100%
5.2024	Blerje Transformatore Fuqie per Kabina elektrike	OSSH						200,000,000		200,000,000	100%
6.2024	Blerje Isolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresse TU + fshlek	OSSH						150,000,000		150,000,000	100%
7.2024	Blerje Transformatore Instrumentale TU & TM (Transformator rryme TM&TU, Transformator Tension)	OSSH						54,000,000		54,000,000	100%
8.2024	Kabell ABC dhe aksesore	OSSH						53,000,000		53,000,000	100%
9.2024	Instalim Kontroll monitorim sistem Rancera per N/Stacione	OSSH						230,000,000		230,000,000	100%
10.2024	Blerje kabli 35kV XLPE (1x240)mm2	OSSH						150,000,000		150,000,000	100%
11.2024	Shperzime per emergjencat	OSSH						30,000,000		30,000,000	100%
12.2025	Pajisje primare, sekondare dhe pajisje adimnise per N/Stacione dhe Linjat TL	OSSH						100,000,000		100,000,000	
13.2025	Celesa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT per ambient te jashtem	OSSH							200,000,000	200,000,000	
14.2025	Cela 20 kV per N/Stacione	OSSH							142,000,000	142,000,000	
15.2025	Pajisje transformuese, Transformator Fuqie dhe Cela 40.5 kV per N/Stacione	OSSH							280,600,000	280,600,000	
16.2025	Blerje te pajisjeve komutuese per kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH							153,500,000	153,500,000	
17.2025	Blerje Transformatore Fuqie per Kabina elektrike	OSSH							250,000,000	250,000,000	
18.2025	Blerje Isolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresse TU + fshlek	OSSH							100,000,000	100,000,000	
19.2025	Blerje Automjeti me aparatura per testimin dhe gjetjen e defekteve te kablllove	OSSH							40,000,000	40,000,000	
20.2025	Kabell ABC dhe kabell TU	OSSH							80,000,000	80,000,000	
21.2025	Pajisje DGA per analizimin e gazrave ne transformatore fuqie	OSSH							210,000,000	210,000,000	
22.2025	Pajisje BMT per monitorimin e gazrave ne transformator fuqie	OSSH							12,500,000	12,500,000	
23.2025	Transformatore tensioni te brendshem per cela 35/20/10kV per nensistacione	OSSH							13,000,000	13,000,000	
									4,995,000	4,995,000	

[illegible]

Vo.



Tregojne zera investimesh te shtuara ne plan ,te pa perfshira ne planin fillestar 2023-2027

Tregojne zera investimesh te perfshira ne planin filestar 2023-2027,por qe jane spostuar ne vite

Tregojne zera investimesh te perfshira ne planin fillestar 2023-2027, por jane bere zero si pasoje e perfshirjes ne zera te tjera investimesh

Tregojne ndryshime vlerash ne zera ekzistues te investimeve.

Marketimet me ngjyre te njeje ne Nr.Rendori dhe ne kolonen e vleres se kontratuar te investimeve, tregojne kontratat e lidhura sipas prokurimeve per dy ose me shume zera investimesh

A: Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

Ne perfundim te ketij relacioni, Operatori i Sistemit te Shperndarjes paraqet per miratim prane Entit Rregullator te Energjise Planin 5-vjeçar te perditesuar te Investimeve per periudhen 2023-2027, i hartuar ne perputhje me objektivat e zhvillimit te sektorit te energjise elektrike, si dhe me detyrimet ligjore dhe rregullatore qe rrjedhin nga kuadri aktual.

Ky plan perfaqeson nje angazhim strategjik per zhvillimin e rrjetit te shperndarjes dhe permiresimin e performances se tij, duke synuar:

- Rritja e kapaciteteve te nenstacioneve ekzistuese dhe ndertimi i nenstacioneve te reja, per te perballuar kerkesat ne rritje.
- Zgjerimi i rrjetit 35 kV, per te adresuar kufizimet e rrjedhjes se ngarkeses dhe per te permiresuar cilesine e furnizimit me energji elektrike.
- Investime ne rrjetin 10kV dhe 6kV, me qellim ndarjen e ngarkesave ne fiderat dales dhe permiresimin e infrastruktures ne zonat rurale dhe periferike.
- Rikonstruksion i rrjetit TM 20 kV, ndertimim rrjeti te ri 20kV, duke kaluar rrjetin nga 10kV, 6kV ne 20kV per sigurin, cilesine e rrjetit si dhe redukrimin e humbjeve.
- Rritja e sigurise dhe saktetise ne matje, me futjen e teknologjive te reja qe kontribuojne ne mbrojtjen dhe ruajtjen e sistemit te matjes

Duke konsideruar rendesine e ketij plani per zhvillimin e sektorit te shperndarjes, OSSH kerkon miratimin e tij nga ERE.

Me konsiderate,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DALIPI



OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETETEVE

Nr 7393 .Prot.

Tiranë, më 10/07 /2025

Lënda: Kërkesë për shqyrtimin dhe miratimin e Planit fillestar të investimeve të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për vitin 2025 të shoqërisë OSSH sh.a

ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
(Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë)

Për dijeni: OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISE ELEKTRIKE
GROUP SH.A
(Bulevardi Gjergj Fishta, Tirana)

Z. Ervis HAZIZI
Zyrtari i Pajtueshmërisë, OSSH SH.A

Këtu

I nderuar,

Mbështetur në procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve ,po ju dërgojmë kërkesën për shqyrtimin dhe miratimin e "Planit fillestar të investimeve të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për vitin 2025 të shoqërisë OSSH sh.a", miratuar në Këshillin Mbikqyrës me Vendimin Nr.1 ,datë 14.02.2025 si dhe Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit me Nr.2047/1,datë 21.03.2025.

Bashkëlidhur do të gjeni dokumentacionin, (relacioni shpjegues, vendimet e miratimit te këtij plani).

Me konsideratë,

ADMINISTRATORI I OSSH SH.A
Blendian DALIFI



Nr. 6713/1 Prot.

Tiranë, më 2/7 2023

Lënda: Dërgohet për shqyrtim Plani i Zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për vitin 2023 si dhe Plani i Zhvillimit të OSSH sha për periudhën 2023-2027

Drejtuar: **Z. Petrit AHMETI**
KRYETAR
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Për Dijenë: **Z. Enea KARAKAÇI**
Administrator
OSHEE GROUP sha

I nderuar z. Ahmeti,

Tiranë

Në përgjigje të Tuajës me Nr.1858. Prot, datë 29.06.2023, regjistruar në OSSH sha me Nr. 6713 prot, datë 03.07.2023, "Mbi paraqitjen e planit 5-vjecar të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për periudhën 2023 - 2027", OSSH sha po dërgon për shqyrtim nga ana juaj:

- Planin e Zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për vitin 2023, miratuar në Këshillin Mbikqyrës me Vendimin nr. 7, datë 03.03.2023, dhe me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit nr. 2806/1, datë 27.04.2023
- Planin e zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për 5 vitet e ardhshme kalendarike, respektivisht për periudhën 2023-2027 të shoqërisë OSSH sh.a."
- Raport lidhur me realizimin e investimeve të miratuara në planin e zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për periudhën 2018- 2022.

Me konsideratë,

ADMINISTRATOR I OSSH SH.A

Blendian DA LIPI

